

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 ABR 2025


Firma:  Hora: 15:51
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA



INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN




Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Arq. Oscar Raúl Pantoja
Subgerente General de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

SEGEPLAN
RECEPCION

09 ABR 2025
HORA: 16:02 NOMBRE: Silvia

Licda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera



Dra. Julika Quan Haase



Gerente en Funciones
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

AVANCES MARZO 2025

Tabla de Contenido

Contenido

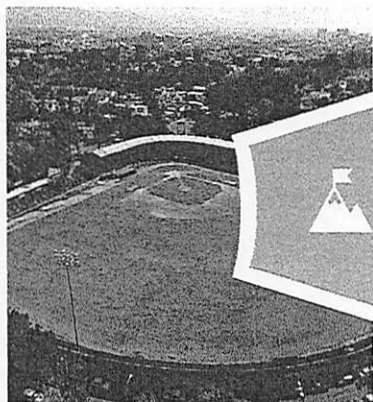
Introducción _____	2
Marco Estratégico Institucional _____	3
Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos _____	4
Anexo Documentación de Respaldo _____	7

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo 540-2013, Capítulo VI, Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38, Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii), establece: *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos (...)"* en cumplimiento, se integra Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondiente al mes de marzo 2025.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia integra el presente informe, de acuerdo al seguimiento realizado por parte del Analista de Proyectos -SNIP-, de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de la CDAG, haciendo del conocimiento por medio del Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-084-2025 de fecha 31 de marzo de 2025, en donde se indica que, al 31 de marzo 2025 la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con tres (3) proyectos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y uno (1) pendiente de aprobación para ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2025 el cual se encuentra en el ciclo de emisión de opinión técnica por parte de -SEGEPLAN-.

Marco Estratégico Institucional



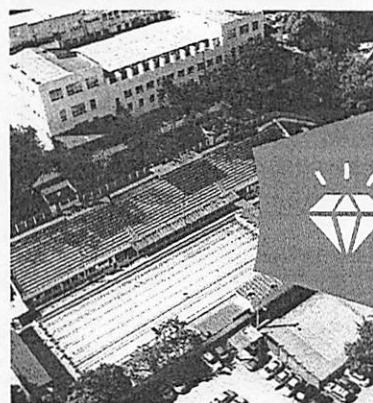
NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitud - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad

■ ■ PASIÓN POR
GUATEMALA



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional recibió Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-084-2025 de fecha 31 de marzo de 2025, con atención al Director de Gestión de la Estrategia, emitido por el Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura con Visto Bueno del Subgerente de Infraestructura que adjunta el Oficio sin número de fecha 31 de marzo de 2025 emitido por el Analista de Proyectos SNIP, de la Unidad de Proyectos SNIP de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de la CDAG, en el cual hacen del conocimiento que, al 31 de marzo de 2025, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con tres (3) proyectos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y uno (1) pendiente de aprobación para ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2025 el cual se encuentra en el ciclo de emisión de opinión técnica por parte de -SEGEPLAN-.

La Subgerencia Financiera a través de la Dirección de Presupuesto, presentó reporte R00815611.rpt Analítico de Ejecución Física y Financiera por obra y reporte R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02- por obra, de los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, con registro de avance de presupuesto físico del 41.21% y avance de presupuesto financiero del 89.28% al mes de marzo de 2025 del proyecto identificado con SNIP 333700 "Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala".

De conformidad al Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-084-2025 de fecha 31 de marzo de 2025, y documento sin número de fecha 31 de marzo de 2025 del Analista de Proyectos SNIP, de la Unidad de Proyectos SNIP se cuenta con un avance de meta física anual del 41.21% y avance financiero del 89.28% al mes de marzo de 2025 con relación al proyecto identificado con SNIP 333700 "Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala".

Asimismo, se detalla la información de los proyectos de inversión se presenta a continuación:

1. SNIP 301752

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén:

- El proyecto se encuentra en trámites internos institucionales a efecto de llevar a cabo el evento para la contratación y eventual publicación en GUATECOMPRAS.
- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025 en caso de ser adjudicado en el presente año.

2. SNIP 333700

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala:

- En el SNIP el proyecto se encuentra en el ciclo de ejecución y en GUATECOMPRAS con el estatus de Adjudicado.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento SNIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de marzo según informe de supervisión, el SNIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 11.73%; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número 3-2025 de fecha 31 de marzo de 2025 en formato PDF.

3. SNIP 336771

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cubierta de Piscina Complejo Deportivo Calzada Ramiro de León Carpio, Carretera a Aldea Santa Lucía, Zacapa, Zacapa.

- En el SNIP el proyecto se encuentra en el ciclo de emisión de opinión técnica.
- En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.

4. SNIP 333856

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el estatus del proyecto que presenta GUATECOMPRAS es "No Adjudicado", por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, se ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

Por lo anteriormente descrito, se informa que al mes de marzo 2025 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SNIP-, existe información registrada con relación al avance físico y financiero de los proyectos de inversión.

Anexo Documentación de Respaldo

CDAG



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

OBRA Mayor o igual a 01

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 4/04/2025
 HORA : 8:35.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO											
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC								
Entidad : 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)																								
11	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO																							
	012	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS																0.00	6,489,000.00	5,793,697.50	89.28			
	000	008	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA															0.00	6,489,000.00	5,793,697.50	89.28			
		333700	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA				333700	METRO CUADRADO	0.00	18,502.00	7,625.42	41.21												
			Promedio de ejecución física por actividad:																		41.21			
			Promedio ponderado de ejecución por programa:																18,502.00	7,625.42		41.21		
			TOTAL 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO																0.00	6,489,000.00	5,793,697.50	89.28		
			Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																18,502.00	7,625.42		0.00		6,489,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

OBRA Mayor o igual a 01
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 4/04/2025
 HORA : 8:32.30
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad: 11300061-000-000 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)													
11						DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO							
00						SIN SUBPROGRAMA							
012						MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							
000-008						MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA							
						333700 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	18502.00	7626.00	41.22	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,625			




Ruth Odily Corzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto

Marta A. Meighan Juárez
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Licda.
 Marta A. Meighan Juárez
 Subgerente
 Subgerencia Financiera



Guatemala, 31 de marzo 2025
Oficio No.SGI-DGPI-CDAG-084-2025



Licenciada
Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Con atención:

Licenciado
Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licda. Rivera:

Reciba un cordial saludo, deseando que sus actividades se estén desarrollando con éxito.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con tres proyectos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y uno pendiente de aprobación para ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2025. A continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

1. CÓDIGO SNIP 301752: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.
 - El proyecto se encuentra en trámites internos institucionales a efecto de llevar a cabo el evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.
 - El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025 en caso de ser adjudicado en el presente año.
2. CÓDIGO SNIP 333700: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.
 - En el SNIP el proyecto se encuentra en el ciclo de ejecución y en Guatecompras con el status de Adjudicado.
 - Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento SNIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de marzo según informe de supervisión, el SNIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 11.73%; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número 3-2025 de fecha 31 de marzo de 2025 en formato PDF.

Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores.
3. CÓDIGO SNIP 336771: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.
 - En el SNIP el proyecto se encuentra en el ciclo de emisión de opinión técnica.
 - En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt

*Favor trasladar a Rello
para elaboración de Informe
de SNIP y Seguimiento
31/03/2025*



4. CÓDIGO SNIP 333856: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el estatus del proyecto que presenta Guatecompras es "No adjudicado", por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, se ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

Se adjunta copia del informe presentado por el ingeniero Angel Estuardo Valdez Paiz.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,

Ing. Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura

Vo. Bo. Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

C.C. archivo
AAQC



Código:

333700

Nombre del proyecto:

Buscar

Código: 333700

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión técnica



En ejecución



Finalizado

OPINIÓN TÉCNICA

Opinión técnica: APROBADO, Ejercicio: 2024

Requisitos

- Oficio solicitud de opinión técnica
- Solicitud de financiamiento
- Documento de proyecto
- Aval ante sectorial
- Certificación de propiedad del terreno
- Resolución ambiental
- Resolución de CONAP
- AGRIP
- Atención Personas con Discapacidad
- Dictamen Ministerio de Cultura
- Certificado de calidad del agua
- Cumple criterios técnicos
- Fecha de evaluación

28/06/2024

Observaciones al proyecto

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Boleto del proyecto

Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Ubicación geográfica: GUATEMALA, GUATEMALA

Sector específico: SECTORIAL

Sector: CULTURA Y DEPORTES

Especie: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Situación actual: EN EJECUCIÓN

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt




Meta: 18,502.00 m², Ejecutado: 2,170.98 m² (Avance ponderado 11.73 %) Nbg: 23637781

INFORMACIÓN ANUAL

Ejercicio	Información financiera (En Quetzales)				
	Monto solicitado	Monto inicial	Monto vigente	Monto ejecutado	Avance financiero
2026	0	0	0	0	0.00 %
2025	32,444,706.00	0	6,489,000.00	5,793,697.50	89.28 %
TOTAL:				5,793,697.50	

Ejercicio	Información física		
	Meta física	Meta ejecutada	Avance meta anual
2025	18,502 Metro cuadrado	2,170.98 Metro cuadrado	11.73 %

FOTOGRAFÍAS



Guatemala, 31 de marzo de 2025



Ingeniero Alfredo Antonio Ochoa Calderón
Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura -DGPI-
Subgerencia de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

Ingeniero Ochoa:

CDAG cuenta con tres proyectos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y uno pendiente de aprobación, para ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2025. A continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

1. CÓDIGO SNIP 301752: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.

- El proyecto se encuentra en trámites internos institucionales a efecto de llevar a cabo el evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.
- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025 en caso de ser adjudicado en el presente año.

2. CÓDIGO SNIP 333700: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.

- En el SNIP el proyecto se encuentra en el ciclo de ejecución y en Guatecompras con el status de Adjudicado.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento SNIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de marzo según informe de supervisión, el SNIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 11.73%; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número 3-2025 de fecha 31 de marzo de 2025 en formato PDF.

Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores.

3. CÓDIGO SNIP 336771: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.

- En el SNIP el proyecto se encuentra en el ciclo de emisión de opinión técnica.
- En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.

4. CÓDIGO SNIP 333856: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el estatus del proyecto que presenta Guatecompras es "No adjudicado", por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, se ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

Sin otro particular, atentamente.

Estuardo Valdez
Analista de Proyectos SNIP
Unidad de Proyectos SNIP
Subgerencia de Infraestructura, CDAG

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

25 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt



OFICIO No. 150-2025-SGI-DISUP-CDAG
Guatemala, 28 de marzo de 2025

Ingeniero
Alfredo Ochoa
Director de Gestión de Proyectos
CDAG

Estimado Ingeniero Ochoa:

Por este medio se da respuesta a su Oficio NO. SGI-DGPI-CDAG-073-2025, en el que solicita el informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de marzo de 2025, del proyecto de inversión SNIP 333700: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA".

Se remite el informe solicitado para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Atentamente agradecida por su atención.

Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano
Supervisora de Obra CDAG

Vo. Bo. Ing. Oscar Rumbold Turcios Pacheco
Director de Supervisión CDAG



RECIBIDO
Dirección de Gestión de Proyectos
de Infraestructura
Fecha: 28/3/25 Hora: 9:30
Firma: J. C. P. Luis



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFORME DE AVANCE FÍSICO

Informe de Supervisión No. 3-2025		Fecha: 31 / 03 / 2025
NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 6, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA"		Contrato Administrativo No. 478
SNIP: 333700	NOG: 23637781	
Inicio obra: 6/01/2025	Final obra: 6/12/2025	Plazo: 335 días
Supervisor nombrado: Arquitecta María de los Ángeles Álvarez Medrano	Colegiado activo No. 4887	Nombramiento del Supervisor: Oficio 538-2024-SGI-DISUP-CDAG
Director Supervisión: Ingeniero Oscar Rumakto Turcios Pacheco	Colegiado activo No. 16761	
Empresa Adjudicada: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	NIT: 39315193	Representante Legal: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz

Correspondiente del: 1/03/2025 al 31/03/2025

Modificaciones al Contrato (adjuntar fotocopia del documento)		Fecha:
		Fecha:
		Fecha:
		Fecha:
Acuerdos (adjuntar fotocopia del documento)		Fecha:
		Fecha:
Documentos de cambio (adjuntar fotocopia del documento)		Fecha:
		Fecha:

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión)
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES DEL PROYECTO											
1.01	Instalación de rótulo de identificación del proyecto.	Unidad	1.00	Q8,976.83	Q8,976.83				100.00%	1.00	1.00	1.00

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SINP		
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	GOSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1		CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
4.00	CISTERNA											
4.01	Corte de piso de concreto	Metro cuadrado	48.44	Q143.82	Q6,978.00				0.00%	48.44	0.00	0.00
4.02	Excavación de área de cisterna	Metro cúbico	158.00	Q210.44	Q33,248.52				0.00%	158.00	0.00	0.00
4.03	Fundición de piso	Metro cuadrado	48.44	Q1,301.50	Q63,441.88				0.00%	48.44	0.00	0.00
4.04	Fundición de muros	Metro cuadrado	83.50	Q1,116.53	Q93,146.76				0.00%	83.50	0.00	0.00
4.05	Fundición de techo	Metro cuadrado	48.44	Q1,084.16	Q52,348.39				0.00%	48.44	0.00	0.00
4.06	Tapadera de cisterna.	Unidad	2.00	Q2,678.97	Q5,353.94				0.00%	2.00	0.00	0.00
4.07	Aplicación de impermeabilizante	Metro cuadrado	130.00	Q318.30	Q41,379.00				0.00%	130.00	0.00	0.00
4.08	Rollero de corte	Metro cúbico	5.00	Q1,760.75	Q8,803.75				0.00%	5.00	0.00	0.00
5.00	PISTA DE ATLETISMO											
5.01	Excavación en área de pista h: 0.44 metros	Metro cúbico	2,679.00	Q78.33	Q209,848.07				100.00%	2,679.00	0.00	2,679.00
5.02	Acarreo de tierra	Metro cúbico	3,751.00	Q144.50	Q542,015.50				100.00%	3,751.00	3,751.00	3,751.00
5.03	Instalación de capa sub-baso	Metro cúbico	2,309.00	Q594.02	Q1,383,052.18				17.32%	2,309.00	0.00	400.00
5.04	Instalación de base compactada	Metro cúbico	770.00	Q434.26	Q334,380.20				0.00%	770.00	0.00	0.00
5.05	Riego de Implantación	Metro cuadrado	7,694.00	Q51.28	Q394,394.44				0.00%	7,694.00	0.00	0.00
5.06	Bindar asfáltico	Metro cúbico	385.00	Q4,643.50	Q1,787,747.50				0.00%	385.00	0.00	0.00
5.07	Riego de liga	Metro cuadrado	7,694.00	Q14.48	Q111,409.12				0.00%	7,694.00	0.00	0.00
5.08	Capa bituminosa (Concreto asfáltico)	Metro cúbico	231.00	Q3,913.40	Q903,995.40				0.00%	231.00	0.00	0.00
5.09	Pavimento sintético	Metro cuadrado	7,693.99	Q1,240.03	Q9,540,778.42				0.00%	7,693.99	0.00	0.00

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión)
1.02	Instalación de bodega para almacenaje de materiales.	Unidad	1.00	Q15,977.41	Q15,977.41				100.00%	1.00	1.00	1.00
1.03	Sistema de video vigilancia del proyecto	Unidad	1.00	Q144,338.99	Q144,338.99				100.00%	1.00	1.00	1.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES PISTA											
2.01	Desinstalación de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q149.47	Q803,776.33				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
2.02	Demolición de cajas de arena existentes	Unidad	2.00	Q11,084.35	Q22,168.70				100.00%	2.00	2.00	2.00
2.03	Demolición de banquetas existentes.	Metro cuadrado	261.64	Q159.81	Q41,812.69				100.00%	261.64	100.00	261.64
2.04	Rosanado de banquetas de concreto	Metro cuadrado	682.24	Q207.26	Q141,401.08				0.00%	682.24	0.00	0.00
2.05	Trazo e instalación de centros CP1 y CP2.	Metro cuadrado	10,924.96	Q2.26	Q24,690.41				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
2.06	Nivelación laser de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q21.34	Q129,033.16				0.00%	6,046.54	0.00	0.00
2.07	Trazo de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q4.33	Q26,181.52				0.00%	6,046.54	0.00	0.00
3.00	TRABAJOS PRELIMINARES CANCHA DE FUTBOL											
3.01	Corte y levantado de graminilla natural.	Metro cuadrado	10,924.96	Q37.30	Q407,501.06				100.00%	10,924.96	10,000.00	10,924.96
3.02	Traslado de graminilla a Complejo Deportivo de Zacapa	Metro cuadrado	10,924.96	Q10.35	Q113,073.34				100.00%	10,924.96	6,000.00	10,924.96
3.03	Desinstalación de marcos de portería existentes.	Unidad	2.00	Q4,960.65	Q9,921.30				100.00%	2.00	1.00	2.00
3.04	Excavación	Metro cúbico	6,424.90	Q149.34	Q959,494.57				100.00%	6,424.90	0.00	6,424.90
3.05	Nivelación laser de campo de fútbol	Metro cuadrado	10,924.96	Q22.59	Q246,794.85				54.92%	10,924.96	0.00	6,000.00

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión)
5.10	Borde de concreto	Metro lineal	850.00	Q738.17	Q627,444.50				0.00%	850.00	0.00	0.00
5.11	Pavimento color rojo	Metro cuadrado	2,158.25	Q1,252.14	Q2,699,928.88				0.00%	2,158.25	0.00	0.00
5.12	Área de pavimento de 20 mm de espesor	Metro cuadrado	167.20	Q1,519.57	Q254,072.10				0.00%	167.20	0.00	0.00
5.13	Área de pavimento de 25 mm de espesor	Metro cuadrado	12.88	Q3,074.40	Q39,844.22				0.00%	12.88	0.00	0.00
5.14	Marcaje de pista de atletismo	Unidad	1.00	Q126,421.60	Q126,421.60				0.00%	1.00	0.00	0.00
6.00 DRENAJE PISTA DE ATLETISMO												
6.01	Canal de concreto sección 1	Metro lineal	273.88	Q2,085.00	Q573,778.80				0.00%	273.88	0.00	0.00
6.02	Canal de concreto sección 2	Metro lineal	188.18	Q3,775.41	Q710,456.65				0.00%	188.18	0.00	0.00
6.03	Tubo PVC de 2 pulgadas de diámetro	Metro lineal	142.00	Q276.16	Q39,214.72				0.00%	142.00	0.00	0.00
6.04	Tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro	Metro lineal	216.00	Q269.71	Q58,257.36				0.00%	216.00	0.00	0.00
6.05	Tubo PVC de 6 pulgadas de diámetro	Metro lineal	9.00	Q2,528.76	Q22,758.84				0.00%	9.00	0.00	0.00
6.06	Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro	Metro lineal	75.00	Q1,711.79	Q128,384.25				0.00%	75.00	0.00	0.00
6.07	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	Metro lineal	450.00	Q958.00	Q431,100.00				0.00%	450.00	0.00	0.00
6.08	Duclos secos	Metro lineal	215.00	Q715.76	Q153,880.40				0.00%	215.00	0.00	0.00
7.00 DRENAJE FRANCÉS												
7.01	Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro	Metro lineal	1,293.00	Q783.55	Q1,013,130.15				0.00%	1,293.00	0.00	0.00
7.02	Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro	Metro lineal	48.00	Q3,059.17	Q146,840.16				0.00%	48.00	0.00	0.00


CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión)
7.03	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	Metro lineal	48.00	Q3,054.14	Q146,598.72				0.00%	48.00	0.00	0.00
7.04	Tubo PVC de 15 pulgadas de diámetro	Metro lineal	71.00	Q3,018.68	Q214,326.28				0.00%	71.00	0.00	0.00
8.00 SUPERFICIE DE CAMPO DE FUTBOL												
8.01	Instalación de sub base piedrin de 1/2 pulgada	Metro cúbico	775.00	Q675.00	Q523,125.00				0.00%	775.00	0.00	0.00
8.02	Instalación de base piedrin de 3/8 de pulgada	Metro cúbico	388.00	Q683.35	Q257,379.80				0.00%	388.00	0.00	0.00
8.03	Instalación de arena lavada	Metro cúbico	1,936.00	Q401.79	Q777,865.44				0.00%	1,936.00	0.00	0.00
8.04	Instalación de carpeta de grama sintética	Metro cuadrado	7,742.98	Q392.56	Q3,039,739.06				0.00%	7,742.98	0.00	0.00
8.05	Semilla de grama tipo bermuda	Kilogramo	200.00	Q271.01	Q54,202.00				0.00%	200.00	0.00	0.00
8.06	Marcado de cancha de futbol	Unidad	1.00	Q4,841.51	Q4,841.51				0.00%	1.00	0.00	0.00
8.07	Mantenimiento de grama	Meses	3.00	Q151,972.82	Q455,918.46				0.00%	3.00	0.00	0.00
8.08	Porterías	Unidad	2.00	Q54,425.87	Q108,851.74				0.00%	2.00	0.00	0.00
8.09	Limpieza final	Metro cuadrado	7,750.00	Q43.91	Q340,302.50				0.00%	7,750.00	0.00	0.00
9.00 SISTEMA DE RIEGO												
9.01	Instalación de tubería PVC 3/4 de pulgada de diámetro	Metro lineal	219.00	Q177.28	Q38,824.32				0.00%	219.00	0.00	0.00
9.02	Instalación de tubería PVC 1 pulgada de diámetro	Metro lineal	133.00	Q254.30	Q33,821.80				0.00%	133.00	0.00	0.00
9.03	Instalación de tubería PVC 1-1/2 pulgada de diámetro	Metro lineal	46.00	Q548.02	Q25,206.92				0.00%	46.00	0.00	0.00
9.04	Instalación de tubería PVC 3 pulgadas de diámetro	Metro lineal	85.00	Q442.86	Q37,643.10				0.00%	85.00	0.00	0.00

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión)
11.04	Equipo e implementos para la protección del personal	Unidad	1.00	Q49,283.82	Q49,283.62				100.00%	1.00	1.00	1.00

FIANZAS:				
Fianza de anticipo:	Nombre Afianzadora:	Seguros G&T, S.A.	No. de póliza	Clase C5 PÓLIZA NO. 7082788
	Vigente del:	28/11/2024	at:	27/10/2025
Fianza de cumplimiento de contrato:	Nombre Afianzadora:	Seguros G&T, S.A.	No. de póliza	Clase C5 PÓLIZA NO. 7082785
	Vigente del:	28/11/2024	at:	6/12/2025
Fianza de conservación de obra:	Nombre Afianzadora:		No. de póliza	
	Vigente del:		at:	
Fianza de gastos deudores:	Nombre Afianzadora:		No. de póliza	
	Vigente del:		at:	

AVANCE FÍSICO SNIP:	
Porcentaje de avance físico del mes que corresponde el reporte en el Módulo de Seguimiento del SNIP:	11.73%
AVANCE FINANCIERO:	
Motivo:	Anticipo
	20.00%

Observaciones: (describir acontecimientos importantes ocurridos durante el periodo del presente Informe de avance físico de la obra)

 Arq. María de los Angeles Alvarez Medrazo Supervisora de Obra Subgerencia de Infraestructura CDAG	 Vo. Bo. Ing. Oscar Rinaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión Subgerencia de Infraestructura CDAG
---	--




CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión)
9.05	Instalación de tubería PVC 1 pulgada eléctrico	Metro lineal	85.00	Q404.57	Q34,389.45				0.00%	85.00	0.00	0.00
9.06	Panel de control de aspersores	Unidad	1.00	Q11,887.77	Q11,887.77				0.00%	1.00	0.00	0.00
9.07	Instalación de filipon eléctrico	Unidad	3.00	Q855.58	Q1,966.74				0.00%	3.00	0.00	0.00
9.08	Instalación de electroválvulas	Unidad	3.00	Q3,319.13	Q9,957.39				0.00%	3.00	0.00	0.00
9.09	Instalación de aspersoras	Unidad	18.00	Q4,168.54	Q75,033.72				0.00%	18.00	0.00	0.00
9.10	Instalación de sistema de bombeo	Unidad	1.00	Q89,344.75	Q89,344.75				0.00%	1.00	0.00	0.00
9.11	Instalación de cableado eléctrico	Metro lineal	765.00	Q12.68	Q9,700.20				0.00%	765.00	0.00	0.00
10.00	DISCIPLINAS INDEPENDIENTES											
10.01	Salto con pértiga	Unidad	16.00	Q525.94	Q8,415.04				0.00%	16.00	0.00	0.00
10.02	Ria	Unidad	4.00	Q9,163.22	Q36,652.88				0.00%	4.00	0.00	0.00
10.03	Salto largo	Unidad	4.00	Q39,318.71	Q157,274.84				0.00%	4.00	0.00	0.00
10.04	Lanzamiento de peso	Unidad	2.00	Q8,809.80	Q13,617.60				0.00%	2.00	0.00	0.00
10.05	Lanzamiento de martillo y disco	Unidad	1.00	Q47,048.43	Q47,048.43				0.00%	1.00	0.00	0.00
10.08	Bordillo de aluminio	Metro lineal	398.12	Q455.60	Q181,383.47				0.00%	398.12	0.00	0.00
11.00	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO											
11.01	Renta de sanitarios portátiles (se deja a discreción el alquiler)	Unidad	72.00	Q734.50	Q52,884.00				4.17%	72.00	3.00	3.00
11.02	Recipientes para basura	Unidad	20.00	Q235.14	Q4,702.80				0.00%	20.00	0.00	0.00
11.03	Extracción de basura, tipo y desechos constructivos	Unidad	1.00	Q14,010.58	Q14,010.58				0.00%	1.00	0.00	0.00

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		9 de 9	
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)		
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781
SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887		
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA	SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	TEMPORALIDAD:	1 al 31 de marzo de 2025
		FECHA DE INFORME:	31 de marzo de 2025

GENERALIDADES

PLAZO DE EJECUCIÓN DE ANTICIPO: 13 de marzo de 2025: se recibió oficio CORRELATIVO 20-2025, firmado por la señora Brenda Margarita Archila del Cid de Cruz, propietaria de la empresa BREMAR, en el documento hace referencia al oficio CORRELATIVO 6-2025 y CORRELATIVO 10-2025. Los tres oficios en mención son referentes a los atrasos en la ejecución del RENGLO 3.01 "Corte y levantado de grama natural" y RENGLO 3.02 "Traslado de grama a Complejo Deportivo de Zacapa", los renglones figuran en las primeras 7 semanas del cronograma general de ejecución, del 6 de enero al 24 de febrero de 2025. Los renglones también se incluyeron en el cronograma de ejecución del anticipo, comprendido del 20 de enero al 17 de marzo de los corrientes, equivalente a 8 semanas de duración. Derivado de los atrasos en los trabajos de acondicionamiento de la base en la cancha del Complejo Deportivo de Zacapa (servicios ejecutados por CDAG e independientes a la presente licitación), antes de la colocación de la grama a retirarse del Estadio Doroteo Guamuch Flores, el corte de grama y por consiguiente su traslado, dio inicio hasta el 19 de febrero de los corrientes, generando un atraso significativo en el cumplimiento del cronograma de ejecución del anticipo. Por parte de la supervisión de CDAG, se realizó la estimación de los avances físicos y los atrasos relativos a los renglones 3.01 y 3.02 y se determinó que el atraso correspondiente es de 4 semanas y tomando en cuenta que los atrasos no son adjudicables a la empresa BREMAR, se fija la fecha de finalización del tiempo de ejecución del anticipo el 14 de abril de los corrientes, se hace constar en el OFICIO No. 133-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 17 de marzo de 2025. AVACEN FÍSICO DE LA EJECUCIÓN DEL ANTICIPO: se estima el 49% de avance físico.

No.	DESCRIPCIÓN DEL RENGLO	TOTAL RENGLO	MES						
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
1	TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES DEL PROYECTO								
1.0	Instalación de todos los señalamientos del proyecto	0 2,578.53	*****						
1.1	Instalación de bodega para almacenaje de materiales	0 15,977.41	0	15,977.41					
1.3	Sistema de video vigilancia del proyecto	0 144,235.30	0		72,117.65	0			72,117.65
2	TRABAJOS PRELIMINARES PISTA								
2.1	Descontaminación de pista de atletismo	0 805,776.33	0	805,776.33					
2.2	Demolición de base de arena en atletismo	0 22,163.70	*****						
2.3	Demolición de banquetas en atletismo	0 41,872.63	0	41,872.63					
2.4	Reparación de banquetas de atletismo	0 161,601.05							
2.5	Trazo e instalación de ceras CP1 y CP2	0 24,839.41		0	24,839.41				
2.6	Revisión luminaria de pista de atletismo	0 125,033.15							
2.7	Trazo de pista de atletismo	0 26,208.12					0		26,208.12
3	TRABAJOS PRELIMINARES CANCHA DE FUTBOL								
3.1	Corte y traslado de grama natural	0 407,521.01	0	407,521.01					
3.2	Traslado de grama a Complejo Deportivo de Zacapa	0 115,073.34		0	115,073.34				115,073.34
3.3	Descontaminación de varcos de perilla en canchales	0 3,321.30	0	3,321.30					

  Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisora de Obra Subgerencia de Infraestructura CDAG	  Vo. Bo. Ing. Oscar Rumbido Turcios Pacheco Director de Supervisión Subgerencia de Infraestructura CDAG
--	--

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		1 de 9	
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781
SUPERVISOR CDAG:		Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887	
DIRECCIÓN:		10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA	
SUPERVISOR DE LA EMPRESA:		Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683	
EMPRESA EJECUTORA:		Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	
TEMPORALIDAD:		1 al 31 de marzo de 2025	
FECHA DE INFORME:		31 de marzo de 2025	
CANTIDADES CONTRATADAS			
No.	RENLÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.01	Corte y levantado de grama	M²	10,924.96
PRECIO UNITARIO		Q37.30	
PRECIO TOTAL		Q407,501.01	
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	
Porcentaje (%) avance global		11.73%	
DESCRIPCION DEL RENGLÓN			
Corte y levantado de grama natural: Corte y levantado de grama natural, área de campo y área alrededor de pista de atletismo, en tepe con maquinaria industrial la cual permitirá hacer rollos aptos para su traslado a donde se indique por parte del supervisor designado de CDAG. Observación a la especificación: a) Los tepes miden 0.40 metros de ancho por 2.20 metros de largo y b) Se realizan entre 1000 a 1200 tepes diariamente.			
			

	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				8 de 9
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyén Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 31 de marzo de 2025
				FECHA DE INFORME:	31 de marzo de 2025

GENERALIDADES

Rectificación de medidas: con fundamento en las especificaciones técnicas del Contrato Administrativo 478, se rectificaron las medidas de aceras y cunetas existentes.



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		7 de 9	
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)		
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23697781
SUPERVISOR CDAG:		Arq. María de los Angeles Álvarez Madrano Colegiado Activo No. 4887	
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:
EMPRESA EJECUTORA:		Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyén Colegiado Activo No. 3683	
Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 31 de marzo de 2025
FECHA DE INFORME:		31 de marzo de 2025	
CANTIDADES CONTRATADAS			
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.02	Acarreo de tierra en pista	M3	3,751.00
PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
Q144.50		Q542,019.50	
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	
Porcentaje (%) avance global		11.73%	
DESCRIPCION DEL REGLÓN			
Acarreo de tierra excavada, la misma deberá ser llevada a botadero previamente autorizado, tomar en cuenta factor de expansión de tierra al momento de la excavación. Observaciones a la especificación: Ninguna			
 			

		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				6 de 9
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:		478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:		10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:		Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 31 de marzo de 2025
					FECHA DE INFORME:	31 de marzo de 2025
CANTIDADES CONTRATADAS						
No.	REGLÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.04	Excavación		M³	6,424.90	Q149.34	Q959,360.16
Porcentaje (%) de avance del renglón			100.00%	Porcentaje (%) avance global		11.73%
DESCRIPCION DEL REGLÓN						
Excavación de área de campo de fútbol: se deberán retirar cero punto setenta (0.70) metros de profundidad de tierra, la misma deberá ser llevada a botadero previamente autorizado, luego se deberá compactar por medios mecánicos toda la superficie del terreno para dejar una superficie homogénea y lista para el trabajo, según planos. Observaciones a la especificación: ninguna.						
						
A finalizado la excavación acorde a las especificaciones técnicas, actualmente se está realizando corte del terreno a partir del centro hacia las orillas de cancha para dejar los pañuelos naturales en tierra.						

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		5 de 9	
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)		
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781
SUPERVISOR CDAG:		Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887	
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:
EMPRESA EJECUTORA:		Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3693	
Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 31 de marzo de 2025
		FECHA DE INFORME:	31 de marzo de 2025
CANTIDADES CONTRATADAS			
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.04	Excavación	M ³	6,424.90
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global
			11.73%
DESCRIPCION DEL REGLÓN			
Excavación de área de campo de fútbol: se deberán retirar cero punto setenta (0.70) metros de profundidad de tierra, la misma deberá ser llevada a botadero previamente autorizado, luego se deberá compactar por medios mecánicos toda la superficie del terreno para dejar una superficie homogénea y lista para el trabajo, según planos. Observaciones a la especificación: ninguna.			
			

		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		4 de 9	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:		478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Álvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:		10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:		Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 31 de marzo de 2025
				FECHA DE INFORME:	31 de marzo de 2025
CANTIDADES CONTRATADAS					
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.02	Traslado de grama	M2	10,924.96	Q10.35	Q113,073.34
Porcentaje (%) de avance del reglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		11.73%
DESCRIPCION DEL REGLÓN					
Traslado de grama hacia el Complejo Deportivo de Zacapa, donde será entregado al administrador del mismo y colocada donde este indique, tomar en cuenta costos de traslado y descarga de la misma en el lugar indicado.					
					
650 metros cuadrados de grama desperdiciada por traslado, el cambio de clima y contaminación por gallina ciega.					
					
Se colocaron 171.1 metros cuadrados de grama segregados en la CANCHA NO. 2 del Complejo Deportivo de Zacapa.					

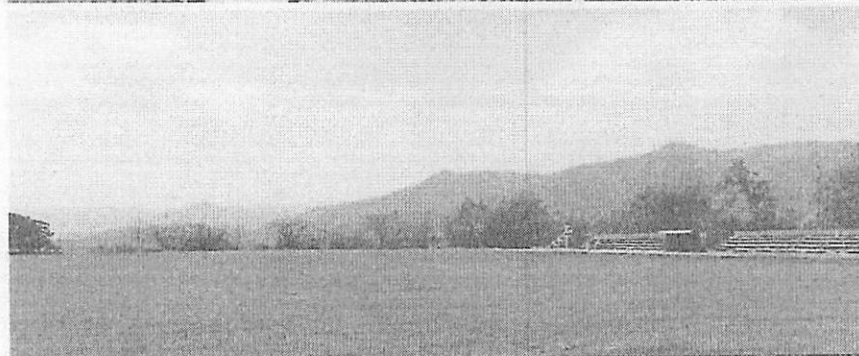
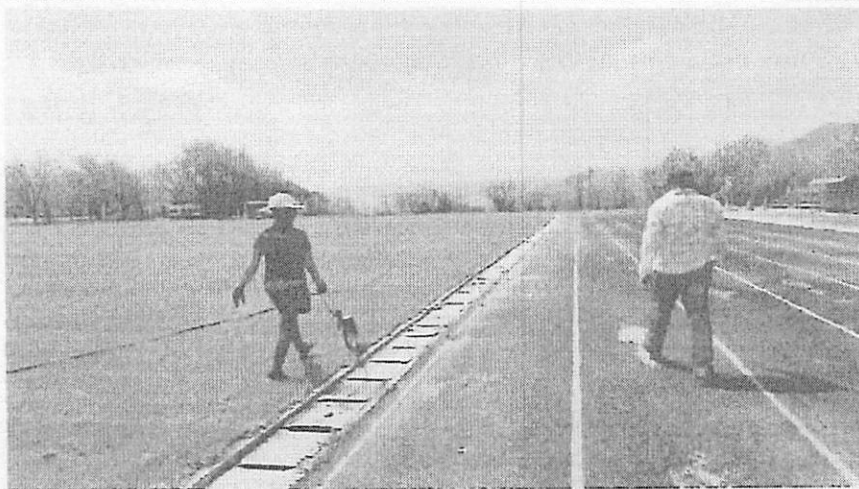
		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				3 de 9
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:		478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Álvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:		10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:		Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 31 de marzo de 2025
					FECHA DE INFORME:	31 de marzo de 2025
CANTIDADES CONTRATADAS						
No.	REGLÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
3.02	Traslado de grama			M2	10,924.96	Q10.35
Porcentaje (%) de avance del renglón				100.00%	Porcentaje (%) avance global	
					11.73%	
DESCRIPCION DEL REGLÓN						
Traslado de grama hacia el Complejo Deportivo de Zacapa, donde será entregado al administrador del mismo y colocada donde este indique, tomar en cuenta costos de traslado y descarga de la misma en el lugar indicado.						
						
Estado actual de la grama trasladada						

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				2 de 9
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 31 de marzo de 2025
			FECHA DE INFORME:	31 de marzo de 2025


CANTIDADES CONTRATADAS					
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.02	Traslado de grama	M2	10,924.96	Q10.35	Q113,073.34
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		11.73%

DESCRIPCION DEL REGLÓN

Traslado de grama hacia el Complejo Deportivo de Zacapa, donde será entregado al administrador del mismo y colocada donde este indique, tomar en cuenta costos de traslado y descarga de la misma en el lugar indicado. Observación a la especificación: a) se realizó inspección en cancha del Complejo Deportivo de Zacapa para rectificar el metraje de grama retirada del Estadio Doroteo Guamuch Flores y trasladado al Complejo Deportivo de Zacapa en cumplimiento al Renglón No. 3.02 del Contrato Administrativo 478. Se realizaron las mediciones correspondientes y se estimó un área total de 8.560.10 METROS CUADRADOS en total, distribuidos de la siguiente manera: a) 7,739.00 metros cuadrados instalados en la CANCHA NO. 1 que mide 109 metros de largo por 71 metros de ancho, b) 171.1 metros segregados en la CANCHA NO. 2, y, c) 650 metros cuadrados de grama desperdiciada por traslado, el cambio de clima y contaminación por gallina ciega. Por medio de una minuta se da por recibido por parte de la Administración del Complejo Deportivo de Zacapa y a conformidad la cantidad de 8.560.10 METROS CUADRADOS y b) Está en proceso la elaboración del informe específico sobre el metraje total de la grama, se incluirá más información en el siguiente informe.



Rectificación de medidas de cancha y estimación de metros cuadrados colocados en el Complejo Deportivo de Zacapa



O-CDAG-SDI-032-2025
Guatemala, 07 de abril de 2025

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente




Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."*


Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de marzo 2025.

Cordialmente,


Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-




Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-


Licda. Marta Alicia Melgarejo
Subgerente Financiero
-CDAG-


Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Gerente en Funciones
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt



Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 ABR 2025

Firma:  Hora: 15:51
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Estimada Licenciada Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."*


Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de marzo 2025.

Cordialmente,


Licda. Karin Julissa Rivera Vázquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-


Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-


Licda. Marta Alicia Melgarejo
Subgerente Financiero
-CDAG-


Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Gerente en Funciones
-CDAG-
