

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN


**Licda. Karin J. Rivera Viquez**
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


**Arq. Mónica del Rosario Oliva**
Subgerente de Planificación de
Proyectos de Infraestructura


CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


**Licda. Lesly Grimalva Rodríguez**
Encargado de Despacho


CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
GUATEMALA, C. A.


**Lic. Luis Nestor Madrid González**
Gerente CDAG


CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.


**Licda. Marta A. Meighan Juárez**
Subgerente
Subgerencia Financiera


CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.


**Arq. Oscar Raúl Barrios**
Subgerente General de
Infraestructura


CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
GUATEMALA, C. A.

AVANCES JULIO 2025

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción _____	2
Marco Estratégico Institucional _____	3
Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión _____	4
Anexo Documentación de Respaldo _____	10

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, conforme al Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas; y Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Capítulo VI, Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38, Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii), establece: *“En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos (...)”*, en cumplimiento, se integra Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2025.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia integra el presente informe, de acuerdo con el seguimiento realizado por parte del Jefe de Proyectos de Inversión, de la Dirección de Diseño y Planificación de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, según Oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-034-2025 de fecha 30 de julio de 2025. Asimismo, el Director de Diseño y Planificación y Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura remiten el Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-353-2025 de fecha 30 de julio de 2025, informando que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con seis proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), tres de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y tres pendientes de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

Marco Estratégico Institucional



NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitude - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

En la Subgerencia de Desarrollo Institucional ingresó Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-353-2025 de fecha 30 de julio de 2025, dirigido a Subgerente de Desarrollo Institucional con atención al Director de Gestión de la Estrategia, firmado por el Director de Diseño y Planificación y Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura; en el cual adjuntan el Oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-034-2025 de fecha 30 de julio de 2025 remitido por el Jefe de Proyectos de Inversión de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, en el cual informa que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con seis proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), tres de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y tres pendientes de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

La Subgerencia Financiera a través de la Dirección de Presupuesto, presentó reporte R00815611.rpt Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, el cual refiere una ejecución presupuestaria de Q. 5,793,697.50 y porcentaje de ejecución del 17.86% del proyecto identificado con SNIP 333700 "Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala" el cual representa el avance financiero. Así mismo, aparece el proyecto identificado con el SNIP 301752 Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34

Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén dicho reporte no presenta porcentaje de avance físico ni financiero.

La subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura mediante Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-353-2025 de fecha 30 de julio de 2025, reportó el avance físico de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, siendo el resultado siguiente:

1. Código SNIP 301752

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén:

- El proyecto se encuentra en estatus: "Adjudicado" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto aparece en el ciclo del proyecto "En Ejecución". Fue aprobado en SEGEPLAN, el avance físico y financiero es cero, ya que no ha dado inicio la ejecución de este.

2. Código SNIP 333700

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala.

- En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de "En Ejecución", aprobado por SEGEPLAN y en Guatecompras con el estatus de "Adjudicado" con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 23637781.

- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de julio
- según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 29.20%; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número 7-2025 de fecha 31 de julio de 2025 en formato PDF.

Se adjunta evidencia de los manifestado en los incisos anteriores: (a) capturas de pantalla de la información que aparece en el SINIP en BÚSQUEDA DE PROYECTOS, (b) captura de pantalla del estado actual que aparece en el SINIP en el MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, en el que se indica que ya fue recibido en SIGES/SICOIN, y (c) como documento adjunto: Informe de Supervisión No. 7-2025 de fecha 31 de julio de 2025.

3. Código SNIP 336771

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cubierta de Piscina Complejo Deportivo Calzada Ramiro de León Carpio, Carretera a Aldea Santa Lucía, Zacapa, Zacapa.

- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto se encuentra en el ciclo de "Emisión de opinión técnica".
- En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.
- No aparece en Guatecompras.

4. Código SNIP 333856

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas, Gimnasio para Gimnasia Rítmica, Calle Ancha de Los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de “En Ejecución” en el SINIP, aprobado por SEGEPLAN
- El proyecto se encuentra en estatus “No adjudicado” en Guatecompras, con Numero de Operación Guatecompras (NOG) 23549661. Por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, deberá iniciar el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

5. Código SNIP 359269

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulos Típicos en Complejo Deportivo de Poptún, 7a. Avenida Km. 380, Poptún, Petén.

- Aunque el proyecto ya fue ingresado al SINIP, se encuentra en evaluación técnica, habiendo sido programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2026.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de “Registro” en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: Finalizado (Con observaciones respondidas) (NOG) 27221393.

6. Código SNIP 359780

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Complejo Deportivo, Zona 3, 4ª. Calle entre 25 y 28 Av., Quetzaltenango, Quetzaltenango.

- Aunque el proyecto ya fue ingresado al SINIP, se encuentra en evaluación técnica, habiendo sido programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2026.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de “Registro” en el SINIP, aun no aparece en Guatecompras.

Por lo anteriormente descrito, se informa lo siguiente:

- a) Con relación al SNIP 333700 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala, según Sistema Nacional de Inversión Pública se tiene reportado la meta global de 18,502.00m², con una ejecución de 5,226.12m² equivalente a un avance ponderado del 29.20% con relación al avance físico sobre la meta global. Así mismo refiere una ejecución presupuestaria de Q. 5,793,697.50 y porcentaje de ejecución del 17.86%
- b) El proyecto con SNIP 301752 Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén, según reporte R00815611.rpt Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, no presenta avance físico y financiero.

Anexo Documentación de Respaldo

CDAG



OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-353-2025
Guatemala, 30 de julio de 2025

Licenciada
Karin Julissa Rivera
Subgerente de Desarrollo Institucional
Presente



Con atención:
Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licenciada Rivera:

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades cotidianas.

Por este medio me permito remitir oficio O-CDAG-SPPI-JPI-0034-2025, de fecha 30 de julio de 2025, del suscrito Arquitecto Julio José Yanes Moreno, Jefe de Proyectos de Inversión, de la Dirección de Diseño y Planificación, en el cual informa que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala-CDAG, cuenta con seis proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, tres de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), y tres pendientes de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026, de acuerdo con información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos-SNIP.

Por lo anterior descrito, solicito su valioso apoyo, para informar lo manifestado a la Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, a efecto proceder con las gestiones que correspondan.

Sin más que agregar, me suscribo de usted, con muestras de estima y respeto.

Atentamente,

Arq. José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación

Vo. Bo. Arq. Monica Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura



Arquitecto José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
Presente



Respetable Arquitecto Vega:

Reciba un cordial saludo de la Jefatura de Proyectos de Inversión de la Dirección de Diseño y Planificación, Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo del presente es para Informarle que CDAG cuenta con **SEIS** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, **TRES** de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y **TRES** pendientes de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026 de acuerdo con información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos SNIP, a continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

(1) CÓDIGO SNIP 301752:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.

- El proyecto se encuentra en estatus: "Adjudicado" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto aparece en el ciclo del proyecto "En ejecución". Fue aprobado en SEGEPLAN, el avance físico y financiero es cero, ya que no ha dado inicio la ejecución de este.

(2) CÓDIGO SNIP 333700:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.

- En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de "En ejecución", aprobado por SEGEPLAN y en Guatecompras con el estatus de "Adjudicado" con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 23637781.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de **JULIO** según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de **29.20%**; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número **7-2025** de fecha **31 de julio de 2025** en formato PDF.



Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores: (a) capturas de pantalla de la información que le aparece en el SINIP en BÚSQUEDA DE PROYECTOS; (b) captura de pantalla del estado actual que le aparece en el SINIP en el MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, en el que se indica que ya fue recibido en SIGES/SICOIN; y (c) como documento adjunto: informe de supervisión número **7-2025** de fecha **31 de julio de 2025**.

(3) CÓDIGO SNIP 336771:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.

- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto se encuentra en el ciclo de "Emisión de opinión técnica".
- En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.
- No aparece en Guatecompras.

(4) CÓDIGO SNIP 333856:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP, aprobado por SEGEPLAN.
- El proyecto se encuentra en estatus: "No Adjudicado" en Guatecompras con Número de Operación GUAATECOMPRAS (NOG) 23549661. Por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, deberá iniciar el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

(5) CÓDIGO SNIP 359269:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN.

- Aunque el proyecto ya fue ingresado al SINIP, se encuentra en evaluación técnica, habiendo sido programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2026.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: Finalizado (Con observaciones respondidas) (NOG) 27221393.



(6) CÓDIGO SNIP 359780:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, COMPLEJO DEPORTIVO,
ZONA 3, 4A. CALLE ENTRE 25 Y 28 AV., QUETZALTENANGO,
QUETZALTENANGO.

- Aunque el proyecto ya fue ingresado al SINIP, se encuentra en evaluación técnica, habiendo sido programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2026.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP, aún no aparece en Guatecompras.

Respetuosamente, se solicita informar lo manifestado en el presente documento a la Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia Desarrollo Institucional a efecto de que realice lo conducente.

Sin otro particular, atentamente.

Arq. Julio José Yanes Moreno
Jefe de Proyectos de Inversión
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

c.c. Archivo

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt



CAPTURAS DE PANTALLA TOMADAS DEL SINIP EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Código: 333700

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión
técnica



En ejecución



Finalizado

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

 Boleta del proyecto

Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

Institución: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**

Unidad ejecutora: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**

Ubicación geográfica: **GUATEMALA, GUATEMALA**

Sector específico: **SECTORIAL**

Sector: **CULTURA Y DEPORTES**

Especie: **INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**

Situación actual: **EN EJECUCIÓN**

Etapa actual: **EN EJECUCIÓN**

Meta global: **18,502.00 m²**, Ejecutado: **5,403.36 m²** (Avance ponderado **29.20 %**) Nog: 23637781

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt

INFORMACIÓN ANUAL

Ejercicio	Información financiera (En Quetzales)				
	Monto solicitado	Monto inicial	Monto vigente	Monto ejecutado	Avance financiero
2025	32,444,706.00	0	32,444,764.80	5,793,697.50	17.86 %
TOTAL:				5,793,697.50	

Ejercicio	Información física			Avance meta anual
	Meta física		Meta ejecutada	
2025	18,502 Metro cuadrado		11,430.54 Metro cuadrado	61.78 %

FOTOGRAFÍAS

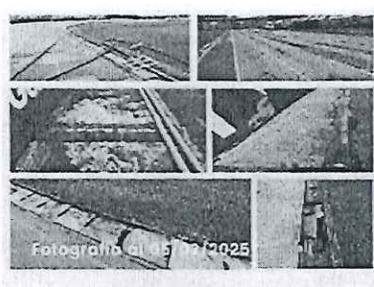



Seguimiento de Proyectos

Usuario: ANGEL ESTUARDO VALDEZ PAIZ (APAIZ)
Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUANUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA
Meta vigente: 18,502.00 m² | Avance: 28.25%
Ejecución 2025: (ACTIVO) Avance Financiero: 17.86% - Avance meta anual 59.09%
NOG's: - 23637781 - NEC's:

AVANCE FISICO

Seleccione la fecha que desea acceder o el boton de NUEVA para agregar.

Exec.	Fecha	Ri	Sp	RECIBIDO
2025	30/07/2025	0	1	✓
2025	24/06/2025	0	1	✓
2025	27/04/2025	0	1	✓
2025	11/06/2025	0	1	✓
2025	29/03/2025	0	1	✓
2025	03/06/2025	0	1	✓
2025	06/07/2025	0	1	✓

NUEVA

Exito!

Ejecución física grabada.

Execico:	2025		
Fase:	Ejecucion		
Fecha del avarce:	30/07/2025		
# Documento:	7-2025		
Fecha del Documento:	31/07/2025		
Execico	Unidad de medida	Ejecutado acumulado	
Medidas mitigación ambiental	Arfucio de metal	72	
Area de deportes y recreación	m ²	2,725	
Instalaciones	Metro	2,224	
Area de servicios	m ²	123	
USUARIO QUE REGISTRO: ANGEL ESTUARDO VALDEZ PAIZ			
FECHA DE REGISTRO: 30/07/2025 - 69:55:29			



OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-343-2025
Guatemala, 29 de julio de 2025

Arq. JAVL
30/07/2025
8:54 Horas
Recibido



Arquitecto
Julio José Yanes Moreno
Jefe de Proyectos de Inversión
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Presente

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones diarias.

En seguimiento a lo solicitado por medio de oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-025-2025, de fecha 17 de julio de 2025, como parte del procedimiento ISO para proyectos que deben registrarse en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública –SNIP, el avance físico de los proyectos de inversión que se encuentran en la etapa de ejecución y que la Dirección de Supervisión tiene a cargo, y para dar cumplimiento al Oficio Circular DID-01-2020 y Oficio Circular DASID-04-2023, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

Por lo anterior, me permito trasladar OFICIO NO.269-2025-SPPI-DISUP-CDAG, de fecha 28 de julio de 2025, de la suscrita Arq. María de los Ángeles Álvarez Medrano, Supervisor de la Dirección de Supervisión, en la cual adjunta el informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de julio de 2025, del proyecto de inversión **SNIP 333700** denominado **"MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA"**.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted con muestras de estima y respeto.

Atentamente,


Arq. José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura

CC. ARCHIVO
JAVL/avir
Dirección de Diseño y Planificación



OFICIO NO. 269-2025-SPPI-DISUP-CDAG
Guatemala, 28 de julio de 2025

Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos
de Infraestructura CDAG



Estimado Arquitecto:

Por este medio se da respuesta a su Oficio NO. SPPI-DDP-CDAG-297-2025, en el que solicita el informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de julio de 2025, del proyecto de inversión SNIP 333700: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA".

Se remite el informe solicitado para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Atentamente agradecida por su atención.



M. Medrano
Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano
Supervisor
CDAG



[Handwritten Signature]
Vo. Bo. Ing. Oscar Rinaldo Turcios Pacheco
Director de Supervisión
de Proyectos de Planificación
CDAG



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFORME DE AVANCE FÍSICO

Informe de Supervisión No. 7-2025		Fecha: 31 / 07 / 2025
NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA"		
SNIP: 333700	NOG: 23637781	
Inicio obra: 6/01/2025	Final obra: 6/12/2025	Plazo: 335 días
Supervisor nombrado: Arquitecta María de los Angeles Alvarez Medrano	Collegiado activo No. 4887	Nombramiento del Supervisor: Oficio 536-2024-SGI-DISUP-CDAG
Director Supervisión: Ingeniero Oscar Rumaído Turcios Pacheco	Collegiado activo No. 16761	
Empresa Adjudicada: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	Nit: 39315193	Representante Legal: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz

Correspondiente del: 1/07/2025 al 31/07/2025

Modificaciones al Contrato (adjuntar fotocopia del documento)	Fecha:	
	Fecha:	
	Fecha:	
Acuerdos (adjuntar fotocopia del documento)	Fecha:	
	Fecha:	
Documentos de cambio (adjuntar fotocopia del documento)	Fecha:	
	Fecha:	

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO				CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP					
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	Ejecutado por renglón %	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES DEL PROYECTO											
1.01	Instalación de rótulo de identificación del proyecto.	Unidad	1.00	Q9,976.83	Q9,976.83				100.00%	1.00	1.00	1.00


CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO				CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP				
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
1.02	Instalación de bodega para almacenaje de materiales.	Unidad	1.00	Q15,977.41	Q15,977.41				100.00%	1.00	1.00	1.00
1.03	Sistema de video vigilancia del proyecto	Unidad	1.00	Q144,338.99	Q144,338.99				100.00%	1.00	1.00	1.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES PISTA											
2.01	Desinstalación de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q149.47	Q903,776.33				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
2.02	Demolición de cajas de arena existentes	Unidad	2.00	Q11,084.35	Q22,168.70				100.00%	2.00	2.00	2.00
2.03	Demolición de banquetas existentes.	Metro cuadrado	261.64	Q159.81	Q41,812.69				100.00%	261.64	261.64	261.64
2.04	Resanado de banqueta de concreto	Metro cuadrado	682.24	Q207.26	Q141,401.06				0.00%	682.24	0.00	0.00
2.05	Trazo e instalación de centros CP1 y CP2.	Metro cuadrado	10,924.96	Q2.26	Q24,680.41				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
2.06	Nivelación laser de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q21.34	Q129,033.16				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
2.07	Trazo de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q4.33	Q26,181.52				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
3.00	TRABAJOS PRELIMINARES CANCHA DE FUTBOL											
3.01	Corte y levantado de gramilla natural.	Metro cuadrado	10,924.96	Q37.30	Q407,501.01				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
3.02	Traslado de gramilla a Complejo Deportivo de Zacapa	Metro cuadrado	10,924.96	Q10.35	Q113,073.34				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
3.03	Desinstalación de marcos de portería existentes	Unidad	2.00	Q4,960.65	Q9,921.30				100.00%	2.00	2.00	2.00
3.04	Excavación	Metro cúbico	6,424.90	Q149.34	Q959,494.57				100.00%	6,424.90	6,424.90	6,424.90
3.05	Nivelación laser de campo de futbol	Metro cuadrado	10,924.96	Q22.59	Q246,794.85				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón			CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)		
4.00	CISTERNA													
4.01	Corte de piso de concreto	Metro cuadrado	46.44	Q143.82	Q6,679.00				100.00%	46.44	0.00	46.44		
4.02	Excavación de área de cisterna	Metro cúbico	158.00	Q210.44	Q33,249.52				100.00%	158.00	0.00	158.00		
4.03	Fundición de piso	Metro cuadrado	46.44	Q1,301.50	Q60,441.66				0.00%	46.44	0.00	0.00		
4.04	Fundición de muros	Metro cuadrado	83.50	Q1,115.53	Q93,146.76				0.00%	83.50	0.00	0.00		
4.05	Fundición de techo	Metro cuadrado	46.44	Q1,084.16	Q50,348.39				0.00%	46.44	0.00	0.00		
4.06	Tapadera de cisterna.	Unidad	2.00	Q2,676.97	Q5,353.94				0.00%	2.00	0.00	0.00		
4.07	Aplicación de impermeabilizante	Metro cuadrado	130.00	Q318.30	Q41,379.00				0.00%	130.00	0.00	0.00		
4.08	Relleno de corte	Metro cúbico	5.00	Q1,760.75	Q8,803.75				0.00%	5.00	0.00	0.00		
5.00	PISTA DE ATLETISMO													
5.01	Excavación en área de pista h: 0.44 metros	Metro cúbico	2,679.00	Q78.33	Q209,846.07				100.00%	2,679.00	2,679.00	2,679.00		
5.02	Acarreo de tierra	Metro cúbico	3,751.00	Q144.50	Q542,019.50				100.00%	3,751.00	3,751.00	3,751.00		
5.03	Instalación de capa sub-base	Metro cúbico	2,309.00	Q534.02	Q1,233,052.18				100.00%	2,309.00	2,309.00	2,309.00		
5.04	Instalación de base compactada	Metro cúbico	770.00	Q434.26	Q334,380.20				100.00%	770.00	770.00	770.00		
5.05	Riego de imprimación	Metro cuadrado	7,694.00	Q51.26	Q394,394.44				0.00%	7,694.00	0.00	0.00		
5.06	Binder asfáltico	Metro cúbico	385.00	Q4,643.50	Q1,787,747.50				0.00%	385.00	0.00	0.00		
5.07	Riego de liga	Metro cuadrado	7,694.00	Q14.48	Q111,409.12				0.00%	7,694.00	0.00	0.00		
5.08	Capa bituminosa (Concreto asfáltico)	Metro cúbico	231.00	Q3,913.40	Q903,995.40				0.00%	231.00	0.00	0.00		
5.09	Pavimento sintético	Metro cuadrado	7,693.99	Q1,240.03	Q9,540,778.42				0.00%	7,693.99	0.00	0.00		

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
5.10	Borde de concreto	Metro lineal	850.00	Q738.17	Q627,444.50				100.00%	850.00	850.00	850.00
5.11	Pavimento color rojo	Metro cuadrado	2,156.25	Q1,252.14	Q2,699,926.88				0.00%	2,156.25	0.00	0.00
5.12	Área de pavimento de 20 mm de espesor	Metro cuadrado	167.20	Q1,519.57	Q254,072.10				0.00%	167.20	0.00	0.00
5.13	Área de pavimento de 25 mm de espesor	Metro cuadrado	12.96	Q3,074.40	Q39,844.22				0.00%	12.96	0.00	0.00
5.14	Marcaje de pista de atletismo	Unidad	1.00	Q126,421.60	Q126,421.60				0.00%	1.00	0.00	0.00
6.00	DRENAJE PISTA DE ATLETISMO											
6.01	Canal de concreto sección 1	Metro lineal	273.88	Q2,095.00	Q573,778.60				100.00%	273.88	273.88	273.88
6.02	Canal de concreto sección 2	Metro lineal	188.18	Q3,775.41	Q710,456.65				100.00%	188.18	188.18	188.18
6.03	Tubo PVC de 2 pulgadas de diámetro	Metro lineal	142.00	Q276.16	Q39,214.72				100.00%	142.00	0.00	142.00
6.04	Tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro	Metro lineal	216.00	Q269.71	Q58,257.36				0.00%	216.00	0.00	0.00
6.05	Tubo PVC de 4 pulgadas de diámetro	Metro lineal	9.00	Q2,528.76	Q22,758.84				0.00%	9.00	0.00	0.00
6.06	Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro	Metro lineal	75.00	Q1,711.79	Q128,384.25				0.00%	75.00	0.00	0.00
6.07	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	Metro lineal	450.00	Q958.00	Q431,100.00				0.00%	450.00	0.00	0.00
6.08	Ductos secos	Metro lineal	215.00	Q715.76	Q153,888.40				0.00%	215.00	0.00	0.00
7.00	DRENAJE FRANCÉS											
7.01	Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro	Metro lineal	1,293.00	Q783.55	Q1,013,130.15				100.00%	1,293.00	1,100.00	1,293.00
7.02	Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro	Metro lineal	48.00	Q3,059.17	Q146,840.16				0.00%	48.00	0.00	0.00

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO					CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón		CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP			
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	
7.03	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	Metro lineal	48.00	Q3,054.14	Q146,598.72				100.00%	48.00	48.00	48.00	
7.04	Tubo PVC de 15 pulgadas de diámetro	Metro lineal	71.00	Q3,018.68	Q214,326.28				0.00%	71.00	0.00	0.00	
8.00	SUPERFICIE DE CAMPO DE FUTBOL												
8.01	Instalación de sub base piedra de 1/2 pulgada	Metro cúbico	775.00	Q875.00	Q523,125.00				100.00%	775.00	775.00	775.00	
8.02	Instalación de base piedra de 3/8 de pulgada	Metro cúbico	388.00	Q663.35	Q257,379.80				100.00%	388.00	388.00	388.00	
8.03	Instalación de arena lavada	Metro cúbico	1,936.00	Q401.79	Q777,865.44				0.00%	1,936.00	0.00	0.00	
8.04	Instalación de carpeta de grama sintética	Metro cuadrado	7,742.98	Q392.58	Q3,039,739.09				0.00%	7,742.98	0.00	0.00	
8.05	Semilla de grama tipo bermuda	Kilogramo	200.00	Q271.01	Q54,202.00				0.00%	200.00	0.00	0.00	
8.06	Marcaje de cancha de futbol	Unidad	1.00	Q4,841.51	Q4,841.51				0.00%	1.00	0.00	0.00	
8.07	Mantenimiento de grama	Meses	3.00	Q151,972.82	Q455,918.46				0.00%	3.00	0.00	0.00	
8.08	Porterías	Unidad	2.00	Q54,425.87	Q108,851.74				0.00%	2.00	0.00	0.00	
8.09	Limpieza final	Metro cuadrado	7,750.00	Q43.91	Q340,302.50				0.00%	7,750.00	0.00	0.00	
9.00	SISTEMA DE RIEGO												
9.01	Instalación de tubería PVC 3/4 de pulgada de diámetro	Metro lineal	219.00	Q177.28	Q38,824.32				0.00%	219.00	0.00	0.00	
9.02	Instalación de tubería PVC 1 pulgada de diámetro	Metro lineal	133.00	Q254.30	Q33,821.90				0.00%	133.00	0.00	0.00	
9.03	Instalación de tubería PVC 1-1/2 pulgada de diámetro	Metro lineal	46.00	Q548.02	Q25,208.92				0.00%	46.00	0.00	0.00	
9.04	Instalación de tubería PVC 3 pulgadas de diámetro	Metro lineal	85.00	Q442.86	Q37,643.10				0.00%	85.00	0.00	0.00	

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón			CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes de informe de supervisión)		
9.05	Instalación de tubería PVC 1 pulgada eléctrico	Metro lineal	85.00	Q404.57	Q34,388.45				0.00%	85.00	0.00	0.00		
9.06	Panel de control de aspersores	Unidad	1.00	Q11,867.77	Q11,867.77				0.00%	1.00	0.00	0.00		
9.07	Instalación de filipon eléctrico	Unidad	3.00	Q855.58	Q1,966.74				0.00%	3.00	0.00	0.00		
9.08	Instalación de electroválvulas	Unidad	3.00	Q3,319.13	Q9,957.39				0.00%	3.00	0.00	0.00		
9.09	Instalación de aspersores	Unidad	18.00	Q4,168.54	Q75,033.72				0.00%	18.00	0.00	0.00		
9.10	Instalación de sistema de bombeo	Unidad	1.00	Q99,344.75	Q99,344.75				0.00%	1.00	0.00	0.00		
9.11	Instalación de cableado eléctrico	Metro lineal	765.00	Q12.68	Q9,700.20				0.00%	765.00	0.00	0.00		
10.00	DISCIPLINAS INDEPENDIENTES													
10.01	Salto con pértiga	Unidad	16.00	Q525.94	Q8,415.04				0.00%	16.00	0.00	0.00		
10.02	Rta	Unidad	4.00	Q9,163.22	Q36,652.88				0.00%	4.00	0.00	0.00		
10.03	Salto largo	Unidad	4.00	Q39,318.71	Q157,274.84				50.00%	4.00	0.00	2.00		
10.04	Lanzamiento de peso	Unidad	2.00	Q6,806.80	Q13,617.60				0.00%	2.00	0.00	0.00		
10.05	Lanzamiento de martillo y disco	Unidad	1.00	Q47,048.43	Q47,048.43				0.00%	1.00	0.00	0.00		
10.06	Bordillo de aluminio	Metro lineal	398.12	Q455.60	Q181,383.47				0.00%	398.12	0.00	0.00		
11.00	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO													
11.01	Renta de sanitarios portátiles (se deja a discreción el alquiler)	Unidad	72.00	Q734.50	Q52,884.00				48.61%	72.00	29.00	35.00		
11.02	Recipientes para basura	Unidad	20.00	Q235.14	Q4,702.80				100.00%	20.00	20.00	20.00		
11.03	Extracción de basura, rípio y desechos constructivos	Unidad	1.00	Q14,010.59	Q14,010.59				100.00%	1.00	1.00	1.00		

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO					CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón			CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento		CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
11.04	Equipo e implementos para la protección del personal	Unidad	1.00	Q49,283.62	Q49,283.62				1	100.00%	1.00	1.00	1.00
FIANZAS:													
Fianza de anticipo:		Nombre Afianzadora:	Seguros G&T, S.A.	No. de póliza:	Clase C5 PÓLIZA NO. 7082786	Vigente del:		27/10/2025	Porcentaje de avance físico del mes que corresponde el reporte en el Módulo de Seguimiento del SNIP.				
Fianza de cumplimiento de contrato:		Nombre Afianzadora:	Seguros G&T, S.A.	No. de póliza:	Clase C5 PÓLIZA NO. 7082785	Vigente del:		6/12/2025	AVANCE FINANCIERO:				
Fianza de conservación de obra:		Nombre Afianzadora:		No. de póliza:		Vigente del:			Motivo: Anticipo				
Fianza de saldos deudores:		Nombre Afianzadora:		No. de póliza:		Vigente del:			20.00%				
Observaciones: (describir acontecimientos importantes ocurridos durante el período del presente informe de avance físico de la obra)													
Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisor CDAG				 Vo. Bo. Ing. Oscar Rumbaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Planificación CDAG					 Vo. Bo. Arq. Monica del Rosario Oliva Sosa Subgerente de Planificación Proyectos de Infraestructura CDAG				

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		1 de 9	
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)		
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
		TEMPORALIDAD:	1 al 31 de julio de 2025
		FECHA DE INFORME:	31 de julio de 2025
GENERALIDADES			
<p>AVANCE FÍSICO GLOBAL. Se estima un avance físico global de 29.21%.</p>			
<p>REUNIONES SEMANALES DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA: estando presente el supervisor residente de la empresa BREMAR, Director de Supervisión de CDAD, Supervisor de CDAG y arquitecto diseñadores de la Subgerencia de Planificación. Se realizaron las siguientes actividades en las reuniones semanales: a) Revisión de renglones del contrato, b) Revisión de planos, c) Rectificación de avances físicos.</p>			
<p>AVANCES EN ADQUISICIÓN DE PAVIMENTO, GRAMA Y SEMILLA: La Dirección de Supervisión por medio del OFICIO NO. 234-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 14 de julio de 2025, da seguimiento al OFICIO No. 119-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 12 de marzo de 2025, OFICIO No. 145-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 26 de marzo de 2025, OFICIO No. 138-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 10 de junio de 2025 y OFICIO No. 165-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 23 de junio de 2025. En los oficios en mención, se solicita información sobre los avances de adquisición de los siguientes renglones contenidos en el Contrato Administrativo 478. a) RENGLÓN NÚMERO CINCO PUNTO CERO NUEVE: Siete mil seiscientos noventa y tres puntos noventa y nueve (7,693.99) metros cuadrados de pavimento sintético, b) RENGLÓN NÚMERO OCHO PUNTO CERO CUATRO: Siete mil setecientos cuarenta y dos puntos noventa y ocho (7,742.98) metros cuadrados de carpeta de grama sintética, y, c) RENGLÓN NÚMERO OCHO PUNTO CERO CINCO: doscientos (200.00) kilogramos de semilla de grama tipo bermuda. En los tres oficios se solicitó: a) El estado actual de cada renglón de trabajo, indicando avances específicos y porcentajes de ejecución, b) Descripción de actividades realizadas con fechas estimadas de finalización, y, c), Evidencia documental y/o fotografías que respalden el progreso reportado. Hasta la fecha, se ha recibido el oficio CORRELATIVO 46-2025 de fecha 18 de junio de los corrientes, haciendo saber sobre los desacuerdos entre la empresa BREMAR y su proveedor de pavimento, grama y semilla tipo bermuda que ha afectado los avances en la adquisición.</p> <p>Los desacuerdos entre BREMAR y sus proveedores, están fuera de los aspectos técnicos del Contrato Administrativo 478, por lo tanto, todos los atrasos en la ejecución e incumplimiento del tiempo en la entrega del proyecto, quedan bajo la responsabilidad de la empresa BREMAR y son imputables al contratista.</p>			


CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		2 de 9	
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781
DIRECCIÓN:		SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
EMPRESA EJECUTORA:		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 31 de julio de 2025
		FECHA DE INFORME:	31 de julio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.01	Corte de piso de concreto	M ²	46.44	Q143.82	Q6,679.00
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		29.21%

DESCRIPCION DEL REGLÓN

Corte de piso de concreto: Corte de piso de concreto existente, con maquina y disco diamantado, teniendo cuidado de no dañar otras áreas aledañas, todo el material sobrante deberá ser llevado a botadero previamente autorizado, el área de corte corresponde a donde se instalara la nueva cisterna de agua. (Ver planos)

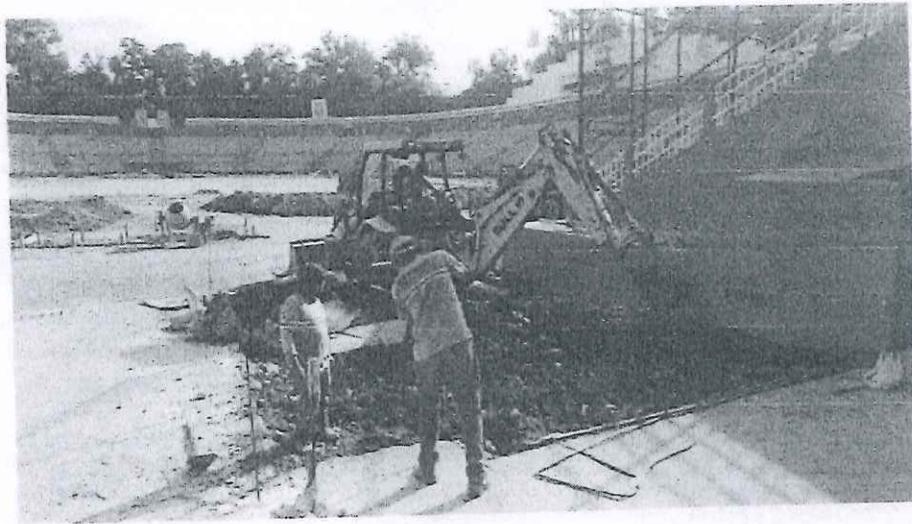

Fotografías del 1 de julio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O


CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				3 de 9
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Álvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 31 de julio de 2025
			FECHA DE INFORME:	31 de julio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.02	Excavación de área de cisterna	m ²	158.00	Q210.44	Q33,249.52
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		29.21%

DESCRIPCION DEL REGLÓN

Excavación de área de cisterna: Excavación de terreno, toda la tierra deberá ser llevada a botadero previamente autorizado, el área y profundidad de corte es la indicada en planos para la cisterna, de encontrarse alguna conexión de agua, drenaje o eléctrica la misma deberá ser modificada y movida para evitar que interfiera en la nueva cisterna, deberán quedar en funcionamiento, los muros de tierra deberán ser reforzados con una lechada de concreto pobre para evitar desprendimientos y la base deberá ser compactada por medio manuales. (Ver planos)

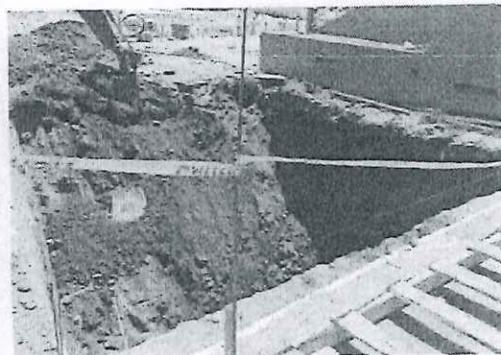

Fotografías del 2 al 10 de julio 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA			4 de 9	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:		478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:		10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:		Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 31 de julio de 2025
					FECHA DE INFORME:	31 de julio de 2025
CANTIDADES CONTRATADAS						
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
4.03	Fundición de piso	M ²	46.44	Q1,301.50	Q60,441.66	
Porcentaje (%) de avance del renglón		0.00%	Porcentaje (%) avance global			29.21%
DESCRIPCION DEL REGLÓN						
<p>Fundición de piso: Fundición de piso de cisterna la cual estará asentada sobre terreno previamente compactado por medios manuales, la misma tendrá un peralte de 0.20 metros con concreto de 4,000 psi de resistencia y reforzada con dos camas de varilla corrugada número 4 colocadas a cada 0.20 metros entre sí en ambos sentidos, con bastones de refuerzo de varilla corrugada número 4 a cada 0.20 metros y de 1.00 metro de longitud en secciones de curva entre losa y muros, el acabado de la misma será un alisado cementicio, todo el acero será grado 60, formaletar de ser necesario en cambios de nivel del piso de la cisterna, incluir todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra para la correcta fundición del piso (Ver planos).</p>						
						
Fotografías del 14 al 18 julio 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O						


CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				5 de 9	
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)					
No. DE CONTRATO: 478		No. NOG: 23637781		SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887	
DIRECCIÓN: 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA				SUPERVISOR DE LA EMPRESA: Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683	
EMPRESA EJECUTORA: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR				TEMPORALIDAD: 1 al 31 de julio de 2025	
				FECHA DE INFORME: 31 de julio de 2025	

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.04	Fundición de muros	M ²	83.50	Q1,115.53	Q93,146.75
Porcentaje (%) de avance del renglón		0.00%	Porcentaje (%) avance global		29.21%

DESCRIPCION DEL REGLÓN

Fundición de muros: Fundición de muros de concreto de 0.20 metros de ancho, con una resistencia de 4,000 psi, reforzados con dos camadas de varillas de acero corrugado número 4 colocadas a cada 0.20 metros entre sí en ambos sentidos, uniendo con los bastones de varilla corrugada número 4 colocados en losa, además de colocar bastones de varilla corrugada número 4 con una longitud de 0.35 metros en muros y de 1.00 para losa de techo como se indica en planos, colocados a cada 0.20 metros, se deberá formaletear de una lado de los muros y el otro se fundirá contra la pared de corte previamente reforzada con una lechada de concreto pobre, se deberán dejar fundidas en muros las escaleras de marinera que permitirán el acceso a la cisterna, con varillas corrugadas número 5 colocadas a cada 0.30 metros entre sí, ver detalle en planos, evitar las juntas frías entre losa y piso de cisterna para evitar pérdidas de agua, incluir todos los materiales, accesorios, equipos, herramientas y mano de obra para la correcta fundición de los muros. (Ver planos)

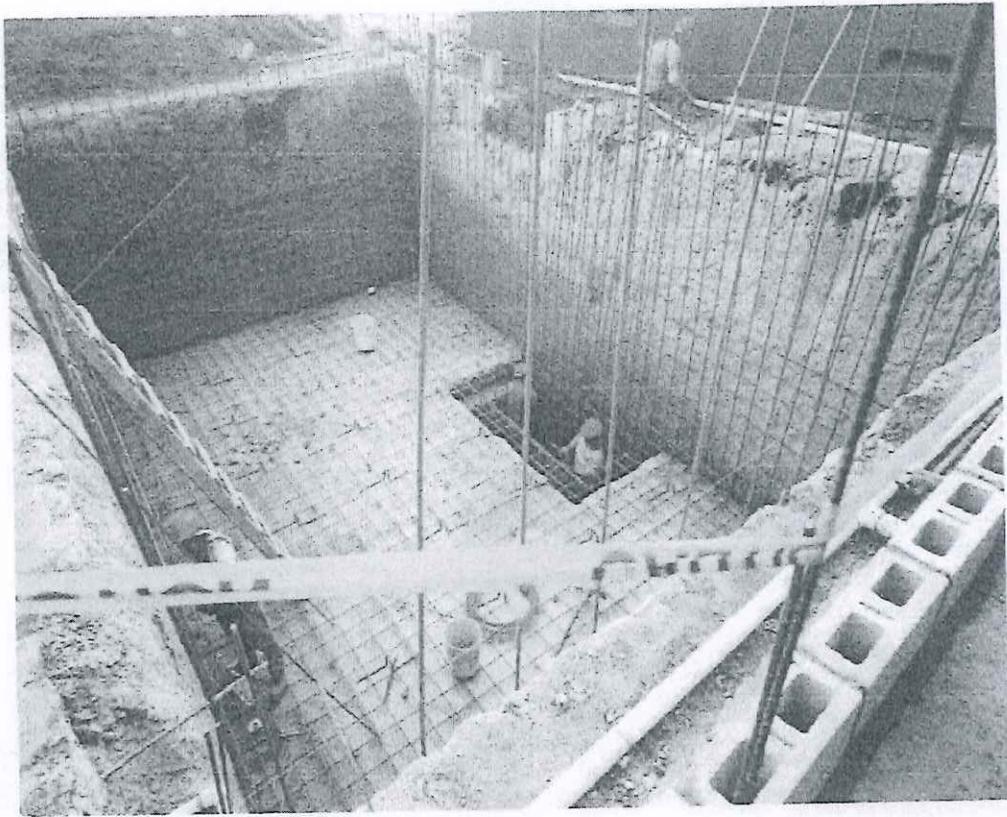

Fotografías del 14 al 16 julio 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				6 de 9
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 31 de julio de 2025
			FECHA DE INFORME:	31 de julio de 2025

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	REGLÓN	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10.03	Salto largo	Unidad	4.00	Q39,318.71	Q157,274.84
Porcentaje (%) de avance del renglón		0.00%	Porcentaje (%) avance global		29.21%

DESCRIPCION DEL REGLÓN

Salto largo: Instalación de 4 unidades de zona de caída, para las especialidades de salto largo y salto triple, las mismas tendrán una dimensión de 9.30 metros de largo por 3.30 metros de ancho y una profundidad de 0.30 metros como mínimo en la capa de arena, en el borde se colocara un bordillo el cual se realizara in situ, con un cimiento corrido de 0.30 metros de base, 0.18 metros de alto y luego 0.15 metros de ancho por 0.40 metros de alto, reforzado con 6 varillas de hierro corrugado número 3 y eslabones de varilla número 2 colocados a cada 0.20 metros entre si, en la parte de caída se tendrán las siguientes capas, piedra de río grande 0.20 metros de diámetro en una capa de 0.30 metros, piedra pequeña de río lavada de 0.15 metros de diámetro en una capa de 0.15 metros de alto y arena de río lavada con una capa de 0.30 metros, entre la piedra pequeña y la arena se deberá colocar una capa de geotextil no cocido como se indica en planos; se colocará un cajetín de 0.355 metros de ancho por 1.22 metros de largo de acero inoxidable grado 304, una sección de plastilina de 0.10 metros de ancho y 0.13 metros de alto por 1.22 metros de largo, una tabla de abatimiento y pavimento sintético en cada fosa como se indica en planos, debidamente asegurada al pavimento sintético de la pista para la practica del salto largo y salto triple; incluir todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra para la correcta instalación de los mismos (Ver planos).

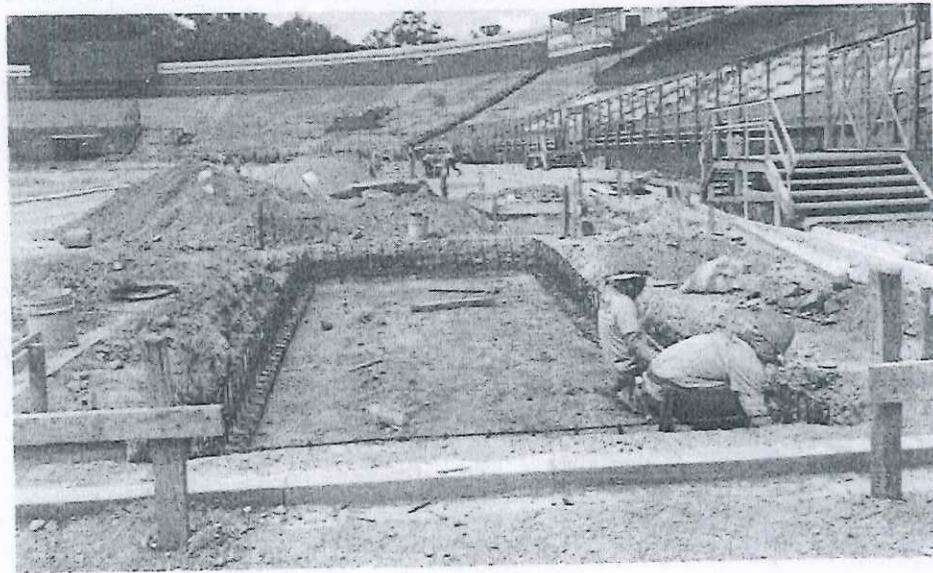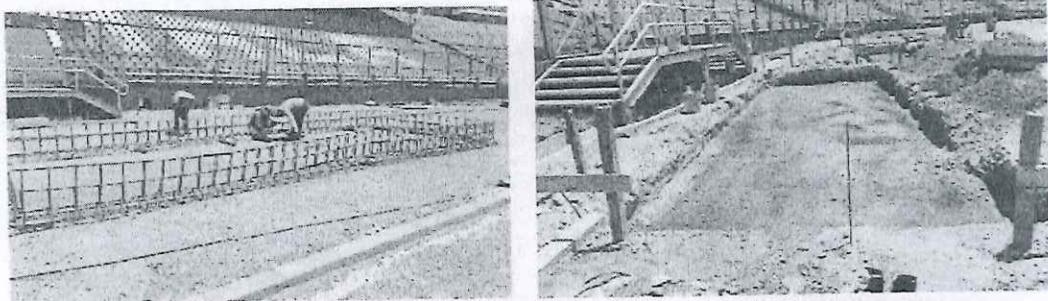

Fotografía de del 12 al 20 de julio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				7 de 9	
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)					
No. DE CONTRATO:		478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN: 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA: Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683		
EMPRESA EJECUTORA: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD: 1 al 31 de julio de 2025		
			FECHA DE INFORME: 31 de julio de 2025		

CANTIDADES CONTRATADAS

No.	RENLÓN	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10.03	Salto largo	Unidad	4.00	Q39,318.71	Q157,274.84
Porcentaje (%) de avance del renglón		0.00%	Porcentaje (%) avance global		29.21%



DESCRIPCION DEL RENGLÓN

Salto largo: Instalación de 4 unidades de zona de caída, para las especialidades de salto largo y salto triple, las mismas tendrán una dimensión de 9.30 metros de largo por 3.30 metros de ancho y una profundidad de 0.30 metros como mínimo en la capa de arena, en el borde se colocara un bordillo el cual se realizara in situ, con un cimientto corrido de 0.30 metros de base, 0.18 metros de alto y luego 0.15 metros de ancho por 0.40 metros de alto, reforzado con 6 varillas de hierro corrugado número 3 y eslabones de varilla número 2 colocados a cada 0.20 metros entre si, en la parte de caída se tendrán las siguientes capas, piedra de rio grande 0.20 metros de diámetro en una capa de 0.30 metros, piedra pequeña de rio lavada de 0.15 metros de diámetro en una capa de 0.15 metros de alto y arena de rio lavada con una capa de 0.30 metros, entre la piedra pequeña y la arena se deberá colocar una capa de geotextil no cocido como se indica en planos; se colocará un cajetin de 0.355 metros de ancho por 1.22 metros de largo de acero inoxidable grado 304, una sección de plastilina de 0.10 metros de ancho y 0.13 metros de alto por 1.22 metros de largo, una tabla de abatimiento y pavimento sintético en cada fosa como se indica en planos, debidamente asegurada al pavimento sintético de la pista para la practica del salto largo y salto triple; incluir todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra para la correcta instalación de los mismos (Ver planos).




Fotografías del 21 al 28 de julio 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA			8 de 9
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)					
No. DE CONTRATO: 478		No. NOG: 23637781		SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887	
DIRECCIÓN: 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA				SUPERVISOR DE LA EMPRESA: Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683	
EMPRESA EJECUTORA: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR				TEMPORALIDAD: 1 al 31 de julio de 2025	
				FECHA DE INFORME: 31 de julio de 2025	
CANTIDADES CONTRATADAS					
No.	RENLÓN	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.01	Renta de sanitarios portátiles	Unidad	72.00	Q734.50	Q52,884.00
Porcentaje (%) de avance del renglón		48.51%	Porcentaje (%) avance global		29.21%
DESCRIPCION DEL RENGLÓN					
Renta de sanitarios portátiles: Consistente en renta de unidades de sanitarios móviles durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, a una empresa con licencia ambiental para esta actividad y que incluya el mantenimiento respectivo. Observaciones a la					

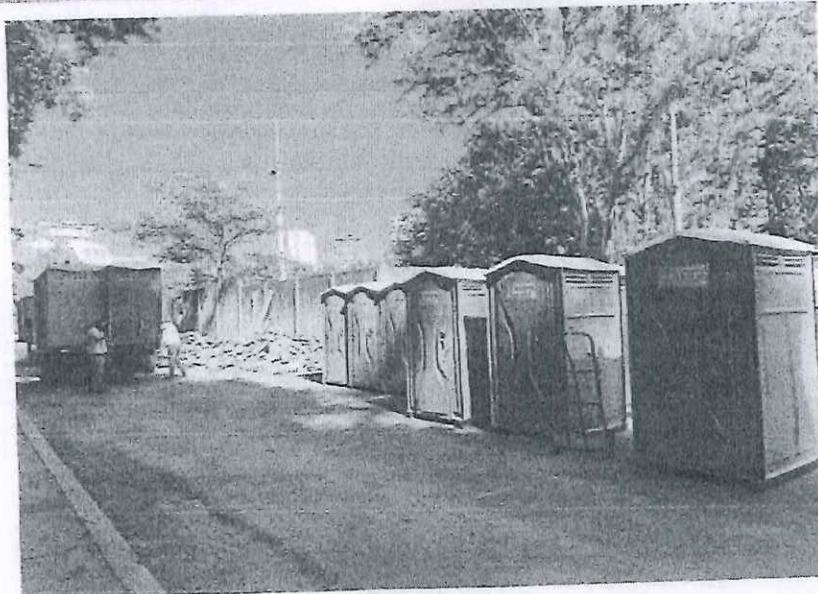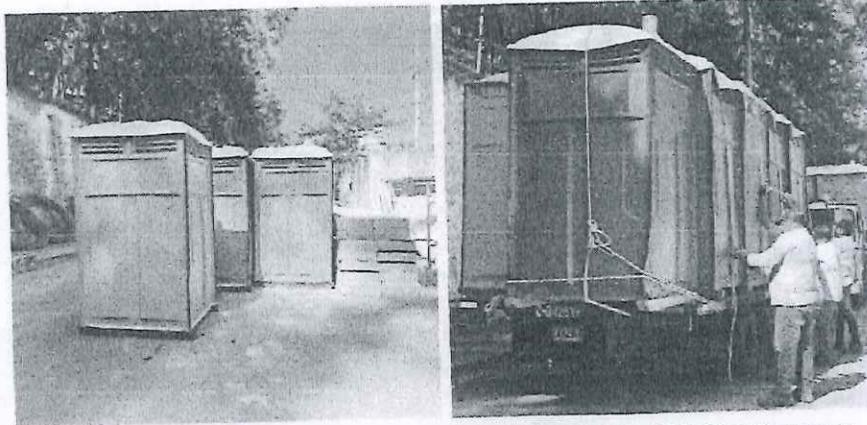

Fotografías del 23 de julio de 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'35.79"O

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				9 de 9
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 31 de julio de 2025
			FECHA DE INFORME:	31 de julio de 2025
 Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisor CDAG				
 Vo. Bo. Ing. Oscar Rumaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Planificación CDAG		 Vo. Bo. Arq. Monica del Rosario Oliva Soto Subgerente de Planificación Proyectos de Infraestructura CDAG		



O-CDAG-SDI-087-2025
Guatemala, 06 de agosto de 2025

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente



Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: "En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de julio de 2025 de forma digital en formato PDF por medio de disco compacto (CD), dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-

Licda. Marta Alicia Meighan Juarez
Subgerente Financiero
-CDAG-

Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-

Arq. Oscar Raúl Barrios Parades
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-

Vo.Bo. Licda. Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez
Encargado del despacho de la Subgerencia General Administrativa

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-




O-CDAG-SDI-086-2025
Guatemala, 06 de agosto de 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

07 AGO 2025

Firma:  Hora: 14:11

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

Estimada Licenciada Martínez:


De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: "En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de julio de 2025 en forma impresa, dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-.

Cordialmente


Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-




Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
-CDAG-




Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-




Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-




Vo.Bo. Licda. Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez
Encargado del despacho de la Subgerencia General Administrativa




Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-



Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt
