

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN




Licda. Karin J. Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Arq. Monica Bolinas Chiva
Subgerente de Planificación de
Proyectos de Infraestructura



Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativa
Subgerencia General Administrativa



Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera



Arq. Oscar Raúl Barrios
Subgerente General de
Infraestructura



Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

Tabla de Contenido

Contenido

| | |
|---|---|
| Introducción | 2 |
| Marco Estratégico Institucional | 3 |
| Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión | 4 |
| Anexo Documentación de Respaldo | 7 |

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, conforme al Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas; y Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Capítulo VI, Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38, Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii), establece: *“En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos (...)”*, en cumplimiento, se integra Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2025.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia integra el presente informe, con base al Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-435-2025 de fecha 01 de septiembre de 2025, emitido por el Director de Diseño y Planificación y Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura en el cual informan como parte del seguimiento mensual al 31 de agosto de 2025, se consultó al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) y al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP) y refiere 6 proyectos con número SNIP.

Marco Estratégico Institucional



NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISION

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitude - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad

**PASIÓN POR
GUATEMALA**



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

En la Subgerencia de Desarrollo Institucional ingresó Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-435-2025 de fecha 01 de septiembre de 2025, dirigido a Subgerente de Desarrollo Institucional con atención al Director de Gestión de la Estrategia, emitido por el Director de Diseño y Planificación y Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura; en el cual informan que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con seis proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), cinco de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y uno pendiente de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

La Subgerencia Financiera a través de la Dirección de Presupuesto, presentó reporte R00815611.rpt Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, el cual refiere una ejecución presupuestaria de Q. 8,540,815.22 con un porcentaje de ejecución del 26.32% del proyecto identificado con SNIP 333700 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10ª AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA" el cual representa el avance financiero. Así mismo, contiene el registro del proyecto identificado con SNIP 301752 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª. CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN" el cual no presenta avance físico y financiero.

La subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura mediante Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-435-2025 de fecha 01 de septiembre de 2025, reportó el avance físico de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, según la tabla siguiente:

| No. | Código SNIP | Nombre | NOG | Estatus en Guatecompras | Ciclo en Segeplan | % de Avance | |
|-----|-------------|---|----------|--|----------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | Físico | Financiero |
| 1 | 301752 | Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén | 24776653 | Adjudicado | En Ejecución | Sin Avance | Sin Avance |
| 2 | 333700 | Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala. | 23637781 | Adjudicado | En Ejecución | 29.93% | 26.32% |
| 3 | 336771 | Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cubierta de Piscina Complejo Deportivo Calzada Ramiro de León Carpio, Carretera a Aldea Santa Lucía, Zacapa, Zacapa | N/A | No aparece | Emisión de opinión técnica | Sin Avance | Sin Avance |
| 4 | 333856 | Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas, Gimnasio para Gimnasia Rítmica, Calle Ancha de Los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez | 26909227 | Finalizado (sin observaciones) | En Ejecución | Sin Avance | Sin Avance |
| 5 | 359269 | Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulos Típicos en Complejo Deportivo de Poptún, 7a. Avenida Km. 380, Poptún, Petén. | 27221393 | Finalizado (Con observaciones respondidas) | Aprobado el 07/08/2025 | Sin Avance | Sin Avance |
| 6 | 359780 | Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Complejo Deportivo, Zona 3, 4ª. Calle entre 25 y 28 Av., Quetzaltenango, Quetzaltenango | N/A | No aparece | Evaluación Técnica | Sin Avance | Sin Avance |

Fuente: Información con base al oficio No. SPPI-DDP-CDAG-435-2025 de fecha 01 de septiembre de 2025 y documentos que lo respaldan.

Por lo anterior, es importante mencionar lo siguiente:

- a) Con relación al SNIP 333700 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10ª AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA," según Sistema Nacional de Inversión Pública se tiene reportado la meta global de 18,502.00m², con una ejecución de 5,537.57m² equivalente a un avance ponderado del 29.93% con relación al avance físico sobre la meta global. Así mismo refiere una ejecución presupuestaria de Q. 8,540,815.22 y porcentaje de ejecución del 26.32%.
- b) El proyecto con SNIP 301752 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª. CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN", según reporte R00815611.rpt Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental - SICOIN-, no presenta avance físico y financiero.
- c) El proyecto con SNIP 359269 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN" fue aprobado el 07 de agosto 2025.

Anexo Documentación de Respaldo

CDAG



HOJA DE TRÁMITE

HT-CDAG-DP-0329-2025



DIRECCION DE PRESUPUESTO

| | |
|----------------------------|--|
| Para: | Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez Subgerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala |
| c.c. | Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar Director de Gestión de la Estrategia CDAG |
| De: | Señora Ruth Odily Corzo Rojas Director de Presupuesto Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala |
| Vo.Bo. | Licenciada Marta Alicia Meighan Juárez <i>Marta Alicia Meighan Juárez</i> Subgerente Financiero Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala |
| Fecha: | Guatemala 01 de septiembre de 2025 |
| Asunto: | Adjunto a la presente reporte del Sistema SICOIN R00815611.rpt Analítico de Ejecución Física y Financiera correspondiente al mes de agosto 2025, para conocimiento y efectos consiguientes. Atentamente, |
| Firma y sello de recibido: | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;">02 SEP 2025</div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">RECIBIDO</p> <p>FIRMA: <i>Patty</i> HORA: 10:05</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><i>Patty fue revisado reporte de comportamiento de ejecución de meta física y financiera e incluido en informe de Smp que se reporta ante Sigeplan</i></p> </div> |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 1/09/2025
 HORA : 15:27:21
 REPORTE: R00815611.rpt

OBRA Mayor o igual a 01

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

| EJERCICIO: | 2025 | PG SP PY AC OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|--|------|----------------|---|--------|------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| Entidad : 11300061-000-00 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | | |
| | 012 | | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | 008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA | 333700 | METRO CUADRADO | 0.00 | 18,502.00 | 11,968.71 | 64.69 | 0.00 | 32,444,764.80 | 8,540,815.22 | 26.32 | |
| | | | RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA | | | | | | | | 0.00 | 32,444,764.80 | 8,540,815.22 | 26.32 |
| | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 64.69 | | | | | |
| | 013 | | AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | 006 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, SANTA ELENA, FLORES PETEN | 301752 | METRO CUADRADO | 0.00 | 438.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,576,057.14 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | RECREATIVAS MODULO TIPOICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 000 | 007 | AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RITMICA CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO 5 CENTRO HISTORICO ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ | | | | 18,940.42 | 11,968.71 | 64.69 | 0.00 | | | | |
| | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 64.69 | | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | | 0.00 | 32,444,764.80 | 8,540,815.22 | 26.32 |
| Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18,940.42 | 11,968.71 | 64.69 | | | | | |



Ruth Odily Carzo Rojas
 Directora
 Dirección de Presupuesto



Hedimar De León Ruiz
 Analista de Presupuesto
 Dirección de Presupuesto

OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-435-2025
Guatemala, 01 de septiembre de 2025



Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
Presente

Con atención:
Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licenciada Rivera:

Reciba un cordial saludo y mis deseos de éxito en sus actividades cotidianas.

Por medio de la presente me permito hacer de conocimiento que la CDAG cuenta con seis proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), cinco de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y uno pendientes de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026. Como parte del seguimiento mensual al 31 de agosto de 2025, se consultó al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) y al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP) al 31 de agosto de 2025, a continuación, se detalla el estatus de los mismos.

(1) CÓDIGO SNIP 301752:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.

- El proyecto se encuentra en estatus: "Adjudicado" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto aparece en el ciclo del proyecto "En ejecución". Fue aprobado en SEGEPLAN, el avance físico y financiero es cero, ya que no ha dado inicio la ejecución de este.

(2) CÓDIGO SNIP 333700:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.

- En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de "En ejecución", aprobado por SEGEPLAN y en Guatecompras con el estatus de "Adjudicado" con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 23637781.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de **AGOSTO** según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de **29.93%**; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número **8-2025** de fecha **31 de agosto de 2025** en formato PDF.

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt

Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores: (a) capturas de pantalla de la información que le aparece en el SINIP en BÚSQUEDA DE PROYECTOS; (b) captura de pantalla del estado actual que le aparece en el SINIP en el MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, en el que se indica que ya fue recibido en SIGES/SICOIN; y (c) como documento adjunto: informe de supervisión número **8-2025** de fecha **31 de agosto de 2025**.

(3) CÓDIGO SNIP 336771:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.

- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto se encuentra en el ciclo de "Emisión de opinión técnica".
- En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.
- No aparece en Guatecompras.

(4) CÓDIGO SNIP 333856:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP, aprobado por SEGEPLAN.
- El proyecto se encuentra en estatus: "Finalizado (sin observaciones)" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 26909227. Por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

(5) CÓDIGO SNIP 359269:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 7 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: Finalizado (Con observaciones respondidas) (NOG) 27221393.

(6) CÓDIGO SNIP 359780:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, COMPLEJO DEPORTIVO, ZONA 3, 4A. CALLE ENTRE 25 Y 28 AV., QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.

- Aunque el proyecto ya fue ingresado al SINIP, se encuentra en evaluación técnica, habiendo sido programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2026.

- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP, aún no aparece en Guatecompras.

Se adjunta Oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-052-2025, de fecha 29 de agosto de 2025, por el suscrito Arquitecto Julio Yanes Moreno, Jefe de Proyectos de Inversión de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Arquitecto José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación



Arquitecta Monica Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura

C. ARCHIVO
JAVU/avir
Dirección de Diseño y Planificación



O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-052-2025
Guatemala, 29 de agosto de 2025

Arquitecto José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
Presente

Respetable Arquitecto Vega:

Reciba un cordial saludo de la Jefatura de Proyectos de Inversión de la Dirección de Diseño y Planificación, Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo del presente es para Informarle que CDAG cuenta con **SEIS** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, **CINCO** de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y **UNO** pendiente de aprobación, para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos SNIP, a continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

(1) CÓDIGO SNIP 301752:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.

- El proyecto se encuentra en estatus: "Adjudicado" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto aparece en el ciclo del proyecto "En ejecución". Fue aprobado en SEGEPLAN, el avance físico y financiero es cero, ya que no ha dado inicio la ejecución de este.

(2) CÓDIGO SNIP 333700:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.

- En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de "En ejecución", aprobado por SEGEPLAN y en Guatecompras con el estatus de "Adjudicado" con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 23637781.

Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de **AGOSTO** según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de **29.93%**; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número **8-2025** de fecha **31 de agosto de 2025** en formato PDF.



Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt



Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores: (a) capturas de pantalla de la información que le aparece en el SINIP en BÚSQUEDA DE PROYECTOS; (b) captura de pantalla del estado actual que le aparece en el SINIP en el MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, en el que se indica que ya fue recibido en SIGES/SICOIN; y (c) como documento adjunto: informe de supervisión número 8-2025 de fecha 31 de agosto de 2025.

(3) CÓDIGO SNIP 336771:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.

- En el SINIP de SEGEPLAN el proyecto se encuentra en el ciclo de "Emisión de opinión técnica".
- En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.
- No aparece en Guatecompras.

(4) CÓDIGO SNIP 333856:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP, aprobado por SEGEPLAN.
- El proyecto se encuentra en estatus: "Finalizado (sin observaciones)" en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 26909227. Por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

(5) CÓDIGO SNIP 359269:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 7 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: Finalizado (Con observaciones respondidas) (NOG) 27221393.

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt




(6) CÓDIGO SNIP 359780:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, COMPLEJO DEPORTIVO,
ZONA 3, 4A. CALLE ENTRE 25 Y 28 AV., QUETZALTENANGO,
QUETZALTENANGO.

- Aunque el proyecto ya fue ingresado al SINIP, se encuentra en evaluación técnica, habiendo sido programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2026.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de "Registro" en el SINIP, aún no aparece en Guatecompras.

Respetuosamente, se solicita informar lo manifestado en el presente documento a la Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia Desarrollo Institucional a efecto de que realice lo conducente.

Sin otro particular, atentamente.



Arq. Julio José Yanes Moreno
Jefe de Proyectos de Inversión
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

c.c. Archivo

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt



CAPTURAS DE PANTALLA TOMADAS DEL SINIP CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA:

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión
técnica



En ejecución



Finalizado

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Boleta del proyecto

Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Ubicación geográfica: GUATEMALA, GUATEMALA

Sector específico: SECTORIAL

Sector: CULTURA Y DEPORTES

Especie: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Situación actual: EN EJECUCIÓN

Etapas actuales: EN EJECUCIÓN


Meta global: 18,502.00 m², Ejecutado: 5,537.57 m² (Avance ponderado 29.93 %) Nog: 23637781

INFORMACIÓN ANUAL

| Información financiera (En Quetzales) | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Ejercicio | Monto solicitado | Monto inicial | Monto vigente | Monto ejecutado | Avance financiero |
| 2025 | 32,444,706.00 | 0 | 32,444,764.80 | 8,540,815.22 | 26.32 % |
| TOTAL: | | | | 8,540,815.22 | |

| Información física | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Ejercicio | Meta física | Meta ejecutada | Avance meta anual |
| 2025 | 18,502 Metro cuadrado | 11,968.94 Metro cuadrado | 64.69 % |

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt



CDAG
GUATEMALA

USUARIO: ANGEL ESTUARDO VALDEZ PAIZ (APAIZ)
PROYECTO: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDAS 23-31 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTO GUANACH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA
DATOS META GLOBAL: meta vigente: 18,502.00 m² | Avance: 29.20%
FECHA DE EJECUCION 2025: (ACTIVO) Avance Financiero: 17.86% - Avance meta anual: 61.70%
NOG: 2363781 - NEC: 1

Seguimiento de Proyectos

Seleccione la fecha que desea consultar o el botón de NUEVA para agregar.

| FECHA | ESTADO | ACCIONES |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 2025 | 28/08/2025 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 08/07/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 28/06/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 31/05/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 05/05/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 24/04/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 07/03/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 05/02/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |

NUEVA

| FECHA | ESTADO | ACCIONES |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 2025 | 28/08/2025 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 08/07/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 28/06/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 31/05/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 05/05/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 24/04/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 07/03/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 05/02/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Exitos

Ejecución física grabada.

| FECHA | ESTADO | ACCIONES |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 2025 | 28/08/2025 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 08/07/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 28/06/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 31/05/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 05/05/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 24/04/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 07/03/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2024 | 05/02/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|--------------------------------|----------------|----------|
| Módulos para el área ambiental | m ² | 73 |
| Área de deportes y recreación | m ² | 2,739 |
| Instalaciones | Módulo | 2,252 |
| Área de servicios | m ² | 214 |

USUARIO QUE REGISTRO: ANGEL ESTUARDO VALDEZ PAIZ
 FECHA DE REGISTRO: 28/08/2025 - 09:05:44

CDAG



OFICIO NO. 359-2025-SPPI-DISUP-CDAG
Guatemala, 28 de agosto de 2025


Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos
de Infraestructura CDAG

Estimado Arquitecto:

Por este medio se remite el informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de agosto de 2025, del proyecto de inversión SNIP 333700: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA".

Se adjunta los documentos en mención para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Atentamente agradecida por su atención.


Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano
Supervisor
CDAG



Vo. Bo. Ing. Oscar Rumaldo Turcios Pacheco
Director de Supervisión
Proyectos de Planificación
CDAG

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFORME DE AVANCE FÍSICO



| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------|-----------|-------------------|
| Informe de Supervisión No. 8-2025 | Fecha: 31 / 08 / 2025 | al | 1/08/2025 | al | 31/08/2025 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | | | | |
| "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA" | | | | | |
| Contrato Administrativo No. 478 | | | | | |
| NOG: 23637781 | | | | | |
| SNIP: 333700 | Final obra: 6/12/2025 | Plazo: 335 días | | | |
| Supervisor nombrado: Arquitecta María de los Angeles Alvaroz Medrano | Collegiado activo No. 4887 | Nombramiento del Supervisor: Oficio 538-2024-SGI-DISUP-CDAG | | | |
| Director Supervisión: Ingeniero Oscar Rumbaldo Turcios Pacheco | Collegiado activo No. 16761 | Representante Legal: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz | | | |
| Empresa Adjudicada: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | Nit: 39315193 | | | | |

| No. | REGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | Ejecutado por renglón | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | | | |
|------|---|--------|----------|-----------------|-------------|--|----------|---|---------|-----------------------|---|------------------------------------|--|------|------|
| | | | | | | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión) | | |
| 1.00 | TRAJADOS PRELIMINARES GENERALES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Instalación de rólulo de identificación del proyecto. | Unidad | 1.00 | 09,976.83 | 09,976.83 | | | | 100.00% | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | Ejecutado por renglón | | | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | |
|--|--|----------------|-----------|-----------------|-------------|---|----------|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| No. | RENGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión) | | |
| 1.02 | Instalación de bodega para almacenamiento de materiales. | Unidad | 1.00 | Q15,977.41 | Q15,977.41 | | | | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 1.03 | Sistema de video vigilancia del proyecto | Unidad | 1.00 | Q144,338.99 | Q144,338.99 | | | | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 2.00 | TRABAJOS PRELIMINARES PISTA | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Desinstalación de pista de atletismo | Metro cuadrado | 6,046.54 | Q149.47 | Q903,776.33 | | | | 100.00% | 6,046.54 | 6,046.54 | 6,046.54 | | |
| 2.02 | Demolición de cajas de arena existentes | Unidad | 2.00 | Q11,084.35 | Q22,168.70 | | | | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2.03 | Demolición de banquetas existentes. | Metro cuadrado | 261.64 | Q159.81 | Q41,812.69 | | | | 100.00% | 261.64 | 261.64 | 261.64 | | |
| 2.04 | Resanado de banquetas de concreto | Metro cuadrado | 682.24 | Q207.26 | Q141,401.06 | | | | 0.00% | 682.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.05 | Trazo e instalación de centros CP1 y CP2. | Metro cuadrado | 10,924.96 | Q2.28 | Q24,690.41 | | | | 100.00% | 10,924.96 | 10,924.96 | 10,924.96 | | |
| 2.06 | Nivelación láser de pista de atletismo | Metro cuadrado | 6,046.54 | Q21.34 | Q129,033.16 | | | | 100.00% | 6,046.54 | 6,046.54 | 6,046.54 | | |
| 2.07 | Trazo de pista de atletismo | Metro cuadrado | 6,046.54 | Q4.33 | Q26,181.52 | | | | 100.00% | 6,046.54 | 6,046.54 | 6,046.54 | | |
| 3.00 | TRABAJOS PRELIMINARES CANCHA DE FÚTBOL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Corte y levantado de gramilla natural. | Metro cuadrado | 10,924.96 | Q37.30 | Q407,501.01 | | | | 100.00% | 10,924.96 | 10,924.96 | 10,924.96 | | |
| 3.02 | Traslado de gramilla a Complejo Deportivo de Zacapa | Metro cuadrado | 10,924.96 | Q10.35 | Q113,073.34 | | | | 100.00% | 10,924.96 | 10,924.96 | 10,924.96 | | |
| 3.03 | Desinstalación de marcos de portería existentes. | Unidad | 2.00 | Q4,960.65 | Q9,921.30 | | | | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 3.04 | Excavación | Metro cúbico | 6,424.90 | Q149.34 | Q959,494.57 | | | | 100.00% | 6,424.90 | 6,424.90 | 6,424.90 | | |
| 3.05 | Nivelación láser de campo de fútbol | Metro cuadrado | 10,924.96 | Q22.59 | Q246,794.85 | | | | 100.00% | 10,924.96 | 10,924.96 | 10,924.96 | | |

| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | Ejecutado por renglón | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | |
|--|--|----------------|----------|-----------------|---------------|--|----------|---|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| No. | RENGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión) |
| | | | | | | Decremento | | | | | | |
| 4.00 | CISTERNA | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Corte de piso de concreto | Metro cuadrado | 46.44 | Q143.82 | Q6,679.00 | | | | 100.00% | 46.44 | 0.00 | 46.44 |
| 4.02 | Excavación de área de cisterna | Metro cúbico | 158.00 | Q210.44 | Q33,249.52 | | | | 100.00% | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
| 4.03 | Fundición de piso | Metro cuadrado | 46.44 | Q1,301.50 | Q60,441.66 | | | | 100.00% | 46.44 | 0.00 | 46.44 |
| 4.04 | Fundición de muros | Metro cuadrado | 83.50 | Q1,115.53 | Q93,146.76 | | | | 0.00% | 83.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4.05 | Fundición de techo | Metro cuadrado | 46.44 | Q1,084.16 | Q50,348.39 | | | | 0.00% | 46.44 | 0.00 | 0.00 |
| 4.06 | Lapadera de sistema. | Unidad | 2.00 | Q2,076.97 | Q5,353.94 | | | | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.07 | Aplicación de impermeabilizante | Metro cuadrado | 130.00 | Q318.30 | Q41,379.00 | | | | 0.00% | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.08 | Relleno de corte | Metro cúbico | 5.00 | Q1,760.75 | Q8,803.75 | | | | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | PISTA DE ATLETISMO | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Excavación en área de pista h. 0.44 metros | Metro cúbico | 2,679.00 | Q70.33 | Q209,846.07 | | | | 100.00% | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 |
| 5.02 | Acarreo de tierra | Metro cúbico | 3,751.00 | Q144.50 | Q542,019.50 | | | | 100.00% | 3,751.00 | 3,751.00 | 3,751.00 |
| 5.03 | Instalación de capa sub-base | Metro cúbico | 2,309.00 | Q534.02 | Q1,233,052.18 | | | | 100.00% | 2,309.00 | 2,309.00 | 2,309.00 |
| 5.04 | Instalación de base compactada | Metro cúbico | 770.00 | Q434.26 | Q334,380.20 | | | | 100.00% | 770.00 | 770.00 | 770.00 |
| 5.05 | Riego de imprimación | Metro cuadrado | 7,694.00 | Q51.26 | Q394,394.44 | | | | 0.00% | 7,694.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.06 | Binder asfáltico | Metro cúbico | 385.00 | Q4,643.50 | Q1,787,747.50 | | | | 0.00% | 385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.07 | Riego de liga | Metro cuadrado | 7,694.00 | Q14.48 | Q111,409.12 | | | | 0.00% | 7,694.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.08 | Capa bituminosa (Concreto asfáltico) | Metro cúbico | 231.00 | Q3,913.40 | Q903,955.40 | | | | 0.00% | 231.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.09 | Pavimento sintético | Metro cuadrado | 7,693.99 | Q1,240.03 | Q9,540,778.42 | | | | 0.00% | 7,693.99 | 0.00 | 0.00 |

| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------|---|---------------|-------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| No. | REGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | Ejecutado por renglón % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión) |
| 5.10 | Borde de concreto | Metro lineal | 850.00 | Q738.17 | Q627,444.50 | | | | 100.00% | 850.00 | 850.00 | 860.00 |
| 5.11 | Pavimento color rojo | Metro cuadrado | 2,156.25 | Q1,252.14 | Q2,699,926.86 | | | | 0.00% | 2,156.25 | 0.00 | 0.00 |
| 5.12 | Área de pavimento de 20 mm de espesor | Metro cuadrado | 167.20 | Q1,519.57 | Q254,072.10 | | | | 0.00% | 167.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5.13 | Área de pavimento de 25 mm de espesor | Metro cuadrado | 12.96 | Q3,074.40 | Q39,844.22 | | | | 0.00% | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
| 5.14 | Marcaje de pista de atletismo | Unidad | 1.00 | Q126,421.60 | Q126,421.60 | | | | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| DRENAJE PISTA DE ATLETISMO | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | DRENAJE PISTA DE ATLETISMO | | | | Q573,778.60 | | | | 100.00% | 273.88 | 273.88 | 273.88 |
| 6.01 | Canal de concreto sección 1 | Metro lineal | 273.88 | Q2,096.00 | Q573,778.60 | | | | 100.00% | 273.88 | 273.88 | 273.88 |
| 6.02 | Canal de concreto sección 2 | Metro lineal | 188.18 | Q3,775.41 | Q710,456.65 | | | | 100.00% | 188.18 | 188.18 | 188.18 |
| 6.03 | Tubo PVC de 2 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 142.00 | Q276.16 | Q39,214.72 | | | | 100.00% | 142.00 | 142.00 | 142.00 |
| 6.04 | Tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 216.00 | Q269.71 | Q58,257.36 | | | | 0.00% | 216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.05 | Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 9.00 | Q2,528.76 | Q22,758.84 | | | | 0.00% | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.06 | Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 75.00 | Q1,711.79 | Q128,384.25 | | | | 0.00% | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.07 | Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 450.00 | Q950.00 | Q431,100.00 | | | | 0.00% | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.08 | Ductos secos | Metro lineal | 215.00 | Q715.76 | Q153,888.40 | | | | 100.00% | 215.00 | 0.00 | 215.00 |
| DRENAJE FRANCES | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | DRENAJE FRANCES | | | | Q1,013,130.15 | | | | 100.00% | 1,293.00 | 1,100.00 | 1,293.00 |
| 7.01 | Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 1,293.00 | Q783.55 | Q1,013,130.15 | | | | 100.00% | 1,293.00 | 1,100.00 | 1,293.00 |
| 7.02 | Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 48.00 | Q3,059.17 | Q146,840.16 | | | | 0.00% | 48.00 | 0.00 | 0.00 |

| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | | | | |
|--|---|----------------|----------|---|---------------|-------------------------|---|---|---------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| No. | REGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión) |
| 7.03 | Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 48.00 | Q3,054.14 | Q146,598.72 | | | | 100.00% | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| 7.04 | Tubo PVC de 15 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 71.00 | Q3,018.68 | Q214,326.26 | | | | 0.00% | 71.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.00 | SUPERFICIE DE CAMPO DE FUTBOL | | | | | | | | | | | |
| 8.01 | Instalación de sub base pedrín de 1/2 pulgada | Metro cúbico | 775.00 | Q675.00 | Q523,125.00 | | | | 100.00% | 775.00 | 775.00 | 775.00 |
| 8.02 | Instalación de base pedrín de 3/8 de pulgada | Metro cúbico | 388.00 | Q663.35 | Q257,379.80 | | | | 100.00% | 388.00 | 388.00 | 388.00 |
| 8.03 | Instalación de arena lavada | Metro cúbico | 1,936.00 | Q401.79 | Q777,865.44 | | | | 0.00% | 1,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.04 | Instalación de carpeta de grama sintética | Metro cuadrado | 7,742.98 | Q392.68 | Q3,039,739.09 | | | | 0.00% | 7,742.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8.05 | Semilla de grama tipo bermuda | Kilogramo | 200.00 | Q271.01 | Q54,202.00 | | | | 0.00% | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.06 | Marcape de cancha de futbol | Unidad | 1.00 | Q4,841.51 | Q4,841.51 | | | | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.07 | Mantenimiento de grama | Meses | 3.00 | Q151,972.82 | Q455,918.46 | | | | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.08 | Porterías | Unidad | 2.00 | Q54,425.07 | Q108,851.74 | | | | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.09 | Limpieza final | Metro cuadrado | 7,750.00 | Q43.91 | Q340,302.50 | | | | 0.00% | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.00 | SISTEMA DE RIEGO | | | | | | | | | | | |
| 9.01 | Instalación de tubería PVC 3/4 de pulgada de diámetro | Metro lineal | 219.00 | Q177.28 | Q38,824.32 | | | | 0.00% | 219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.02 | Instalación de tubería PVC 1 pulgada de diámetro | Metro lineal | 133.00 | Q254.30 | Q33,821.90 | | | | 0.00% | 133.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.03 | Instalación de tubería PVC 1-1/2 pulgada de diámetro | Metro lineal | 46.00 | Q548.07 | Q25,208.92 | | | | 0.00% | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.04 | Instalación de tubería PVC 3 pulgadas de diámetro | Metro lineal | 85.00 | Q442.86 | Q37,643.10 | | | | 0.00% | 85.00 | 0.00 | 0.00 |

| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | Ejecutado por renglón | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | |
|--|--|--------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------|--|---|---------|---------------------------------|---|--|--|
| No. | REGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión) | |
| 9.05 | Instalación de tubería PVC 1 pulgada eléctrico | Metro lineal | 85.00 | Q404.57 | Q34,388.45 | | | | 0.00% | 85.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9.06 | Panel de control de aspersores | Unidad | 1.00 | Q11,867.77 | Q11,867.77 | | | | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9.07 | Instalación de lipon eléctrico | Unidad | 3.00 | Q655.58 | Q1,966.74 | | | | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9.08 | Instalación de electroválvulas | Unidad | 3.00 | Q3,319.13 | Q9,957.39 | | | | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9.09 | Instalación de aspersores | Unidad | 18.00 | Q4,168.54 | Q75,033.72 | | | | 0.00% | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9.10 | Instalación de sistema de bombeo | Unidad | 1.00 | Q99,344.75 | Q99,344.75 | | | | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9.11 | Instalación de cableado eléctrico | Metro lineal | 765.00 | Q12.68 | Q9,700.20 | | | | 0.00% | 765.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10.00 | DISCIPLINAS INDEPENDIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 | Salto con pértiga | Unidad | 16.00 | Q525.94 | Q8,415.04 | | | | 0.00% | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10.02 | Ria | Unidad | 4.00 | Q8,163.22 | Q36,652.88 | | | | 0.00% | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10.03 | Salto largo | Unidad | 4.00 | Q39,318.71 | Q157,274.84 | | | | 62.50% | 4.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 10.04 | Lanzamiento de peso | Unidad | 2.00 | Q6,808.80 | Q13,617.60 | | | | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10.05 | Lanzamiento de martillo y disco | Unidad | 1.00 | Q47,048.43 | Q47,048.43 | | | | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10.06 | Bordillo de aluminio | Metro lineal | 398.12 | Q455.60 | Q181,383.47 | | | | 0.00% | 398.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.00 | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 | Renta de sanitarios portátiles (se deja a discreción el alquiler) | Unidad | 72.00 | Q734.50 | Q52,884.00 | | | | 50.00% | 72.00 | 35.00 | 36.00 | |
| 11.02 | Recipientes para basura | Unidad | 20.00 | Q235.14 | Q4,702.80 | | | | 100.00% | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 11.03 | Extracción de basura, ripo y desechos constructivos | Unidad | 1.00 | Q14,010.59 | Q14,010.59 | | | | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |

| CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación) | | | CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP | | | | |
|--|--|--------|---------------------|--|---------------|-------------------------|---|---|------------------------|--|--|
| No. | REGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | Incremento / Decremento | CANTIDAD | COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1 | Ejecutado por región % | CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA (mes anterior) | EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión) |
| 11.04 | Equipo e implementos para la protección del personal | Unidad | 1.00 | Q.49,283.62 | Q.49,283.62 | | | 1 | 100.00% | 1.00 | 1.00 |
| FIANZAS: | | | | | | | | | | | |
| Fianza de anticipo: | | | Nombre Alianzadora: | Seguros G&T, S.A. | No. de póliza | Clase C5 PÓLIZA NO. | | | | | |
| | | | Vigente del: | 28/11/2024 | al: | 27/10/2025 | | | | | |
| Fianza de cumplimiento de contrato: | | | Nombre Alianzadora: | Seguros G&T, S.A. | No. de póliza | Clase C5 PÓLIZA NO. | | | | | |
| | | | Vigente del: | 29/11/2024 | al: | 6/12/2025 | | | | | |
| Fianza de conservación de obra: | | | Nombre Alianzadora: | | No. de póliza | | | | | | |
| | | | Vigente del: | | al: | | | | | | |
| Fianza de saldos deudores: | | | Nombre Alianzadora: | | No. de póliza | | | | | | |
| | | | Vigente del: | | al: | | | | | | |
| Observaciones: (describir acontecimientos importantes ocurridos durante el periodo del presente informe de avance físico de la obra) | | | | | | | | | | | |
| Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisor CDAG | | | | Vo. Bo. Ing. Oscar Rumaldo Turcios Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Planificación CDAG | | | | Vo. Bo. Arq. Monica del Rosario Oliva Sosa Subgerente de Planificación Proyectos de Infraestructura CDAG | | | |

AVANCE FÍSICO SNIP:

Porcentaje de avance físico del mes que corresponde el reporte en el Módulo de Seguimiento del SNIP:

29.93%

AVANCE FINANCIERO:

Motivo:

Anticipo

20.00%



| | | | | | |
|---|--|---|----------|----------------------------------|--|
|  | | CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA | | | 1 de 5 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024) | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 478 | No. NOG: | 23637781 | SUPERVISOR CDAG: | Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887 |
| DIRECCIÓN: | 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | | | SUPERVISOR DE LA EMPRESA: | Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683 |
| EMPRESA EJECUTORA: | Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | | | TEMPORALIDAD: | 1 al 31 de agosto de 2025 |
| | | | | FECHA DE INFORME: | 31 de agosto de 2025 |
| GENERALIDADES | | | | | |
| <p>AVANCE FÍSICO GLOBAL. Se estima un avance físico global de 29.93%.</p> | | | | | |
| <p>REUNIONES SEMANALES DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA: estando presente el supervisor residente de la empresa BREMAR, Director de Supervisión de CDAD, Supervisor de CDAG y arquitecto diseñadores de la Subgerencia de Planificación. Se realizaron las siguientes actividades en las reuniones semanales: a) Revisión de renglones del contrato, b) Revisión de planos, c) Rectificación de avances físicos.</p> | | | | | |
| <p>ATRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE PAVIMENTO, GRAMA Y SEMILLA: La Dirección de Supervisión por medio del OFICIO NO. 234-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 14 de julio de 2025, da seguimiento al OFICIO No. 119-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 12 de marzo de 2025, OFICIO No. 145-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 26 de marzo de 2025, OFICIO NO. 138-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 10 de junio de 2025, OFICIO No. 165-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 23 de junio de 2025, OFICIO NO. 234-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 14 de julio de 2025 y OFICIO NO. 270-2025-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 28 de julio de 2025. En los oficios en mención, se solicita información sobre los avances de adquisición de los siguientes renglones contenidos en el Contrato Administrativo 478. a) RENGLÓN NÚMERO CINCO PUNTO CERO NUEVE: Siete mil seiscientos noventa y tres puntos noventa y nueve (7,693.99) metros cuadrados de pavimento sintético, b) RENGLÓN NÚMERO OCHO PUNTO CERO CUATRO: Siete mil setecientos cuarenta y dos puntos noventa y ocho (7,742.98) metros cuadrados de carpeta de grama sintética, y, c) RENGLÓN NÚMERO OCHO PUNTO CERO CINCO: doscientos (200.00) kilogramos de semilla de grama tipo bermuda. En los tres oficios se solicitó: a) El estado actual de cada renglón de trabajo, indicando avances específicos y porcentajes de ejecución, b) Descripción de actividades realizadas con fechas estimadas de finalización, y, c), Evidencia documental y/o fotografías que respalden el progreso reportado. Hasta la fecha, se ha recibido el oficio CORRELATIVO 46-2025 de fecha 18 de junio de los corrientes, haciendo saber sobre los desacuerdos entre la empresa BREMAR y su proveedor de pavimento, grama y semilla tipo bermuda que ha afectado los avances en la adquisición. Los desacuerdos entre BREMAR y sus proveedores, están fuera de los aspectos técnicos del Contrato Administrativo 478, por lo tanto, todos los atrasos en la ejecución e incumplimiento del tiempo en la entrega del proyecto, quedan bajo la responsabilidad de la empresa BREMAR y son imputables al contratista.</p> | | | | | |
| <p>Ninguno</p> | | | | | |

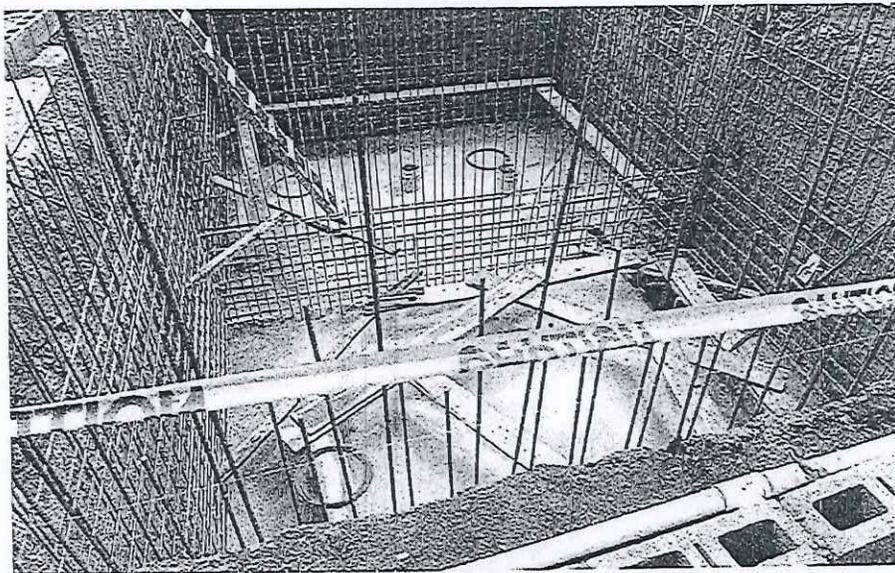
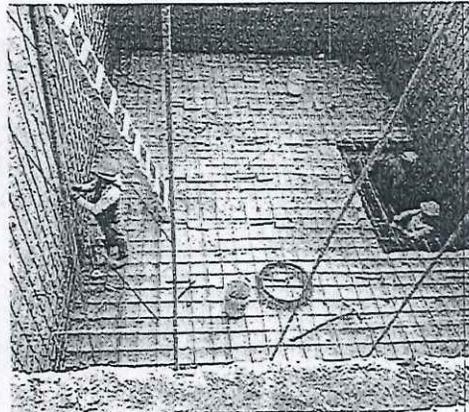
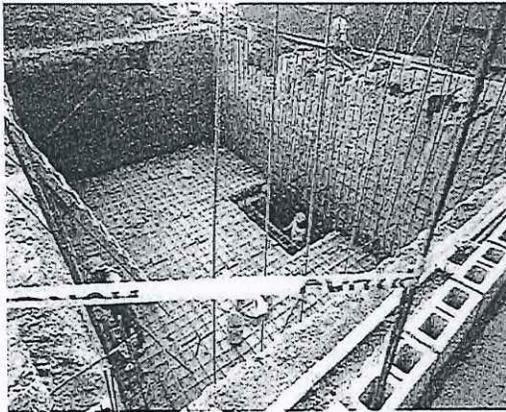
| | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|----------|---|
|  | | CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA | | | 2 de 5 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024) | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | | 478 | No. NOG: | 23637781 | SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887 |
| DIRECCIÓN: 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | | | SUPERVISOR DE LA EMPRESA: | | Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683 |
| EMPRESA EJECUTORA: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | | | TEMPORALIDAD: | | 1 al 31 de agosto de 2025 |
| | | | FECHA DE INFORME: | | 31 de agosto de 2025 |

CANTIDADES CONTRATADAS


| No. | REGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| 4.03 | Fundición de piso | M ² | 46,44 | Q1,301.50 | Q60,441.66 |
| Porcentaje (%) de avance del renglón | | 100.00% | Porcentaje (%) avance global | | 29.93% |

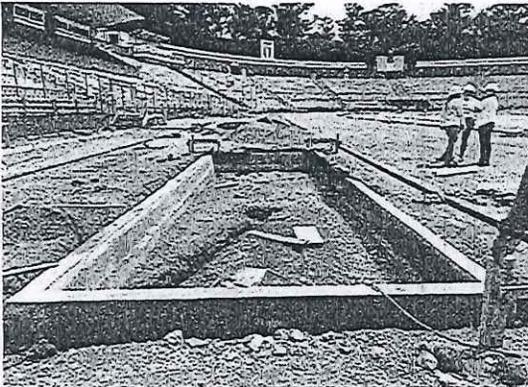
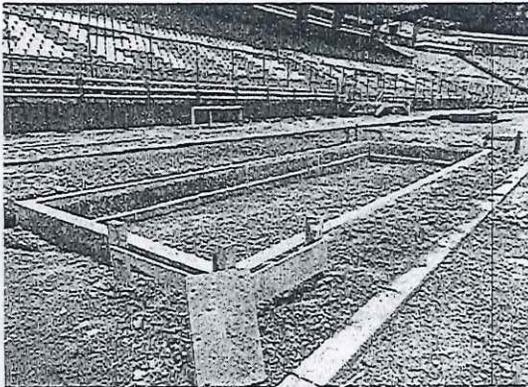
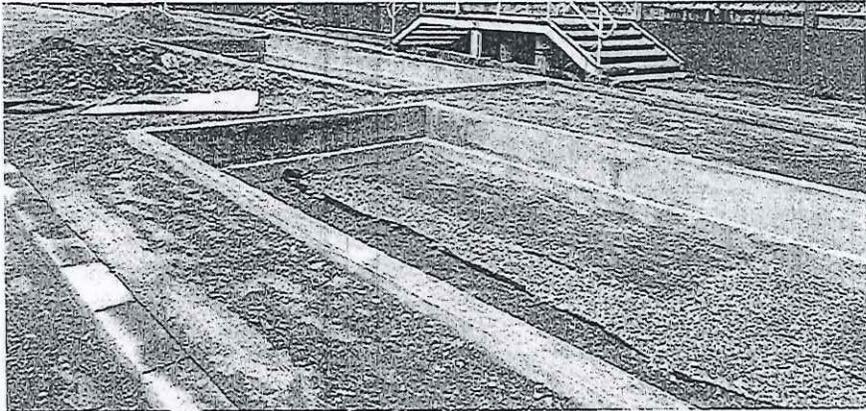
DESCRIPCION DEL REGLÓN



Fundición de piso: Fundición de piso de cisterna la cual estará asentada sobre terreno previamente compactado por medios manuales, la misma tendrá un peralte de 0.20 metros con concreto de 4,000 psi de resistencia y reforzada con dos camadas de varilla corrugada número 4 colocadas a cada 0.20 metros entre sí en ambos sentidos, con bastones de refuerzo de varilla corrugada número 4 a cada 0.20 metros y de 1.00 metro de longitud en secciones de curva entre losa y muros, el acabado de la misma será un alisado cementicio, todo el acero será grado 60, formaletear de ser necesario en cambios de nivel del piso de la cisterna, incluir todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra para la correcta fundición del piso (Ver planos).



Fotografías del 1 al 10 de agosto 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---|--|
| | | CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA | | | 3 de 5 | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024) | | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | | 478 | No. NOG: | 23637781 | SUPERVISOR CDAG: | Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887 |
| DIRECCIÓN: | | 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | | SUPERVISOR DE LA EMPRESA: | Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683 | |
| EMPRESA EJECUTORA: | | Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | | TEMPORALIDAD: | 1 al 31 de agosto de 2025 | |
| | | | | FECHA DE INFORME: | 31 de agosto de 2025 | |
| CANTIDADES CONTRATADAS | | | | | | |
| No. | REGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | |
| 6.03 | Tubo PVC de 2 pulgadas de diámetro | ML | 142.00 | Q276.16 | Q39,214.72 | |
| Porcentaje (%) de avance del renglón | | 100.00% | Porcentaje (%) avance global | | 29.93% | |
| DESCRIPCION DEL REGLÓN | | | | | | |
| <p>Tubo PVC de 2 pulgadas de diámetro: Suministro e instalación de tubería para drenaje pluvial de PVC de 2 pulgadas de diámetro, colocada y enterrada según profundidades indicadas en planos, se incluye la excavación, zanjeado, colocación de tubería, relleno y compactación del terreno, realizar pruebas para evitar cualquier filtración en las uniones de tubos, se deberán incluir todos los materiales, accesorios, herramientas, equipos y mano de obra para la correcta instalación del mismo. (Ver planos)</p> | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> | | | | | | |
| Fotografías del 1 de agosto 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA | | | 4 de 5 | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024) | | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | | 478 | No. NOG: | 23637781 | SUPERVISOR CDAG: | Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887 |
| DIRECCIÓN: 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | | | | SUPERVISOR DE LA EMPRESA: | Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683 | |
| EMPRESA EJECUTORA: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | | | | TEMPORALIDAD: | 1 al 31 de agosto de 2025 | |
| | | | | FECHA DE INFORME: | 31 de agosto de 2025 | |
| CANTIDADES CONTRATADAS | | | | | | |
| No. | REGLÓN | UNIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | |
| 10.03 | Salto largo | Unidad | 4.00 | Q39,318.71 | Q157,274.84 | |
| Porcentaje (%) de avance del renglón | | 62.50% | Porcentaje (%) avance global | | | 29.93% |
| DESCRIPCION DEL REGLÓN | | | | | | |
| <p>Salto largo: Instalación de 4 unidades de zona de caída, para las especialidades de salto largo y salto triple, las mismas tendrán una dimensión de 9.30 metros de largo por 3.30 metros de ancho y una profundidad de 0.30 metros como mínimo en la capa de arena, en el borde se colocara un bordillo el cual se realizara in situ, con un cimientto corrido de 0.30 metros de base, 0.18 metros de alto y luego 0.15 metros de ancho por 0.40 metros de alto, reforzado con 6 varillas de hierro corrugado número 3 y eslabones de varilla número 2 colocados a cada 0.20 metros entre si, en la parte de caída se tendrán las siguientes capas, piedra de río grande 0.20 metros de diámetro en una capa de 0.30 metros, piedra pequeña de río lavada de 0.15 metros de diámetro en una capa de 0.15 metros de alto y arena de río lavada con una capa de 0.30 metros, entre la piedra pequeña y la arena se deberá colocar una capa de geotextil no cocido como se indica en planos; se colocará un cajetín de 0.355 metros de ancho por 1.22 metros de largo de acero inoxidable grado 304, una sección de plastilina de 0.10 metros de ancho y 0.13 metros de alto por 1.22 metros de largo, una tabla de abatimiento y pavimento sintético en cada fosa como se indica en planos, debidamente asegurada al pavimento sintético de la pista para la practica del salto largo y salto triple; incluir todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra para la correcta instalación de los mismos (Ver planos).</p> | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> | | | | | | |
| Fotografías del 1 al 14 de agosto 2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------|---|---------------------------|--|
| | CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA | | | | 5 de 5 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024) | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 478 | No. NOG: | 23637781 | SUPERVISOR CDAG: | Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887 |
| DIRECCIÓN: | 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | | | SUPERVISOR DE LA EMPRESA: | Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683 |
| EMPRESA EJECUTORA: | Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | | | TEMPORALIDAD: | 1 al 31 de agosto de 2025 |
| | | | | FECHA DE INFORME: | 31 de agosto de 2025 |
|   | | | | | |
| Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisor CDAG | | | | | |
|   | | |  | | |
| Vo. Bo. Ing. Oscar Rumbaldo Pacheco Director de Supervisión de Proyectos de Mantenimiento CDAG | | | Vo. Bo. Arq. Monica del Rosario Oliva Sosa Subgerente de Planificación Proyectos de Infraestructura CDAG | | |
