

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCES JUNIO 2026

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, conforme al Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas; y Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Capítulo VI, Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38, Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii), establece: *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos"*, para dar cumplimiento se realiza la integración del Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, al mes de junio de 2026 conforme al procedimiento institucional establecido para el efecto.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia realiza la integración del Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión, conforme a la información del avance físico de proyectos de inversión remitida por el Director de Diseño y Planificación, con visto bueno de Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura y el avance financiero de proyectos de inversión remitido por Director de Presupuesto con visto bueno de Subgerente Financiero relacionado al avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Marco Estratégico Institucional



NUESTRA VISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, técnico, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

01

NUESTRA MISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

02

NUESTROS VALORES

*Pasión por Guatemala - Gratitud -
Eficiencia - Integridad - Innovación
- Espíritu de servicio - Lealtad*

03

**PASIÓN POR
GUATEMALA**

Informe de Avance Físico de Proyectos de Inversión

La Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura remitió el Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-371-2026 de fecha 07 de julio de 2026, dirigido a Subgerencia de Desarrollo Institucional, emitido por el Director de Diseño y Planificación con visto bueno de Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura, en el cual adjuntan el Oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-105-2026/JG firmado por el Jefe de Proyectos de Inversión de la Dirección de Diseño y Planificación, en el cual informa que CDAG, cuenta con OCHO proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, SEIS de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), en el ciclo de "EJECUCIÓN" y DOS en el ciclo de "REGISTRO", para ser gestionados en los ejercicios fiscales 2026 al 2028.

La Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, mediante Oficio No. Oficio O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-105-2026/JG de fecha 03 de julio de 2026, reportó el avance físico de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, según el detalle en la tabla siguiente:

No.	Código SNIP	Proyecto	NOG	Estatus en Guatecompras	Estatus en SINIP	% de Avance
						Físico
1	301752	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	24776653	Adjudicado	En Ejecución	31.72%
2	333700	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala.	23637781	Adjudicado	Suspendido	31.68%

No.	Código SNIP	Nombre	NOG	Estatus en Guatecompras	Estatus en SINIP	% de Avance Físico
3	336771	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cubierta de Piscina Complejo Deportivo Calzada Ramiro de León Carpio, Carretera a Aldea Santa Lucía, Zacapa, Zacapa	N/A	N/A	Aprobado el 24/10/2025	N/A
4	333856	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas, Gimnasio para Gimnasia Rítmica, Calle Ancha de Los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez	26909227	No adjudicado	Aprobado el 18/6/2024	N/A
5	359269	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulos Típicos en Complejo Deportivo de Poptún, 7a. Avenida Km. 380, Poptún, Petén.	27221393	Adjudicado	En ejecución	N/A
6	359780	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Complejo Deportivo, Zona 3, 4ª. Calle entre 25 y 28 Av., Quetzaltenango, Quetzaltenango	27647528	Prescindido	Aprobado el 19/08/2025	N/A
7	379611	Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio de Bádminton 13 Avenida A 1-43 Zona 6, Barrio Hacienda de la Virgen, Salamá, Baja Verapaz	N/A	N/A	Registro el 10/06/2026	N/A
8	379869	Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas para la Práctica de Ajedrez, 2ª Avenida Atrás del Hospital Nacional, Colonia El Relicario 2, Mazatenango, Suchitepéquez	N/A	N/A	Registro el 16/6/2026	N/A

Fuente: Información conforme el oficio No. SPPI-DDP-CDAG-371-2026 de fecha 07 de julio de 2026 y documentos adjuntos al mismo.

Informe de Avance Financiero de Proyectos de Inversión

A la Subgerencia de Desarrollo Institucional ingresó Hoja de Tramite HT-CDAG-DP-0273-2026 con fecha 02 de julio de 2026, remitida por el Director de Presupuesto con Visto Bueno del Subgerente Financiero de CDAG, en la cual adjuntan el reporte R00815611.rpt *"Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión acumulado de enero a junio 2026"* de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, el cual presenta el proyecto identificado con número SNIP 301752 "AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª. CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN" con un presupuesto financiero vigente de Q2,060,845.71; asimismo, contiene el registro del proyecto identificado con número SNIP 359269 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULOS TIPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTUN 7ª AVENIDA KM 380 POPTUN PETEN" con un presupuesto financiero vigente de Q3,351,040.00, ambos proyectos no presentan ejecución financiera al mes de junio de 2026.

 
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

En cumplimiento al procedimiento establecido para el efecto y conforme a la información del avance físico de los proyectos de inversión remitida por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura y la información del avance financiero de los proyectos de inversión remitida por la Subgerencia Financiera, se integra el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión y se detalla lo siguiente:

1. El proyecto de inversión con número SNIP 301752 *"AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª. CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN"*, según información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura presenta un porcentaje de avance físico ponderado de 31.72% en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-; y de acuerdo a la información remitida por la Subgerencia Financiera no presenta avance financiero al mes de junio 2026.
2. El proyecto de inversión con número SNIP 333700 *"MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10ª AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA,"* de acuerdo con la información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, no presenta avance físico y continúa en estado de "Suspendido" en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-; y de acuerdo a la información remitida por la Subgerencia Financiera no presenta avance financiero al mes de junio 2026.
3. *El proyecto de inversión con número SNIP 336771 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA"* de acuerdo con la información proporcionada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, aún no ha sido

adjudicado, debido a que actualmente se encuentra en gestiones administrativas para nuevo proceso.

4. El proyecto de inversión con código SNIP 333856 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ", de acuerdo con la información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura se encuentra aprobado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- con estatus "No Adjudicado".
5. *El proyecto de inversión con número SNIP 359269 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN"* según información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura ya está adjudicado y aún no cuenta con registros en el módulo de seguimiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-, al mes de junio 2026 derivado a que se está en espera de acta de inicio de proyecto para presentar informe de supervisión y documentos de respaldo, por modificación de contrato previo a su otorgamiento.
6. El proyecto de inversión con código SNIP 359780 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, COMPLEJO DEPORTIVO, ZONA 3, 4ª. CALLE ENTRE 25 Y 28 AV., QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO"; de acuerdo con la información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura se encuentra aprobado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- con estatus "Prescindido", en gestiones administrativas para nuevo proceso.

7. El proyecto de inversión con código SNIP 379611 "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE BÁDMINTON, 13 AVENIDA A 1-43 ZONA 6, BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ" según información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura se encuentra en estado de "Registro", en proceso de elaboración de la documentación de respaldo y factibilidad, se obtuvo licencia de construcción.
8. El proyecto de inversión con código SNIP 379869 "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA PRACTICA DE AJEDREZ, 2a. AVENIDA ATRAS DEL HOSPITAL NACIONAL, COLONIA EL RELICARIO 2, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ", de acuerdo con la información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, se encuentra en estado de "Registro", en proceso de elaboración de la documentación de respaldo y factibilidad.

Anexos / Documentación de Respaldo

CDA G





OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-371-2026
Guatemala, 07 de julio de 2026

Licenciada
Karin Rivera
Subgerencia Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Apreciable Licenciada Rivera

Respetuosamente me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se lleven a cabo con éxito.

Por este medio me permito informar que CDAG cuenta con **OCHO** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, **SEIS** de ellos aprobados por la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), en el ciclo de **"EJECUCIÓN"** y **DOS** en el ciclo de **"REGISTRO"**, para ser gestionados en los ejercicios fiscales 2026 al 2028 de acuerdo con información proporcionada por el Analista de Datos e Información de Proyectos SNIP, los cuales se detallan en informe adjunto.

Por lo que se traslada oficio No. O-CDAG-SPPI-DDP-JPI-105-2026/JG, suscrito por el Ing. Jimmy Norman González, Jefe de Proyectos de Inversión en el cual detalla la situación de los proyectos en el mes de junio 2026 y continuar con su proceso correspondiente.

Sin nada más que agregar.

Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación



Vo. Bo. Arq. Monica Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura



Copia archivo
JAVL/pasp
Dirección de Diseño y Planificación

Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG)

Arquitecto Vega:

Reciba un cordial saludo.

El motivo del presente es para Informarle que CDAG cuenta con **OCHO** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), **SEIS** aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en el ciclo de **"EJECUCION"** y **DOS** en el ciclo de **"REGISTRO"**, para ser gestionados en los **ejercicios fiscales 2026 al 2028**, a continuación, se detalla la situación de estos proyectos:

(1) CÓDIGO SNIP 301752:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.

- **ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS:** A continuación, se presenta una tabla con el análisis de los avances físicos:

Año	Avance reportado por supervisión	Avance ponderado registrado en SINIP	Avance Meta Anual 2026
2026	28.27%	31.72%	34.39%

(2) CÓDIGO SNIP 333700:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha **28 de junio de 2024**, se encuentra en el ciclo de **"En ejecución"** en el SINIP. El estado del proyecto en el módulo de seguimiento del SINIP se encuentra en **"Suspendido"**.
- En Guatecompras con el estatus de **"Adjudicado"** con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **23637781**.
- El avance físico que le aparece en el SINIP es de **31.68%**, con la información ingresada al sistema el día **18 de diciembre de 2025**.

(3) CÓDIGO SNIP 336771:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha **24 de octubre de 2025**, se encuentra en el ciclo de **"En ejecución"** en el SINIP.
- No aparece en Guatecompras, ya que se encuentra en gestiones administrativas para nuevo proceso.

(4) CÓDIGO SNIP 333856:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha **18 de junio de 2024**, se encuentra en el ciclo de **"En ejecución"** en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: **"No adjudicado"** en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **26909227**, el cierre de recepción de ofertas fue el 27 de enero de 2026.

(5) CÓDIGO SNIP 359269:

(5) CÓDIGO SNIP 359269:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 7 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de **"En ejecución"** en el SINIP.
- En Guatecompras aparece con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **27221393**, el proyecto se encuentra en estatus: **"Adjudicado"**.
- Aun no tiene registros en el módulo de seguimiento en el SINIP, en espera de acta de inicio de proyecto para presentar informe de supervisión y documentos de respaldo, por modificación de contrato previo a su otorgamiento.
- Se encuentra en gestiones administrativas para nuevo proceso.

(6) CÓDIGO SNIP 359780:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, COMPLEJO DEPORTIVO, ZONA 3, 4A. CALLE ENTRE 25 Y 28 AV., QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 19 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de **"Ejecución"** en el SINIP.
- En Guatecompras, el proyecto se encuentra en estatus: **"Prescindido"**, con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **27647528**.
- Se encuentra en gestiones administrativas para nuevo proceso.

(7) CÓDIGO SNIP 379611:

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE BÁDMINTON, 13 AVENIDA A 1-43 ZONA 6, BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ.


- El proyecto fue ingresado a SEGEPLAN el día **10 de junio de 2026** al SINIP, donde se encuentra en el ciclo de **"Registro"** y pendiente de ponderar rubros, previo a estimación del costo del proyecto.
- El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de la documentación de respaldo y factibilidad, se obtuvo licencia de construcción.

(8) CÓDIGO SNIP 379869:

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA PRÁCTICA DE AJEDREZ, 2A. AVENIDA ATRÁS DEL HOSPITAL NACIONAL, COLONIA EL RELICARIO 2, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ.

- El proyecto fue ingresado a SEGEPLAN el día **16 de junio de 2026**, se encuentra en el ciclo de **"Registro"** en el SINIP y pendiente de ponderar rubros, previo a estimación del costo del proyecto.
- El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de la documentación de respaldo y factibilidad.

Sin otro particular, atentamente.


Ing. Jimmy N. González R.
Jefe
Jefatura de Proyectos de Inversión
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG)





Ingeniero Jimmy N. González R.
Jefatura de Proyectos de Inversión
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG)

Ingeniero González:

Reciba un cordial saludo.

El motivo del presente es para Informarle que CDAG cuenta con **OCHO** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), **SEIS** aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en el ciclo de **"EJECUCION"** y **DOS** en el ciclo de **"REGISTRO"**, para ser gestionados en los **ejercicios fiscales 2026 al 2028**, a continuación, se detalla la situación de estos proyectos:

(1) **CÓDIGO SNIP 301752:**

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.

- En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de **"En ejecución"** y en Guatecompras con el estatus de **"Adjudicado"** con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **24776653**.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones reportados con avance en rubros de SEGEPLAN para el **ejercicio fiscal 2026**, según **informe de supervisión número 9**, correspondiente al periodo del **1 al 30 de junio de 2026**, el SINIP registró un porcentaje de avance ponderado de **31.72%**; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión ya mencionado, del cual se adjunta impresión, así como del oficio número **SPPI-DDP-CDAG-370-2026** de fecha **3 de julio de 2026**, dirigido por la Dirección de Diseño y Planificación a la Jefatura de Proyectos de inversión y del oficio número **402-2026-SPPI-DISUP-CDAG** de fecha **1 de julio de 2026**, dirigido por la Dirección de Supervisión de Proyectos de Planificación a la Dirección de Diseño y Planificación.
- A continuación, se presentan las capturas de pantalla siguientes: (a) el ciclo que le aparece en el SINIP al proyecto; (b) la meta vigente, lo ejecutado y el avance ponderado que reporta el sistema; (c) **el ejercicio fiscal reportado 2026**, la meta física, meta ejecutada y avance meta anual; y (d) evidencia de que se ingresaron las cantidades en rubros reportados en el **informe de supervisión número 9** con un periodo del **1 al 30 de junio de 2026**, obedeciendo la norma 1.15.3 de las normas SNIP.

Código: **301752**

Nombre del Proyecto: **AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 3 34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN**

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión
técnica



En ejecución



Finalizado

Proyecto: **301752 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 3 34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN**

Institución: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**

Unidad ejecutora: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**

Ubicación geográfica: **FLORES, PETEN**

Sector específico: **SECTORIAL**

Sector: **CULTURA Y DEPORTES**

Especie: **INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**

Situación actual: **EN EJECUCIÓN**

Etapas actual: **EN EJECUCIÓN**

Meta vigente: **7,775.23 m²**, Ejecutado: **2,466.57 m²** (Avance ponderado **31.72 %**)

Nog: **24776653**

INFORMACIÓN ANUAL

*El monto ejecutado de SINIP equivale al monto desembolsado o devengado de SICOINGL para proyectos de gobiernos locales

Información financiera (En Quetzales)						
Ejercicio	Monto solicitado	Monto asignado	Monto modificado	Monto vigente	Monto ejecutado*	Avance financiero
2026	1,090,912.04	0	0	2,060,845.71	0	0.00 %
2025	1,209,138.98	0	0	2,576,057.14	460,010.21	17.86 %
2024	0	0	0	0	0	0.00 %
TOTAL:					460,010.21	

Información física			
Ejercicio	Meta física	Meta ejecutada	Avance meta anual
2026	4,248.32 Metro cuadrado	1,461 Metro cuadrado	34.39 %
2025	3,528.67 Metro cuadrado	3,526.91 Metro cuadrado	99.95 %
2024	35 Metro cuadrado	0 Metro cuadrado	0.00 %

Proyecto: 301752 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL ...

Datos meta global: Meta vigente: 7,775.23 m² | Avance: 23.46% | Variación de la meta: 1673.47%
Ejecución 2026: (ACTIVO) Avance Financiero: 0.00% - Avance Meta Anual 29.74%

NOG's: - 24776653 - **NEC's:**

AVANCE FISICO

eleccione la fecha que desea acceder o el boton de QUEVA™ para agregar.

Ejerc.	Fecha	Ft	Sp	RECIBIDO SIGES/SICOIN
2026	03/07/2026			
2026	03/06/2026			
2026	05/05/2026			
2026	09/04/2026			
2026	06/03/2026			
2026	02/12/2025			
2026	20/10/2025			

NUEVA

Exito!

Ejecución física grabada.

Ejercicio	2026
Fase	Ejecución
Fecha del avance	03/07/2026
# Documento.	9
Fecha del Documento	30/06/2026

Rubro	Unidad de medida	Ejecutado acumulado
Medidas mitigación ambiental	Metro	88
Circulación de áreas	Meiro	60
Area de deportes y recreación	m²	82
Pavimentación	m²	45
Graderío y cubierta	m²	330

USUARIO QUE REGISTRO: ANGEL ESTUARDO VALDEZ PAIZ

FECHA DE REGISTRO: 03/07/2026 - 00:00:00

- **ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS:** A continuación, se presenta una tabla con el análisis de los avances físicos:

Año	Avance reportado por supervisión	Avance ponderado registrado en SNIP	Avance Meta Anual 2026
2026	28.27%	31.72%	34.39%

(2) CÓDIGO SNIP 333700:

**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91
ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.**

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha **28 de junio de 2024**, se encuentra en el ciclo de **“En ejecución”** en el SINIP. El estado del proyecto en el módulo de seguimiento del SINIP se encuentra en **“Suspendido”**.
- En Guatecompras con el estatus de **“Adjudicado”** con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **23637781**.
- El avance físico que le aparece en el SINIP es de **31.68%**, con la información ingresada al sistema el día **18 de diciembre de 2025**.

(3) CÓDIGO SNIP 336771:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha **24 de octubre de 2025**, se encuentra en el ciclo de **“En ejecución”** en el SINIP.
- No aparece en Guatecompras, ya que se encuentra en gestiones administrativas para nuevo proceso.

(4) CÓDIGO SNIP 333856:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA
RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA
GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.



- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha **18 de junio de 2024**, se encuentra en el ciclo de **"En ejecución"** en el SINIP.
- El proyecto se encuentra en estatus: **"No adjudicado"** en Guatecompras con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **26909227**, el cierre de recepción de ofertas fue el 27 de enero de 2026.

(5) CÓDIGO SNIP 359269:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 7 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de **"En ejecución"** en el SINIP.
- En Guatecompras aparece con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **27221393**, el proyecto se encuentra en estatus: **"Adjudicado"**.
- Aun no tiene registros en el módulo de seguimiento en el SINIP, en espera de acta de inicio de proyecto para presentar informe de supervisión y documentos de respaldo, por modificación de contrato previo a su otorgamiento.
- Se encuentra en gestiones administrativas para nuevo proceso.

(6) CÓDIGO SNIP 359780:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, COMPLEJO DEPORTIVO, ZONA 3, 4A. CALLE ENTRE 25 Y 28 AV., QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 19 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de **"Ejecución"** en el SINIP.
- En Guatecompras, el proyecto se encuentra en estatus: **"Prescindido"**, con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) **27647528**.
- Se encuentra en gestiones administrativas para nuevo proceso.

(7) CÓDIGO SNIP 379611:

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE BÁDMINTON, 13 AVENIDA A 1-43 ZONA 6, BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ.

- El proyecto fue ingresado a SEGEPLAN el día **10 de junio de 2026** al SINIP, donde se encuentra en el ciclo de **"Registro"** y pendiente de ponderar rubros, previo a estimación del costo del proyecto.
- El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de la documentación de respaldo y factibilidad, se obtuvo licencia de construcción.

(8) CÓDIGO SNIP 379869:

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA PRÁCTICA DE AJEDREZ, 2A. AVENIDA ATRÁS DEL HOSPITAL NACIONAL, COLONIA EL RELICARIO 2, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ.

- El proyecto fue ingresado a SEGEPLAN el día **16 de junio de 2026**, se encuentra en el ciclo de **"Registro"** en el SINIP y pendiente de ponderar rubros, previo a estimación del costo del proyecto.
- El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de la documentación de respaldo y factibilidad.

Sin otro particular, atentamente.

Estuardo Valdez
Analista de Datos e Información de Proyectos SNIP
Jefatura de Proyectos de Inversión
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG)

INFORME DE AVANCE FÍSICO (PROYECTO DE INVERSIÓN)

Informe de supervisión número 9		Fecha del informe:	
Temporalidad del informe: del 1 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026.		30 de junio de 2026	
NOMBRE DEL PROYECTO:			
AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETEN		Contrato administrativo número: 390	
Código SNIP: 301752	NOG: 24776653		
Inicio obra: 10 de septiembre de 2025.	Final obra: 5 de agosto de 2026.		
Supervisor nombrado: Arquitecto Félix Giovanni Nufío Gálvez	Colegiado número: 2707		
Director Supervisión de Proyectos de Planificación: Ingeniero Julio Secundino Gudiel Villamar	Número de oficina del nombramiento del supervisor: 69-2026-SGI-DISUP-CDAG		
Empresa ejecutora: DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 316000859		
		Representante legal: Darbin Mammuel Corado Linares	

Superintendente de la empresa:
Arquitecto Byron Antonio Illescas Dávila, número de colegiado activo: 2273.

Modificaciones al Contrato (adjuntar fotocopia del documento)	Fecha:
	Fecha:
	Fecha:
Acuerdos (adjuntar fotocopia del documento)	Fecha:
	Fecha:
Documentos de cambio (adjuntar fotocopia del documento)	Fecha:
	Fecha:
	Fecha:

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES Y MONTOS POR RENGLÓN EN EL AÑO 2025		CANTIDADES, TOTALES, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, ACUMULADA ACTUAL Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTUAL AÑO 2026				Ejecutado total por renglón
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS TOTALES	Cantidad ejecutada en el año 2025	Montos según cantidades ejecutadas año 2025	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	Ejecutado en el mes del informe de avance físico	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (mes del informe de supervisión)	%
1.00 Trabajos preliminares												
1.01	Rótulo de identificación del proyecto	Unidad	1.00	Q5,500.00	Q5,500.00	1.00	Q5,500.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
1.02	Remoción de capa vegetal	Metro cuadrado	408.35	Q30.00	Q12,250.50	408.35	Q12,250.50	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
1.03	Retiro de material (capa vegetal)	Metro cúbico	81.67	Q145.00	Q11,842.15	81.67	Q11,842.15	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
1.04	Trazo y estaqueado	Metro lineal	73.20	Q25.00	Q1,830.00	73.20	Q1,830.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
1.05	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia	Unidad	1.00	Q78,408.00	Q78,408.00	1.00	Q78,408.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
2.00 Cimentación												
2.01	Excavación estructural	m3	94.67	Q30.00	Q2,840.10	94.67	Q2,840.10	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
2.02	Zapata Z-1	Unidad	10.00	Q2,050.00	Q20,500.00	0.00	Q0.00	10.00	0.00	10.00	Q20,500.00	100.00%
2.03	Pedestal	Unidad	10.00	Q1,650.00	Q16,500.00	0.00	Q0.00	10.00	0.00	10.00	Q16,500.00	100.00%
2.04	Cimiento corrido para muro perimetral (forro lateral)	ml	73.20	Q290.00	Q21,228.00	0.00	Q0.00	73.20	0.00	73.20	Q21,228.00	100.00%

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO							CANTIDADES Y MONTOS POR RENGLÓN EN EL AÑO 2025		CANTIDADES, TOTALES, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, ACUMULADA ACTUAL Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTUAL AÑO 2026				Ejecutado total por renglón
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS TOTALES		Cantidad ejecutada en el año 2025	Montos según cantidades ejecutadas año 2025	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	Ejecutado en el mes del informe de avance físico	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (mes del informe de supervisión)	%
2.05	Cimiento corrido para muro de rampa	ml	33.52	Q315.00	Q10,558.80		0.00	Q0.00	16.00	0.00	16.00	Q5,040.00	47.73%
2.06	Levantado de cimentación para muro perimetral (forro lateral)	m2	85.44	Q250.00	Q21,360.00		0.00	Q0.00	85.44	0.00	85.44	Q21,360.00	100.00%
2.07	Levantado de cimentación para muro de rampa	m2	20.12	Q250.00	Q5,030.00		0.00	Q0.00	10.00	0.00	10.00	Q2,500.00	49.70%
2.08	Solera de humedad para muro perimetral (forro lateral)	ml	144.40	Q210.00	Q30,324.00		0.00	Q0.00	144.40	0.00	144.40	Q30,324.00	100.00%
2.09	Solera de humedad para muro de rampa	ml	67.04	Q200.00	Q13,408.00		0.00	Q0.00	30.00	3.52	33.52	Q6,704.00	50.00%
2.10	Relleno estructural	m3	56.14	Q325.00	Q18,245.50		0.00	Q0.00	20.00	15.00	35.00	Q11,375.00	62.34%
2.11	Retiro de material de desperdicio (excavación)	m3	82.97	Q95.00	Q7,882.15		0.00	Q0.00	45.00	5.00	50.00	Q4,750.00	60.26%
3.00 Estructura metálica													
3.01	Marco estructural ME-1	Unidad	5.00	Q55,000.00	Q275,000.00		0.00	Q0.00	0.00	5.00	5.00	Q275,000.00	100.00%
3.02	Breizas rigidizantes	Unidad	4.00	Q14,250.00	Q57,000.00		0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
3.03	Joist rigidizantes (entre columnas)	ml	51.02	Q2,000.00	Q102,040.00		0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
3.04	Estructura de techo y cubierta de lámina termoacústica (incluye monitor)	m2	454.51	Q1,200.00	Q545,412.00		0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
3.05	Canal de lámina galvanizada calibre 26, con bocatubos (no incluye bajada pluvial)	ml	46.74	Q350.00	Q16,359.00		0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
4.00 Forro perimetral													
4.01	Columna tipo A43, h = 2.20 m	Unidad	42.00	Q285.00	Q11,970.00		0.00	Q0.00	25.00	5.00	30.00	Q8,550.00	71.43%
4.02	Columna tipo A44, h = 3.35 m	Unidad	4.00	Q444.00	Q1,776.00		0.00	Q0.00	2.00	0.00	2.00	Q888.00	50.00%
4.03	Levantado de muro	m2	73.86	Q245.00	Q18,095.70		0.00	Q0.00	55.00	5.00	60.00	Q14,700.00	81.23%
4.04	Solera final	ml	71.20	Q190.00	Q13,528.00		0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
4.05	Reja metálica h = 1.15 m (sobre muro)	ml	69.20	Q900.00	Q62,280.00		0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
4.06	Puerta reja 2.00x2.35 m (2 hojas)	Unidad	1.00	Q9,936.63	Q9,936.63		0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
5.00 Piso de módulo													
5.01	Relleno y compactación de base para losa de piso, t = 20 cms	m2	308.22	Q250.00	Q77,055.00		0.00	Q0.00	230.00	0.00	230.00	Q57,500.00	74.62%
5.02	Fundición de concreto para losa de piso, t = 12 cms, concreto 3000 PSI	m2	308.22	Q215.00	Q66,267.30		0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
5.03	Grada extremo de rampa	Unidad	2.00	Q500.00	Q1,000.00		0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO							CANTIDADES Y MONTOS POR RENGLÓN EN EL AÑO 2025		CANTIDADES, TOTALES, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, ACUMULADA ACTUAL Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTUAL AÑO 2026				Ejecutado total por renglón
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS TOTALES	Cantidad ejecutada en el año 2025	Montos según cantidades ejecutadas año 2025		EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	Ejecutado en el mes del informe de avance físico	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (mes del informe de supervisión)	%
5.04	Bordillo perimetral para banquetta	ml	69.78	Q240.00	Q16,747.20	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
5.05	Relleno y compactación de base para banquetta exterior, t= 15 cms	m2	68.26	Q70.00	Q4,778.20	0.00	Q0.00		13.00	1.00	14.00	Q980.00	20.51%
5.06	Fundición de concreto para banquetta exterior, t = 7 cms, concreto 3000 PSI	m2	68.26	Q155.00	Q10,580.30	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
6.00	Rampa												
6.01	Columna A43	ml	12.00	Q295.00	Q3,540.00	0.00	Q0.00		3.00	3.00	6.00	Q1,770.00	50.00%
6.02	Levantado de muro	m2	6.00	Q280.00	Q1,680.00	0.00	Q0.00		4.00	0.00	4.00	Q1,120.00	66.67%
6.03	Relleno y compactación de base para rampa, espesor variable	m2	43.00	Q80.00	Q3,440.00	0.00	Q0.00		21.00	0.00	21.00	Q1,680.00	48.84%
6.04	Fundición de concreto para losa de rampa, t = 7 cms, concreto 3000 PSI	m2	43.00	Q160.00	Q6,880.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
6.05	Limpieza final	m2	408.35	Q9.00	Q3,675.15	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
7.00	Instalaciones eléctricas												
7.01	Acometida eléctrica	Unidad	1.00	Q12,500.00	Q12,500.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
7.02	Sub tablero 12 circuitos	Unidad	1.00	Q23,000.00	Q23,000.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
7.03	Lámparas de 200 watts tipo HIGH BAY, tecnología LED	Unidad	8.00	Q3,300.00	Q26,400.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
7.04	Lámparas de emergencia 2 x 12 watts tecnología LED	Unidad	3.00	Q2,500.00	Q7,500.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
7.05	Iluminación de salida tecnología LED	Unidad	1.00	Q3,500.00	Q3,500.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
7.06	Tierra física	Unidad	1.00	Q9,000.00	Q9,000.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
7.07	Tomacorrientes 120 voltios polarizado	Unidad	11.00	Q900.90	Q9,909.90	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
8.00	Instalaciones de drenaje pluvial												
8.01	Tubería pvc Ø 6" para drenaje pluvial.	Metro lineal	72.00	Q235.00	Q16,920.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
9.00	Caja de Registro												
9.01	Caja de Registro	Unidad	1.00	Q1,490.00	Q1,490.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.00	Arquitectura												
10.01	Repello y cernido fino	Metro cuadrado	205.20	Q95.00	Q19,494.00	0.00	Q0.00		75.00	22.05	97.05	Q9,219.75	47.30%
10.02	Aplicación de pintura en muro	Metro cuadrado	205.20	Q47.00	Q9,644.40	0.00	Q0.00		61.00	0.00	61.00	Q2,867.00	29.73%
10.03	Acabado en tronco de columna	Unidad	10.00	Q175.00	Q1,750.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.04	Ménsula de concreto	Unidad	29.00	Q15.00	Q435.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.05	Sillar de concreto	Metro lineal	43.48	Q90.00	Q3,913.20	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.06	Dintel tabla de yeso	Metro cuadrado	16.42	Q350.00	Q5,747.00	0.00	Q0.00		0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%



CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES Y MONTOS POR RENGLÓN EN EL AÑO 2025		CANTIDADES, TOTALES, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, ACUMULADA ACTUAL Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTUAL AÑO 2026				Ejecutado total por renglón
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS TOTALES	Cantidad ejecutada en el año 2025	Montos según cantidades ejecutadas año 2025	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	Ejecutado en el mes del informe de avance físico	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (mes del informe de supervisión)	%
10.07	Estructura para tubo de 2" sostener louver	Metro lineal	65.20	Q370.00	Q24,124.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.08	Estructura para tubo de 1-1/2"	Metro lineal	175.84	Q212.00	Q37,278.08	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.09	Cubierta de lámina troquelada	Metro cuadrado	138.32	Q375.00	Q51,870.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.10	Flashing	Metro lineal	30.40	Q200.00	Q6,080.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.11	Ventana V-1	Unidad	4.00	Q1,995.00	Q7,980.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.12	Ventana V-2	Unidad	4.00	Q1,995.00	Q7,980.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.13	Ventana V-3	Unidad	8.00	Q2,310.00	Q18,480.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.14	Ventana V-4	Unidad	4.00	Q2,970.00	Q11,880.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.15	Ventana V-5	Unidad	3.00	Q2,970.00	Q8,910.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.16	Louver	Unidad	8.00	Q3,312.50	Q26,500.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.17	Sistema de duela	Metro cuadrado	196.00	Q1,900.00	Q372,400.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.18	Puerta P-1	Unidad	1.00	Q14,500.00	Q14,500.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.19	Puerta P-2	Unidad	2.00	Q17,948.70	Q35,897.40	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.20	Baranda	Metro lineal	24.63	Q1,650.00	Q40,639.50	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.21	Pasamanos	Metro lineal	19.18	Q600.00	Q11,508.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
10.22	Señalización de emergencia	Global	1.00	Q2,350.00	Q2,350.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
11.00	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO											
11.01	Renta de sanitarios portátiles (se deja a discreción el alquiler de duchas)	Mes	12.00	Q4,620.00	Q55,440.00	0.00	Q0.00	2.00	0.00	2.00	Q9,240.00	16.67%
11.02	Circulación del área de construcción	Metro	120.00	Q385.00	Q46,200.00	120.00	Q46,200.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
11.03	Sistema de drenaje pluvial provisional	Metro	100.00	Q14.00	Q1,400.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	0.00%
11.04	Bodega de materiales	Unidad	1.00	Q6,200.00	Q6,200.00	1.00	Q6,200.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%
11.05	Recipientes para basura	Recipiente	10.00	Q726.00	Q7,260.00	10.00	Q7,260.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00	100.00%

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES Y MONTOS POR RENGLÓN EN EL AÑO 2025				CANTIDADES, TOTALES, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, ACUMULADA ACTUAL Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTUAL AÑO 2026				Ejecutado total por renglón
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS TOTALES	Cantidad ejecutada en el año 2025	Montos según cantidades ejecutadas año 2025	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	Ejecutado en el mes del informe de avance físico	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (mes del informe de supervisión)			%
11.06	Extracción de basura, ripio y desechos constructivos	Viaje	50.00	Q264.00	Q13,200.00	0.00	Q0.00	15.00	5.00	20.00	Q5,280.00			40.00%
11.07	Equipo e implementos para la protección del personal	Global	1.00	Q26,778.98	Q26,778.98	0.00	Q0.00	1.00	0.00	1.00	Q26,778.98			100.00%
11.08	Reforestación	Pilón	50.00	Q65.00	Q3,250.00	0.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	Q0.00			0.00%
TOTAL SEGÚN CONTRATO (incluye IVA):						TOTAL AÑO 2025:	Q172,330.75					TOTAL AÑO 2026:	Q555,854.73	
												TOTAL GLOBAL	Q728,185.48	

FIANZAS	Nombre de la afianzadora	POLIZA
Fianza de anticipo:	Aseguradora Fidelis, S.A.	Clase C-5 No. 1077198
	Vigencia: hasta su total amortización.	
Fianza de cumplimiento de contrato:	Aseguradora Fidelis, S.A.	Clase C-2 No. 1077197
	Vigente: del 10 de septiembre de 2025 al 5 de agosto de 2026.	

AVANCE FÍSICO GLOBAL:			28.27%
AVANCE FINANCIERO (los montos incluyen IVA):			
Motivo	Monto	Porcentaje	
Anticipo	Q460,010.21	17.86%	
TOTALES:	Q460,010.21	17.86%	

NOTA: El monto total del proyecto incluye el IVA, el valor del anticipo y de las estimaciones no incluyen el IVA, a las estimaciones se les resta el valor del 25% como amortización del anticipo.


Arquitecto Felix Giovanni Nunez Gálvez
Supervisor Hombrado
Dirección de Supervisión de Proyectos de Planificación


Ingeniero Julio Secundino Gudiel
Director de Supervisión de Proyectos de Planificación
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


Arquitecta Monica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

INFORME FOTOGRÁFICO

No. SNIP: 301752		Nombre del Proyecto: Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	Contrato Administrativo No. 390		
NOG: 24776653			Fecha del informe: 30/06/2026		
EMPRESA EJECUTORA: DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA					
Supervisor del proyecto: Arq. Felix Giovanni Nufio Gálvez		Colegiado 2707	Superintendente del proyecto: Byron Antonio Illescas Dávila		Colegiado 2273
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2.09	Solera de humedad para muro de rampa	ml	67.04	Q200.00	Q13,408.00
Se han ejecutado 33.52 metros lineales de la solera en el muro de la rampa.					
Latitud: 16°54'32.5"N		Longitud: 89°53'54.7"O			
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2.10	Relleno estructural	m3	56.14	Q325.00	Q18,245.50
Se han ejecutado los 42 metros cúbicos del relleno					
Latitud: 16°54'32.5"N		Longitud: 89°53'54.7"O			
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2.11	Retiro de material de desperdicio (excavación)	m3	82.97	Q95.00	Q7,882.15
Se han retirado 50 metros cúbicos de material de desperdicio.					
Latitud: 16°54'32.5"N		Longitud: 89°53'54.7"O			

INFORME FOTOGRÁFICO

No. SNIP: 301752		Nombre del Proyecto: Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén		Contrato Administrativo No. 390	
NOG: 24776653				Fecha del informe: 30/06/2026	
EMPRESA EJECUTORA: DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA					
Supervisor del proyecto: Arq. Felix Giovanni Nufio Gálvez Colegiado 2707			Superintendente del proyecto: Byron Antonio Illescas Dávila Colegiado 2273		
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
3.01	Marco estructural ME-1	Unidad	5.00	Q55,000.00	Q275,000.00
Se han realizado correcciones solicitadas en visitas previas. Se han armado y colocado los marcos estructurales.					
					
Latitud: 16°54'32.5"N			Longitud: 89°53'54.7"O		
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
4.01	Columna tipo A43, h = 2.20 m	Unidad	42.00	Q285.00	Q11,970.00
Se continua con el avance del renglón, aun falta fundir varias columnas A-43 para poder ponderarte el 100% del renglón.					
					
Latitud: 16°54'32.5"N			Longitud: 89°53'54.7"O		
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
4.03	Levantado de muro	m2	73.86	Q245.00	Q18,095.70
Se ha realizado la fundición de 60 metros cuadrados de levantado de muro.					
					
Latitud: 16°54'32.5"N			Longitud: 89°53'54.7"O		

INFORME FOTOGRÁFICO

No. SNIP: 301752	Nombre del Proyecto: Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	Contrato Administrativo No. 390
NOG: 24776653		Fecha del informe: 30/06/2026
EMPRESA EJECUTORA: DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA		

Supervisor del proyecto: Arq. Felix Giovanni Nufio Gálvez	Colegiado 2707	Superintendente del proyecto: Byron Antonio Illescas Dávila	Colegiado 2273
--	----------------	--	-------------------

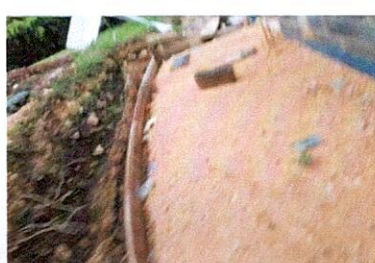
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
5.05	Relleno y compactación de base para banquetta exterior, t= 15 cms	m2	68.26	Q70.00	Q4,778.20

El relleno se esta realizando conforme se van realizando los trabajos en la banquetta



Latitud: 16°54'32.5"N		Longitud: 89°53'54.7"O			
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
6.01	Columna A43	m	12.00	Q295.00	Q3,540.00

Se están ejecutando las columnas A43 en la rampa, el avance consiste en el armado y el proceso de fundición. Aun falta por fundir varios tramos.



Latitud: 16°54'32.5"N		Longitud: 89°53'54.7"O			
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
10.1	Repello y cernido fino	m2	205.20	Q95.00	Q19,494.00

Se están ejecutando el repello en las zonas del muro que va de la cimentación hacia la solera hidrofuga para la protección de humedad. Se han ejecutado 120 metros cuadrados.




Latitud: 16°54'32.5"N		Longitud: 89°53'54.7"O			
No.	Renglón:	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
11.06	Extracción de basura, ripio y desechos constructivos	Viaje	50.00	Q264.00	Q13,200.00

Se esta realizando la extracción conforme van saliendo los residuos y basura.



Latitud: 16°54'32.5"N		Longitud: 89°53'54.7"O			
-----------------------	--	------------------------	--	--	--

HOJA DE TRÁMITE
HT-CDAG-SDI-435-2026

<u>Para:</u>	Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar Director de Gestión de la Estrategia Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
<u>De:</u>	Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez Subgerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
<u>Fecha:</u>	06 de julio de 2026
<u>Asunto:</u>	Reciba un cordial y atento saludo de la Subgerencia de Desarrollo Institucional. En atención a la hoja de trámite número HT-CDAG-DP-0273-2026, emitida el 02 de julio del presente año por la Dirección de Presupuesto de la Subgerencia Financiera, en donde remiten el reporte del Sistema SICOIN R00815611.rpt Analítico de Ejecución Física y Financiera correspondiente a los meses enero a junio 2026, para conocimiento y efectos consiguientes. En virtud de lo anterior, traslado esta información para su conocimiento y, así mismo, se solicita revisar reporte de ejecución física y financiera e incluirlo en Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión que se reporta ante SEGEPLAN y MINFIN. Sin más que agregar.
<u>Firma y sello de recibido</u>	 

HOJA DE TRÁMITE
HT-CDAG-DP-0273-2026

DIRECCION DE PRESUPUESTO



Para:	Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez Subgerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
c.c.	Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar Director de Gestión de la Estrategia CDAG
De:	Señora Ruth Odily Corzo Rojas Director de Presupuesto Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Vo.Bo.	Licenciada Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiero Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Fecha:	Guatemala 02 de julio de 2026
Asunto:	Adjunto a la presente reporte del Sistema SICOIN R00815611.rpt Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión acumulado de enero a junio 2026, para conocimiento y efectos consiguientes. Atentamente,
Firma y sello de recibido:	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
FECHA 1/07/2026
HORA : 11:23.40
REPORTE: R00815611.rpt

OBRA Mayor o igual a 01

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2026		PG SP PY AC OB		DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)														
11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO														
013 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECRATIVAS														
000 006 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEIO DEPORTIVO MAYA, 7A. CALLE 1-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES PETEN.														
301752 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA 7A CALLE 1-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE SANTA ELENA FLORES PETEN					301752	METRO CUADRADO	0.00	4,248.32	1,263.32	29.74	0.00	2,060,845.71	0.00	0.00
000 008 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULOS TIPICOS EN COMPLEJO DE POPTUN, 7A. AVENIDA KM. 380 POPTUN, PETEN.														
359269 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULOS TIPICOS EN COMPLEIO DEPORTIVO DE POPTUN 7A AVENIDA KM 380 POPTUN PETEN					359269	METRO CUADRADO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	3,351,040.00	0.00	0.00
TOTAL 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO							0.00	2,060,845.71	0.00		0.00	2,060,845.71	0.00	


Ruth Odily Corzo Rojas
Directora
Dirección de Presupuesto



O-CDAG-SDI-049-2026
Guatemala, 9 de julio de 2026

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

14 JUL 2026

Firma: _____ Hora: 15:25
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: "En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."

Por lo anterior, se adjunta de forma impresa el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de junio 2026, reportado por las Unidades Administrativas de CDAG conforme a los procedimientos de la institución; dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Cordialmente,

Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia

-CDAG-

Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura

-CDAG-

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura

-CDAG-

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

-CDAG-

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero

-CDAG-

Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo

-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt

O-CDAG-SDI-048-2026
Guatemala, 9 de julio de 2026

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente



Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: "En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."

Por lo anterior, se adjunta de forma digital en formato PDF por medio de disco compacto (CD), el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de junio 2026, reportado por las Unidades Administrativas correspondientes; dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Cordialmente,

Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
-CDAG-

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-

Arq. Mónica de Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
-CDAG-

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-

Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt
