

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Arq. Mónica del Rosario Chav
Subgerente de Planificación de
Proyectos de Infraestructura



Dra. Julika Guan-Haase
Subgerente General Administrativo
Subgerencia General Administrativa



Gerente CDAG



Licda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera



Arq. Oscar Raúl Barrios
Subgerente General de
Infraestructura



AVANCES ABRIL 2025

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción _____	2
Marco Estratégico Institucional _____	3
Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión _____	4
Anexo Documentación de Respaldo _____	7

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, conforme al Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas; y Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Capítulo VI, Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38, Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii), establece: *“En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos (...)”*, en cumplimiento, se integra Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, correspondiente al mes de abril 2025.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia integra el presente informe, de acuerdo al seguimiento realizado por parte del Analista de Datos de Información de Proyectos SNIP, de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, haciendo del conocimiento por medio del Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-31-2025 de fecha 06 de mayo de 2025, en donde se indica que al 30 de abril 2025, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con cuatro (4) proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), tres (3) de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y uno (1) pendiente de aprobación para ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2025.

Marco Estratégico Institucional



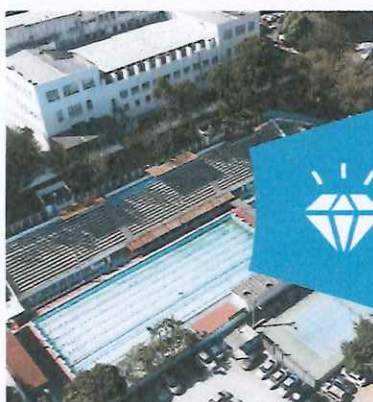
NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitude - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad

**PASIÓN POR
GUATEMALA**



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

La Subgerencia de Desarrollo Institucional recibió Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-31-2025 de fecha 06 de mayo de 2025, con atención al Director de Gestión de la Estrategia, emitido por el Director de Diseño y Planificación con Visto Bueno del Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura que adjunta el Oficio sin número de fecha 05 de mayo de 2025 emitido por el Analista de Datos de Información de Proyectos SNIP, de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura de la CDAG, en el cual hacen del conocimiento que, al 30 de abril 2025 la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con cuatro (4) proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), tres (3) de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y uno (1) pendiente de aprobación para ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2025.

La Subgerencia Financiera a través de la Dirección de Presupuesto, presentó reporte R00815611.rpt Ejecución de Gastos, Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, con porcentaje de ejecución del 89.28% del proyecto identificado con SNIP 333700 "Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala" que representa el avance financiero del mismo.

La subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura en Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-31-2025 de fecha 06 de mayo de 2025, reportó el avance físico de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, siendo el resultado siguiente:

1. SNIP 301752

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén:

- El proyecto se encuentra en trámites internos institucionales a efecto de llevar a cabo el evento para la contratación de una empresa especializada para la ejecución del proyecto y su eventual adjudicación, en Guatecompras, le aparece el Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
- El proyecto fue aprobado en SEGEPLAN, programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025 en caso de ser adjudicado en el presente año.

2. SNIP 333700

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala.

- En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de ejecución y en GUATECOMPRAS con el estatus de Adjudicado.
- Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de abril según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de **20.74%**; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número 4-2025 de fecha 30 de abril de 2025 en formato PDF.

3. SNIP 336771

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cubierta de Piscina Complejo Deportivo Calzada Ramiro de León Carpio, Carretera a Aldea Santa Lucía, Zacapa, Zacapa.

- En el SNIP el proyecto se encuentra en el ciclo de emisión de opinión técnica.
- En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.

4. SNIP 333856

- El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
- Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de ejecución en el SNIP aprobado por SEGEPLAN y en el estatus "No Adjudicado" en Guatecompras, por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

Por lo anteriormente descrito, se informa que al mes de abril 2025 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SNIP-, existe información registrada con relación al avance físico y financiero de los proyectos de inversión.

Anexo Documentación de Respaldo

CDAG



PAGINA 1 DE 4
FECHA 6/05/2025
HORA : 8:31.27
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO:

PRESUPUESTO FISICO						PRESUPUESTO FINANCIERO					
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											
Ejecución											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA 2 DE 4
FECHA 6/05/2025
HORA : 8:31.27
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO:

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00				0.00	144,709,596.00				147,156,979.58	34,353,305.61	23.34
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES																			
11	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO																		
					Promedio de ejecución física por actividad:														
011	000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA.																	
					1 Desarrollo Integral del Deportista														
					0	PERSONA	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	73,055,590.00	85,637,646.45	13,758,870.86	16.07				
					0	PERSONA	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00								
					0	EVENTO	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00								
					0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
					0	PERSONA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00								
					0	PERSONA	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00								
					0	EVENTO	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00								
					0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
012	000	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE																	
					0	PERSONA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	24,662,867.00	27,952,797.50	5,196,594.99	18.59				
					0	PERSONA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
014	000	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS																	
					0	ENTIDAD	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	73,987,840.00	75,553,862.99	4,656,547.02	6.16				
					0	ENTIDAD	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00								
					0	ENTIDAD	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00								
					0	ENTIDAD	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
017	000	SERVICIOS DE GESTION NACIONAL.																	
					0	PERSONA	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	41,896,380.00	45,685,588.70	11,491,324.60	25.15				
					1 Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 4
FECHA 6/05/2025
HORA : 8:31.27
REPORT: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

DEL PRESUPUESTO GENERAL AL PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN																
EJERCICIO: 2025					PRESUPUESTO FISICO								PRESUPUESTO FINANCIERO			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
					2 Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo		PERSONA	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00				
					3 Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo		DOCUMENTO	3.00	3.00		0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
019	000				SERVICIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA											
					1 Programas de formación continua y profesionalización para los diferentes grupos de interés		EVENTO	10.00	10.00		0.00	0.00		3,879,035.00	4,236,635.00	406,998.73
					4 Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.		EVENTO	10.00	10.00		0.00	0.00				9.61
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
020	000				SERVICIOS DE EVALUACION A FADN											
					1 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas		DOCUMENTO	3.00	3.00		0.00	0.00		2,056,350.00	2,392,950.00	845,496.49
					5 Evaluación a FADN		DOCUMENTO	3.00	3.00		0.00	0.00				35.33
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
021	000				SERVICIOS DE CULTURA											
					1 Atención a la Población a través del Museo del Deporte y Giras Deportivas para promocionar y concientizar acerca del legado histórico del deporte guatemalteco		DOCUMENTO	3.00	3.00		0.00	0.00		1,500,000.00	3,877,800.00	950,023.42
					2 Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil		DOCUMENTO	3.00	3.00		0.00	0.00				24.50
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
012					MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00		0.00	6,489,000.00	5,793,697.50
												0.00		0.00	6,489,000.00	5,793,697.50
000	008				MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES											
					GUATEMALA GUATEMALA		METRO CUADRADO	0.00	18,502.00		7,625.42	41.21				
					333700 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES											
					GUATEMALA GUATEMALA							41.21				
					Promedio de ejecución física por actividad:				1,914,210.00		7,625.42	1.09				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:											
					TOTAL 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO								223,038,062.00	245,337,280.64	37,305,856.11	15.21
12					ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
005	000				ORGANOS DE FORTALECIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO AL DEPORTE FEDERADO								4,391,750.00	4,597,300.00	1,186,307.32	25.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 6/05/2025
 HORA : 8:31.27
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL																
EJERCICIO: 2025																
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
					1 Fortalecimiento al Deporte Federado	0	DOCUMENTO	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00				
					2 Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
					4 Capacitación Arbitral	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
					5 Servicios Administrativos Contables	0	DOCUMENTO	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00				
					6 Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias	0	DOCUMENTO	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				88.00	0.00	0.00	0.00	4,391,750.00	4,597,300.00	1,186,307.32	25.80
					TOTAL 12 ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO											
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					001 000 APOORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES DEPORTIVOS							0.00	371,879,792.00	373,242,940.88	124,173,613.50	33.27
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00	0.00	0.00	371,879,792.00	373,242,940.88	124,173,613.50	33.27
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,914,298.00	7,625.42	0.34	0.34		776,823,501.10		



Ruth Odily Corzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto

MEMORANDUM
M-CDAG-SDI-017-2025



Para: **Licenciado**
Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

De: **Licenciada**
Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Asunto: Traslado de información para elaboración del Informe SNIP

Fecha: 06 de mayo de 2025



Reciba un cordial saludo de la **Subgerencia de Desarrollo Institucional**.

En atención al **Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-2025** mediante el cual la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura informa que se cuenta con 3 proyectos aprobados la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y uno pendiente de aprobación para ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2025, a su vez se adjunta Informe de Seguimiento del Señor Estuardo Valdez, Analista de Datos de Información de Proyectos SNIP.

En virtud de lo anterior, se solicita que dicha información sea revisada y analizada para tomar en consideración el contenido para la elaboración del Informe de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública -SNIP- que se debe entregar a la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala.

Sin más que agregar,

Atentamente.



OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-31-2025
Guatemala, 06 de mayo de 2025



Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

Con atención:
Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licenciada Rivera:

Reciba un cordial saludo y mis deseos de éxito en sus actividades cotidianas.

CDAG cuenta con cuatro proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), tres de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y uno pendiente de aprobación, para ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2025. Como parte del seguimiento mensual al 30 de abril de 2025, se consultó al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) y al Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP) al 30 de abril 2025, a continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

1. CÓDIGO SNIP 301752: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.
 - El proyecto se encuentra en trámites internos institucionales a efecto de llevar a cabo el evento para la contratación de una empresa especializada para la ejecución del proyecto y su eventual adjudicación, en Guatecompras le aparece el Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
 - El proyecto ya fue aprobado en SEGEPLAN, programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025 en caso de ser adjudicado en el presente año.
2. CÓDIGO SNIP 333700: CÓDIGO SNIP 333700 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.
 - En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de ejecución, aprobado por SEGEPLAN y en Guatecompras con el status de Adjudicado.
 - Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de abril según informe de supervisión, el SINIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 20.74%; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número 4-2025 de fecha 30 de abril de 2025 en formato PDF.

Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores.

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt

*Falloparan rivera
y elaboran informes
y compare a la vez y
sustentan en tiempo
correspondiente*

Guatemala, 5 de mayo de 2025

Arquitecto José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-



Arquitecto Vega:

CDAG cuenta con cuatro proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, tres de ellos aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y uno pendiente de aprobación, para ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2025. A continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

1. CÓDIGO SNIP 301752: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN.
 - El proyecto se encuentra en trámites internos institucionales a efecto de llevar a cabo el evento para la contratación de una empresa especializada para la ejecución del proyecto y su eventual adjudicación, en Guatecompras le aparece el Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 24776653.
 - El proyecto ya fue aprobado en SEGEPLAN, programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2024, por lo que deberá reprogramarse para el ejercicio fiscal 2025 en caso de ser adjudicado en el presente año.
2. CÓDIGO SNIP 333700: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.
 - En el SINIP el proyecto se encuentra en el ciclo de ejecución, aprobado por SEGEPLAN y en Guatecompras con el status de Adjudicado.
 - Se ingresó en la opción Avance Físico del Módulo de Seguimiento del SINIP la siguiente información: (a) los avances físicos acumulados de los renglones contratados al mes de abril según informe de supervisión, el SNIP registró un porcentaje de avance sobre la meta global de 20.74%; (b) fotografías con sus respectivas descripciones trasladadas por la supervisión del proyecto, evidenciando su avance; y (c) archivo del informe de supervisión número 4-2025 de fecha 30 de abril de 2025 en formato PDF.

Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores.
3. CÓDIGO SNIP 336771: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.
 - En el SNIP el proyecto se encuentra en el ciclo de emisión de opinión técnica.
 - En la evaluación realizada 25 de julio de 2024, el resultado fue pendiente, estando en gestión la actualización del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en relación con la norma NRD-2.
4. CÓDIGO SNIP 333856: AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.
 - El proyecto fue programado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025.
 - Actualmente el proyecto se encuentra en el ciclo de Ejecución en el SNIP, aprobado por SEGEPLAN y en el estatus "No adjudicado" en Guatecompras, por lo que CDAG, a través de la unidad administrativa correspondiente, ha iniciado el levantamiento de un nuevo evento para la contratación y eventual publicación en Guatecompras.

Sin otro particular, atentamente.


Estuardo Valdez

Analista de Datos de Información de Proyectos SNIP
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG)


Angela Lopez
11:59 hrs
06/05/2025

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt



BUSQUEDA DE PROYECTOS

Código:

333700

Nombre del proyecto:

Buscar

Código: 333700

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión
técnica



En ejecución



Finalizado

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

 Boleta del proyecto

Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

Institución: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**

Unidad ejecutora: **CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA**

Ubicación geográfica: **GUATEMALA, GUATEMALA**

Sector específico: **SECTORIAL**

Sector: **CULTURA Y DEPORTES**

Especie: **INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**


Situación actual: **EN EJECUCIÓN**

Etapa actual: **EN EJECUCIÓN**

Meta global: **18,502.00 m²**, Ejecutado: **3,836.71 m²** (Avance ponderado **20.74 %**) Nog: 23637781

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt



OFICIO No. 31-2025-SGI-DISUP-CDAG

Guatemala, 5 de mayo de 2025

Arq. José Antonio Vega Lobos
Dirección de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos
de Infraestructura CDAG

Estimado Arquitecto:

Por este medio se da respuesta a su Oficio NO. SPPI-DDP-CDAG-12-2025, en el que solicita el informe de avance físico, financiero y fotográfico correspondiente al mes de abril de 2025, del proyecto de inversión SNIP 333700: "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA".

Se remite el informe solicitado para realizar el registro en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) del avance físico de los proyectos de inversión según normas de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Atentamente agradecida por su atención.


Arq. María de los Angeles Álvarez Medrano
Supervisor de Obra CDAG





Vo. Bo. Ing. Oscar Rumbaldo Turcios Pacheco
Director de Supervisión CDAG

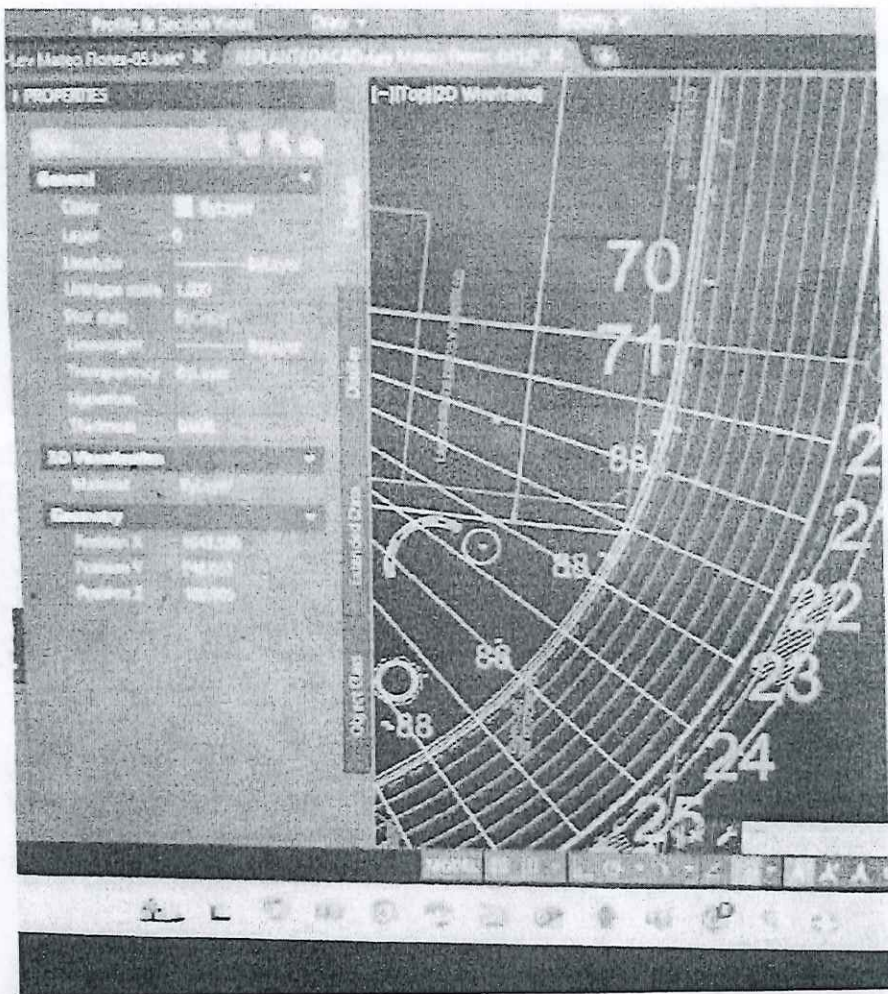


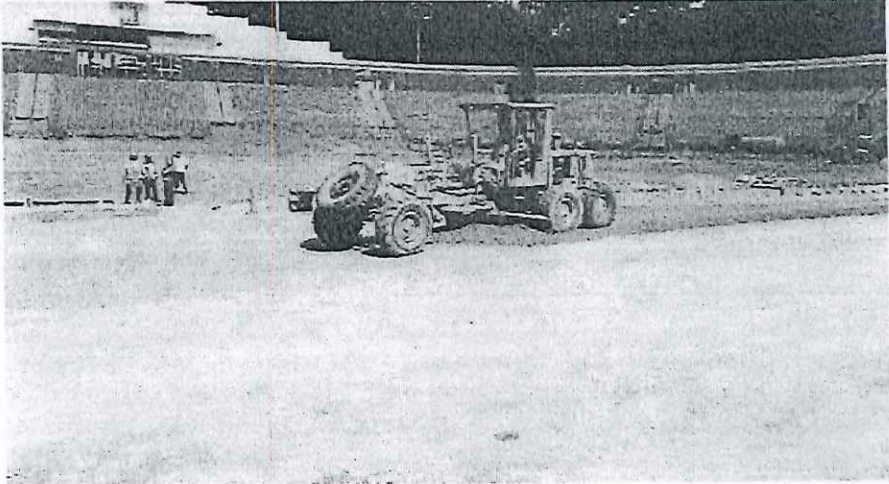
CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
1.02	Instalación de bodega para almacenaje de materiales.	Unidad	1.00	Q 15,377.41	Q 15,977.41				100.00%	1.00	1.00	1.00
1.03	Sistema de video vigilancia del proyecto	Unidad	1.00	Q 144,338.99	Q 144,338.99				100.00%	1.00	1.00	1.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES PISTA											
2.01	Desinstalación de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q 149.47	Q 903,776.33				100.00%	6,046.54	6,046.54	6,046.54
2.02	Demolición de cajas de arena existentes	Unidad	2.00	Q 11,084.35	Q 22,168.70				100.00%	2.00	2.00	2.00
2.03	Demolición de banquetas existentes.	Metro cuadrado	261.64	Q 159.81	Q 41,812.69				100.00%	261.64	261.64	261.64
2.04	Resanado de banquetas de concreto	Metro cuadrado	682.24	Q 207.26	Q 141,401.06				0.00%	682.24	0.00	0.00
2.05	Trazo e instalación de centros CP1 y CP2.	Metro cuadrado	10,924.96	Q 2.26	Q 24,690.41				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
2.06	Nivelación laser de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q 21.34	Q 129,033.16				100.00%	6,046.54	0.00	6,046.54
2.07	Trazo de pista de atletismo	Metro cuadrado	6,046.54	Q 4.33	Q 26,181.52				100.00%	6,046.54	0.00	6,046.54
3.00	TRABAJOS PRELIMINARES CANCHA DE FUTBOL											
3.01	Corte y levantado de gramilla natural.	Metro cuadrado	10,924.96	Q 37.30	Q 407,501.01				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
3.02	Traslado de gramilla a Complejo Deportivo de Zacapa	Metro cuadrado	10,924.96	Q 10.35	Q 113,073.34				100.00%	10,924.96	10,924.96	10,924.96
3.03	Desinstalación de marcos de portería existentes.	Unidad	2.00	Q 4,960.65	Q 9,921.30				100.00%	2.00	2.00	2.00
3.04	Excavación	Metro cúbico	6,424.90	Q 149.34	Q 959,494.57				100.00%	6,424.90	6,424.90	6,424.90
3.05	Nivelación laser de campo de futbol	Metro cuadrado	10,924.96	Q 22.59	Q 246,794.85				100.00%	10,924.96	6,000.00	10,924.96

CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)			Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP		
No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR ACUERDO No. 1	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del Informe de supervisión)
5.10	Borde de concreto	Metro lineal	850.00	Q738.17	Q627,444.50				0.00%	850.00	0.00	0.00
5.11	Pavimento color rojo	Metro cuadrado	2,156.25	Q1,252.14	Q2,699,926.88				0.00%	2,156.25	0.00	0.00
5.12	Área de pavimento de 20 mm de espesor	Metro cuadrado	167.20	Q1,519.57	Q254,072.10				0.00%	167.20	0.00	0.00
5.13	Área de pavimento de 25 mm de espesor	Metro cuadrado	12.96	Q3,074.40	Q39,844.22				0.00%	12.96	0.00	0.00
5.14	Marcaje de pista de atletismo	Unidad	1.00	Q126,421.60	Q126,421.60				0.00%	1.00	0.00	0.00
DRENAJE PISTA DE ATLETISMO												
6.01	Canal de concreto sección 1	Metro lineal	273.88	Q2,095.00	Q573,778.60				100.00%	273.88	0.00	273.88
6.02	Canal de concreto sección 2	Metro lineal	188.18	Q3,775.41	Q710,456.65				23.91%	188.18	0.00	45.00
6.03	Tubo PVC de 2 pulgadas de diámetro	Metro lineal	142.00	Q276.16	Q39,214.72				0.00%	142.00	0.00	0.00
6.04	Tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro	Metro lineal	216.00	Q269.71	Q58,257.36				0.00%	216.00	0.00	0.00
6.05	Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro	Metro lineal	9.00	Q2,528.76	Q22,758.84				0.00%	9.00	0.00	0.00
6.06	Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro	Metro lineal	75.00	Q1,711.79	Q128,384.25				0.00%	75.00	0.00	0.00
6.07	Tubo PVC de 12 pulgadas de diámetro	Metro lineal	450.00	Q958.00	Q431,100.00				0.00%	450.00	0.00	0.00
6.08	Ductos secos	Metro lineal	215.00	Q715.76	Q153,888.40				0.00%	215.00	0.00	0.00
DRENAJE FRANCÉS												
7.01	Tubo PVC de 8 pulgadas de diámetro	Metro lineal	1,293.00	Q783.55	Q1,013,130.15				0.00%	1,293.00	0.00	0.00
7.02	Tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro	Metro lineal	48.00	Q3,059.17	Q146,840.16				0.00%	48.00	0.00	0.00

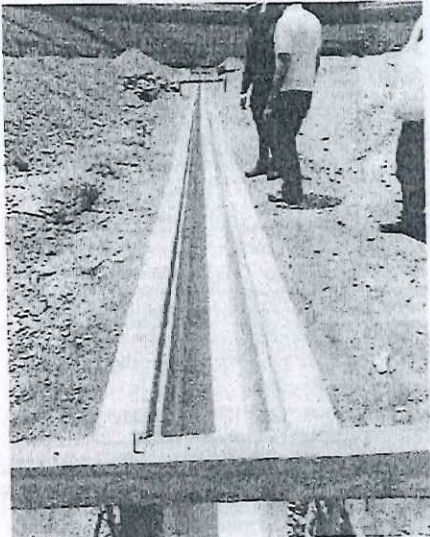
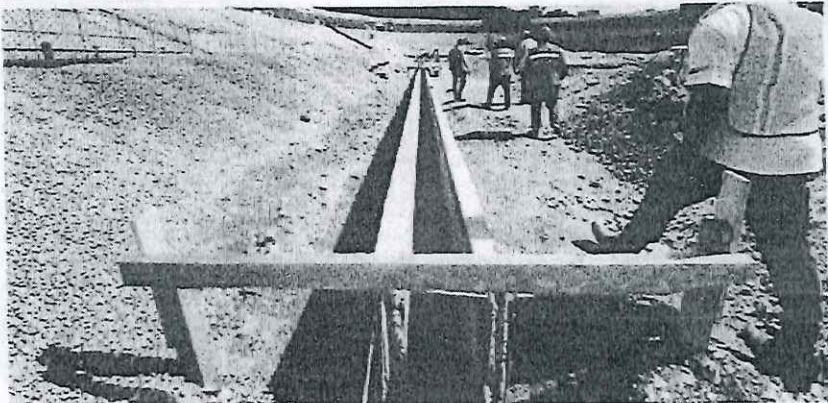
CANTIDADES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO						CANTIDADES FINALES SEGÚN ACUERDO No. 1 (Indicar el último documento que autoriza la modificación)		Ejecutado por renglón	CANTIDADES EN EJECUCIÓN para reportar en Módulo de Seguimiento del SNIP			
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	Incremento / Decremento	CANTIDAD	COSTO TOTAL O POR ACUERDO No.	%	CANTIDAD PROGRAMADA ACTUALIZADA	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes anterior)	EJECUCIÓN ACUMULADA (mes del informe de supervisión)
11.04	Equipo e implementos para la protección del personal	Unidad	1.00	Q49,283.62	Q49,283.62				100.00%	1.00	1.00	1.00
FIANZAS:												
Fianza de anticipo:												
		Nombre Afianzadora:	Seguros G&T, S.A.		No. de póliza	Clase C5 PÓLIZA NO.						
		Vigente del:	28/11/2024	al:		27/10/2025						
Fianza de cumplimiento de contrato:												
		Nombre Afianzadora:	Seguros G&T, S.A.		No. de póliza	Clase C5 PÓLIZA NO.						
		Vigente del:	29/11/2024	al:		12/06/2025						
Fianza de conservación de obra:												
		Nombre Afianzadora:			No. de póliza							
		Vigente del:		al:								
Fianza de saldos deudores:												
		Nombre Afianzadora:			No. de póliza							
		Vigente del:		al:								
Observaciones: (describir acontecimientos importantes ocurridos durante el período del presente informe de avance físico de la obra)												
 Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisora de Obra Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, CDAG  Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, CDAG  Bo. Vo. Ing. Oscar Rumbaldo Turcios Pacheco Dirección de Supervisión de Proyectos de Infraestructura Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, CDAG  Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, CDAG												

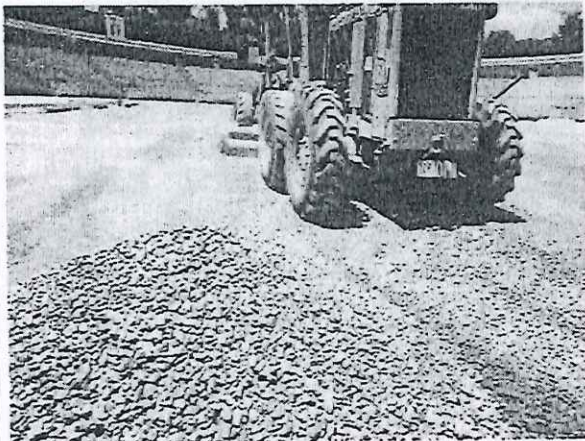
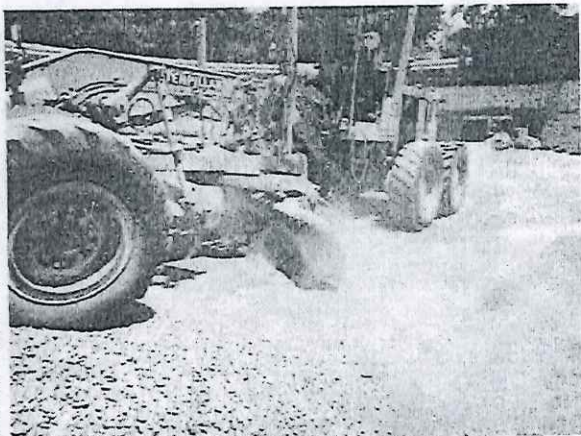
AVANCE FÍSICO SNIP:	
Porcentaje de avance físico del mes que corresponde el reporte en el Módulo de Seguimiento del SNIP:	20.74%
AVANCE FINANCIERO:	
Motivo:	Anticipo
	20.00%

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		2 de 13			
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)					
No. DE CONTRATO: 478		No. NOG: 23637781			
DIRECCIÓN: 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887			
EMPRESA EJECUTORA: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		SUPERVISOR DE LA EMPRESA: Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683			
		TEMPORALIDAD: 1 al 30 de abril de 2025			
		FECHA DE INFORME: 30 de abril de 2025			
CANTIDADES CONTRATADAS					
No.	REGLÓN	UNIDA D	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.07	Trazo de pista de atletismo	M2	6,046.54	Q4.33	Q26,181.52
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		20.74%
DESCRIPCION DEL REGLÓN					
Trazo de pista de atletismo: Trazo de pista de atletismo teniendo cuidado de mantener las pendientes requeridas y distancias solicitadas. Observación a la especificación técnica: con la finalidad de cumplir con las pendientes y distancias requeridas en planos, el trazo se rectifica periódicamente.					
					
Fotografía: 01/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'35.75"W					

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		4 de 13			
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)					
No. DE CONTRATO: 478		No. NOG: 23637781			
DIRECCIÓN: 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887			
EMPRESA EJECUTORA: Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		SUPERVISOR DE LA EMPRESA: Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683			
		TEMPORALIDAD: 1 al 30 de abril de 2025			
		FECHA DE INFORME: 30 de abril de 2025			
CANTIDADES CONTRATADAS					
No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.03	Instalación de capa sub-base (pista)	M³	2,309.00	Q534.02	Q1,233,052.18
Porcentaje (%) de avance del renglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global		20.74%
DESCRIPCION DEL REGLÓN					
Instalación de capa sub-base: Instalación de sub base la cual tendrá un peralte de 0.30 metros, conformada por gravo o piedra con un diámetro promedio de 1/2 pulgada debidamente conformada, la misma debe tener un CBR (Californian Bearing Ratio) Ensayo de Relación de Soporte de California el cual debe ser determinado según la norma AASHTO T-193, y contener como minimo un valor de 40%, además de contar con una compactación del 95 por ciento por medio mecánicos cumpliendo con la norma AASHTO T-180-01 proctor modificada, se deberán presentar los resultados de los laboratorios correspondiente donde se cumple con lo solicitado, incluir todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra para la correcta instalación de la misma.					
					
Fotografía: 7/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O		Fotografía: 8/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O			
					
Fotografía: 9/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O					

		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				6 de 13
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:		478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:		10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:		Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 30 de abril de 2025
					FECHA DE INFORME:	30 de abril de 2025
CANTIDADES CONTRATADAS						
No.	RENGLÓN			UNIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
5.04	Instalación de base compactada (pista)			M³	770.00	Q434.26
Porcentaje (%) de avance del renglón				100.00%	Porcentaje (%) avance global	
					20.74%	
DESCRIPCION DEL RENGLÓN						
Instalación de capa sub-base: Instalación de base compactada la cual deberá tener un peralte de 0.10 metros, la cual deberá quedar nivelada, estar conformada por una combinación de piedra o piedrín, con arena y suelo natural, la misma deberá tener un CBR (California Bearing Ratio) Ensayo de Relación de Soporte de California el cual debe ser determinado según la norma AASHTO T- 193, y debe contener un mínimo de 70%; además de contar con una compactación del 95 por ciento por medio mecánicos cumpliendo con la norma AASHTO T-180-01 de proctor modificada, se deberán presentar los resultados de los laboratorios correspondiente donde se cumple con lo solicitado, incluir todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra para la correcta instalación de la misma. Observación a la especificación: se realizaron las pruebas de compactación correspondientes.						
						
Fotografía: 12/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O						
Densidades efectuadas en capa de base en área de Pista el día 14/04/2025						
# Densidad	Estación	P.U.S. Campo (Lb/pie3)	% Humedad de Campo	% Humedad Optima	% Compactación	Capa de
1	Pista	118.7 lb/pie3	15.2%	15.6%	97.4%	Base
2	Pista	120.4 lb/pie3	15.0%	15.6%	98.8%	Base
3	Pista	118.7 lb/pie3	15.7%	15.6%	97.4%	Base
Cuadro tomado del informe con los resultados de las pruebas de compactación realizadas el 12 de abril de 2025.						

		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				8 de 13
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)				
No. DE CONTRATO:	478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887	
DIRECCIÓN:	10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683	
EMPRESA EJECUTORA:	Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 30 de abril de 2025	
				FECHA DE INFORME:	30 de abril de 2025	
CANTIDADES CONTRATADAS						
No.	REGLÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.01	Canal de concreto sección 1		ML	273.88	Q2,095.00	Q573,778.60
Porcentaje (%) de avance del reglón		100.00%	Porcentaje (%) avance global			20.74%
DESCRIPCION DEL REGLÓN						
Canal de concreto sección 1: Canal de concreto con rejilla prefabricada, de medidas variables, armado con 7 varillas corridas No.3 mas eslabones No.3 a cada 0.20 metros, rejilla en hierro, las cunetas son los canales de concreto reforzado fundido en sitio, que sirven para conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la pista, la resistencia será de concreto 3,000 psi y el refuerzo grado 60. Observación a la especificación: se utilizó concreto 4,000, las mejoras en la fundición no implicaron gastos adicionales para CDAG.						
						
Fotografía: 10/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O			Fotografía: 12/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O			
						
Fotografía: 14/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O						

		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				10 de 13	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-IP-02-2024)					
No. DE CONTRATO:		478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG:	Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887	
DIRECCIÓN:		10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA			SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683	
EMPRESA EJECUTORA:		Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR			TEMPORALIDAD:	1 al 30 de abril de 2025	
					FECHA DE INFORME:	30 de abril de 2025	
CANTIDADES CONTRATADAS							
No.	REGLÓN			UNIDA D	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.01	Instalación de sub base piedrín de 1/2 pulgada (campo)			M³	775.00	Q675.00	Q523,125.00
Porcentaje (%) de avance del renglón			77.42%	Porcentaje (%) avance global			20.74%
DESCRIPCION DEL REGLÓN							
Instalación de sub base piedrín de 1/2 pulgada: Instalación de una capa de piedrín de 1/2 pulgada de diámetro y un peralte de 0.10 metros, colocada de manera homogénea sobre toda el área del campo de futbol, asentada sobre un geotextil punzonado no tejido de fibra de polietileno al 100 por ciento, incluir todo el material, accesorios, herramientas, equipos y mano de obra para la correcta instalación del mismo. (Ver planos)							
							
Fotografía: 24/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O				Fotografía: 24/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O			
							
Fotografías: 26/04/2025 / Latitud: 14°37'32.91"N / Longitud: 90°30'36.79"O							

		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA		13 de 13	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA (LICITACIÓN PÚBLICA No. CDAG-LP-02-2024)			
No. DE CONTRATO:		478	No. NOG:	23637781	SUPERVISOR CDAG: Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Colegiado Activo No. 4887
DIRECCIÓN:		10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA		SUPERVISOR DE LA EMPRESA:	Arq. Bryan Alexander Claudio Ruyán Colegiado Activo No. 3683
EMPRESA EJECUTORA:		Brenda Margarita Archila Del Cid De Cruz CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		TEMPORALIDAD:	1 al 30 de abril de 2025
				FECHA DE INFORME:	30 de abril de 2025
GENERALIDADES					
PLAZO DE EJECUCIÓN DE ANTICIPO: 13 de marzo de 2025: se recibió oficio CORRELATIVO 20-2025, firmado por la señora Brenda Margarita Archila del Cid de Cruz, propietaria de la empresa BREMAR, en el documento hace referencia al oficio CORRELATIVO 6-2025 y CORRELATIVO 10-2025. Los tres oficios en mención son referentes a los atrasos en la ejecución del RENGLO 3.01 "Corte y levantado de grama natural" y RENGLO 3.02 "Traslado de grama a Complejo Deportivo de Zacapa", los renglones figuran en las primeras 7 semanas del cronograma general de ejecución, del 5 de enero al 24 de febrero de 2025. Los renglones también se incluyeron en el cronograma de ejecución del anticipo, comprendido del 20 de enero al 17 de marzo de los corrientes, equivalente a 8 semanas de duración. Derivado de los atrasos en los trabajos de acondicionamiento de la base en la cancha del Complejo Deportivo de Zacapa (servicios ejecutados por CDAG e independientes a la presente licitación), antes de la colocación de la grama a retirarse del Estadio Doroteo Guamuch Flores, el corte de grama y por consiguiente su traslado, dio inicio hasta el 19 de febrero de los corrientes, generando un atraso significativo en el cumplimiento del cronograma de ejecución del anticipo. Por parte de la supervisión de CDAG, se realizó la estimación de los avances físicos y los atrasos relativos a los renglones 3.01 y 3.02 y se determinó que el atraso correspondiente es de 4 semanas y tomando en cuenta que los atrasos no son adjudicables a la empresa BREMAR, se fija la fecha de finalización del tiempo de ejecución del anticipo el 14 de abril de los corrientes, se hace constar en el OFICIO No. 133-2025-SGI-DISUP-CDAG de fecha 17 de marzo de 2025. El 15 de abril de los corrientes se realizó la inspección en campo y se verificó el avance físico del anticipo correspondiente al 100%.					
REUNIONES DE SEGUIMIENTO E INSPECCIONES GENERALES DE AVANCES FÍSICOS: semanalmente se realizan las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo con la presencia de: a) Supervisor de la empresa BREMAR y propietaria de la empresa si fuera requerido, b) Supervisor de obra y director de Supervisión de CDAG, c) Arquitectos Diseñadores de la Subgerencia de Planificación de Infraestructura de CDAG -antes Dirección de Diseño y Planificación-, y, d) Supervisor de la empresa MONDO. El objetivo de las reuniones / inspecciones generales es: a) Aclaración de dudas sobre planos, b) Rectificar renglones del Contrato Administrativo, c) Rectificar avances físicos en obra.					
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN: Se realizó una auditoria por parte de la Contraloría General de Cuentas y una visita por parte de un diputado del Congreso de Guatemala, en ambas supervisiones se compartieron los avances físicos en obra, se revisaron planos del proyecto. Contrato Administrativo 478 y todo el expediente del proyecto.					
Arq. María de los Angeles Alvarez Medrano Supervisora de Obra Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, CDAG			Bo. Vo. Ing. Oscar Rumbaldo Turcios Pacheco Dirección de Supervisión de Proyectos de Infraestructura Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, CDAG		



O-CDAG-SDI-042-2025
Guatemala, 07 de mayo de 2025

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente



Estimada Licenciada Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."*


Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de abril 2025.


Cordialmente,



Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-


Licda. Marta Alicia Meighan Juarez
Subgerente Financiero
-CDAG-


Arq. Mónica del Rosario Chaviza
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-


Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-


Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativa
-CDAG-


Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt



O-CDAG-SDI-043-2025
Guatemala, 07 de mayo de 2025

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente



Estimado Licenciado Mendoza:


De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: *"En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, (...) informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."*

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de abril 2025 en formato PDF por medio de disco compacto, dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.


Cordialmente,


Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-


Arq. Mónica del Rosario Orellana
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-


Vo.Bo. Dra. Julika Quian Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-


Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
-CDAG-


Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-


Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt
