



Lic. Pablo Daniel Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
Subgerencia de Desarrollo Institucional



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Arq. Monica del Rosario Oliva
Subgerente de Planificación de
Proyectos de Infraestructura

Licda. Maria A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Arq. Oscar Raúl Barrios
Subgerente General de
Infraestructura

Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
Subgerencia General Administrativa

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción_____	2
Marco Estratégico Institucional_____	4
Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión_____	5
Anexos / Documentación de Respaldo_____	8

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, conforme al Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas; y Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Capítulo VI, Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38, Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii), establece: *“En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos,”* para dar cumplimiento se realiza la integración del Informe que contiene el Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, al 31 de enero de 2026.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia realiza la integración del Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión, con base al reporte de SICOIN No. R00815611.rpt “Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión” remitido por la Subgerencia Financiera y con la información proporcionada por la Subgerencia de Planificación... remitida a través del Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-034-2026 de fecha 03 de febrero de 2026, remitido por el Encargado de Despacho de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, en el cual informan que, CDAG cuenta con SEIS proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP- y aprobados por la Secretaría

General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con la información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos SNIP.

Marco Estratégico Institucional





NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISION

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

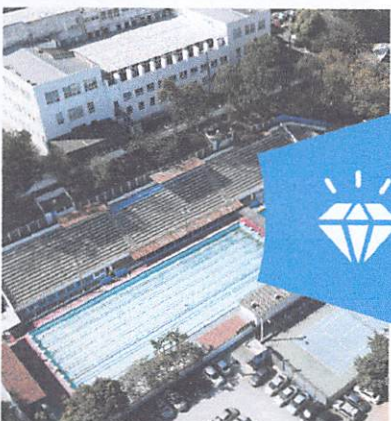

NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitude - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad

**PASIÓN POR
GUATEMALA**



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

A la Subgerencia de Desarrollo Institucional ingresó Hoja de Tramite HT-CDAG-DP-014-2026 con fecha 10 de febrero de 2026, remitida por el Director de Presupuesto con Visto Bueno del Subgerente Financiero de CDAG, en la cual adjuntan el reporte R00815611.rpt "*Ejecución de Gastos, Programación Cuatrimestral, Seguimiento Físico Cuatrimestral, Reportes Analítico de Ejecución Física y Financiera de los proyectos de inversión*" de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, el cual no contiene información relacionada a avance financiero en el mes de enero de 2026.

Asimismo, ingresó el Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-034-2026 de fecha 03 de febrero de 2026, dirigido al Subgerente de Desarrollo Institucional, emitido por el Encargado del Despacho de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura; en el cual informa que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cuenta con SEIS proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP- y aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con la información proporcionada por los Analistas de Datos de la Dirección de Diseño y Planificación de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura e Información de Proyectos SNIP.

La Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, mediante Oficio No. SPPI-DDP-CDAG-034-2026 de fecha 03 de febrero de 2025, reportó el avance físico de los Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, según el detalle en la tabla siguiente:

No.	Código SNIP	Nombre	NOG	Estatus en Guatecompras	Estatus en SINIP	% de Avance Acumulado	
						Físico	Financiero
1	301752	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7ª. Calle 3-34 zona 3, Colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén	24776653	Adjudicado	En Ejecución	8.17%	17.86%
2	333700	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas en 10ª avenida 23-91 zona 5, Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, Guatemala.	23637781	Adjudicado	Suspendido	31.68%	26.32%
3	336771	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cubierta de Piscina Complejo Deportivo Calzada Ramiro de León Carpio, Carretera a Aldea Santa Lucía, Zacapa, Zacapa	N/A	No aparece*	Aprobado el 24/10/2025	Sin Avance	Sin Avance
4	333856	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas, Gimnasio para Gimnasia Rítmica, Calle Ancha de Los Hereros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez	26909227	Vigente	En Ejecución	Sin Avance	Sin Avance
5	359269	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulos Típicos en Complejo Deportivo de Poptún, 7a. Avenida Km. 380, Poptún, Petén.	27221393	Vigente	Aprobado el 07/08/2025	Sin Avance	Sin Avance
6	359780	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Complejo Deportivo, Zona 3, 4ª. Calle entre 25 y 28 Av., Quetzaltenango, Quetzaltenango	27647528	Vigente	Aprobado el 19/08/2025	Sin Avance	Sin Avance

Fuente: Información con base al oficio No. SPPI-DDP-CDAG-034-2026 de fecha 03 de febrero de 2026 y documentos adjuntos al mismo.

*Aún no cuenta con NOG en Guatecompras.

De acuerdo a la información remitida a través del Oficio SPPI-DDP-CDAG-034-2026 por parte del Encargado de Despacho de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura y reporte remitido por el Subgerente Financiero, se integra la información conforme al procedimiento establecido para el efecto y se detalla lo siguiente:

- El proyecto de inversión con número SNIP 333700 "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10ª AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA," de acuerdo a la información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura, el estatus en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP- no ha cambiado se mantiene el mismo, conforme a lo reportado en el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión correspondiente al mes de diciembre de 2025 entregado en fecha 16 de enero 2026 el cual contiene el detalle de la rescisión del contrato.
- El proyecto de inversión con número SNIP 301752 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7ª. CALLE 3-34 ZONA 3, COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN", según información trasladada por la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura durante el mes de enero no hubo avance de los renglones contractuales, de acuerdo al informe del supervisor mediante oficio No. 041-2026-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 29 de enero de 2026 el cual indica que: "Se identificaron algunos avances mínimos en campo, estos no representan un progreso significativo en relación con las metas de ejecución establecidas en el cronograma vigente, por lo que no se reflejan como incremento porcentual en el avance general de la obra".
- El proyecto de inversión con número SNIP 333856 "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ", actualmente se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP, aprobado por SEGEPLAN, no presenta avance físico y financiero al 31 de enero de 2026.

Anexos / Documentación
de Respaldo

CDAG



OFICIO No. SPPI-DDP-CDAG-034-2026
Guatemala, 03 de febrero de 2026



Licenciada
Karin Rivera
Subgerencia Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Apreciable Licenciada Rivera

Respetuosamente me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se lleven a cabo con éxito.

Por este medio me permito informar que CDAG cuenta con **SEIS** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, **SEIS** de ellos aprobados por la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con información proporcionada por los Analistas de Datos e Información de Proyectos SNIP, los cuales se detallan en informes adjuntos.

Por lo que se traslada el informe completo para con su proceso correspondiente.

Sin nada más que agregar.




Arquitecto

José Antonio Vega Lobos

Encargado del Despacho de la Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura

Copia archivo
JAVL/gasp
Dirección de Diseño y Planificación

*03/02/2026
Pablo y José por revisar
el contenido de avance de
proyectos SNIP para, mantener
la integridad, y busqueda
de firmas de los demás
miembros de los responsables
para remitirlos a
Segeplan*





Guatemala, 29 de enero de 2026

Arquitecto José Antonio Vega Lobos
Director de Diseño y Planificación
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
Presente

Arquitecto Vega:

Reciba un cordial saludo.

Según el Procedimiento Diseño y Planificación, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN SPPI-PRO-01, VERSION 1, en su actividad número 27, el Analista de Datos e Información de Proyectos SINIP, cuando aplique, que se extrae del SINIP y traslada por Documento Oficial al Jefe de Proyectos de Inversión, ahora bien dado que no se tiene la figura de la Jefatura de Proyectos de Inversión, el informe que se extrae del SINIP y GUATECOMPRAS, se traslada directamente a la Dirección de Diseño y Planificación, con el objeto de elaborar Documento Oficial con el visto bueno del Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura y entregar dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a la Subgerencia de Desarrollo Institucional para que sea integrado al informe de avance físico y financiero de proyectos de inversión.

Se me han asignado **TRES** proyectos ingresados al Sistema de Información de Inversión Pública, los cuales ya han sido aprobados por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para ser ejecutados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026. A continuación, se detalla la situación de estos proyectos.

(1) CÓDIGO SNIP 333700:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 28 de junio de 2024, se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP. El estado del proyecto en el módulo de seguimiento del SINIP se encuentra en "Suspendido".
- En Guatecompras con el estatus de "Adjudicado" con Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) 23637781.
- La supervisión ya no presentó informe, por haber finalizado el tiempo contractual del contrato de ejecución y rescindido el mismo, por lo que el estado en el SINIP no ha cambiado.

Se adjunta evidencia de lo manifestado en los incisos anteriores: (a) capturas de pantalla de la información que le aparece en el SINIP en BÚSQUEDA DE PROYECTOS; (b) captura de pantalla del estado actual que le aparece en el SINIP en el MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, en el que se indica que ya fue recibido en SIGES/SICOIN.

(2) CÓDIGO SNIP 336771:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA.


- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 24 de octubre de 2025, se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP.
- No aparece en Guatecompras.

(3) CÓDIGO SNIP 359269:

AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULOS TÍPICOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN, 7A. AVENIDA KM. 380, POPTÚN, PETÉN.

- El proyecto fue aprobado por SEGEPLAN con fecha 7 de agosto de 2025, se encuentra en el ciclo de "En ejecución" en el SINIP.
- En Guatecompras aparece con Número de Operación GUATEMCOMPRAS (NOG) 27221393, el proyecto se encuentra en estatus: "Evaluación (no se aceptan ofertas)", pues el cierre de ofertas fue el 20 de enero del año en curso.

Sin otro particular, atentamente.




Estuardo Valdez
Analista de Datos e Información de Proyectos SNIP
Jefatura de Proyectos SNIP -CDAG-

CAPTURAS DE PANTALLA TOMADAS DEL SINIP EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA:

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión
técnica



En ejecución



Finalizado

DIRECCIÓN DE DISEÑO
Y PLANIFICACIÓN

29 ENE 2026

RECIBIDO

HORA: 07:41



Proyecto: 333700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 97
ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Ubicación geográfica: GUATEMALA, GUATEMALA

Sector específico: SECTORIAL

Sector: CULTURA Y DEPORTES

Especie: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Situación actual: SUSPENDIDO

Etapas actuales: SUSPENDIDO

Meta global: 18,502.00 m². **Ejecutado:** 5,862.27 m² (Avance ponderado 31.68 %) **Nog:** 23637781



Seguimiento de Proyectos

Usuario: ANGEL ESTUARDO VALDEZ PAIZ (APAIZ)
Proyecto: 133700 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL, TORRETO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA
Datos meta global: Meta vigente: 18,502.00 m² | Avance: 31.68%
Ejecución 2025: (ACTIVO) Avance Financiero: 26.32% - Avance meta anual 22.14%
NOG's: - 22637781 - NEC's:

AVANCE FISICO

Seleccione la fecha que desea acceder o el botón de "NUEVA" para agregar:

Ejerc.	Fecha	TI	IP	REGISTRO DE EJECUCION
2025	10-12-2025	08	✓	📄
2025	02-12-2025	08	✓	📄
2025	05-11-2025	08	✓	📄
2025	04-10-2025	08	✓	📄
2025	03-09-2025	08	✓	📄
2025	02-08-2025	08	✓	📄
2025	01-07-2025	08	✓	📄
2025	30-06-2025	08	✓	📄
2025	29-05-2025	08	✓	📄
2025	28-04-2025	08	✓	📄
2025	27-03-2025	08	✓	📄
2025	26-02-2025	08	✓	📄
2025	25-01-2025	08	✓	📄
2025	24-12-2024	08	✓	📄
2025	23-11-2024	08	✓	📄



Guatemala, 2 de febrero 2026

Arquitecto
José Antonio Vega Lobos
Encargado del Despacho de la
Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
Subgerencia General de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

*Recibi 02-02-2026
13:40h*

Arquitecto Vega Lobos:

Cordial saludo,

En el presente se consigna información relacionada con los siguientes proyectos:

1. SNIP 359780 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Complejo Deportivo, zona 3, 4 calle entre 25 y 28 av., Quetzaltenango, Quetzaltenango (CENAD Xela)
2. SNIP 333856 Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio para Gimnasia Rítmica, Calle Ancha de los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
3. SNIP 301752 Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén.

Con relación al proyecto que se identifica con el número de registro SNIP 359780 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Complejo Deportivo, zona 3, 4 calle entre 25 y 28 av., Quetzaltenango, Quetzaltenango (CENAD Xela), se informa que, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el proyecto se identifica con el NOG 27647528, Licitación Pública No. CDAG-LP-11-2025 publicado el concurso el 10 de diciembre de 2025, la nueva fecha de presentación y cierre de ofertas será el 9 de abril de 2026. Se adjunta, imagen de dicha publicación:

Detalle de concurso	
NOG:	27647528
Descripción:	licitación pública en el cuadro 11-2025 mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas gimnasio de acondicionamiento físico, complejo deportivo, zona 3, 4 calle entre 25 y 28 av., quetzaltenango, quetzaltenango
Modalidad:	Licitación Pública (Art. 17 LC)
Especialidades:	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción y mantención obras • Otros tipos de obras o servicios
Tipo de concurso:	Físico
Entidad:	CDAG (CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA)
Tipo de Entidad:	Entidades Descentralizadas, Autónomas y de Seguridad Social
Unidad compradora:	(USU) DE LICITACIÓN
Tipo de recepción de ofertas:	Sílo electrónico. El Proveedor debe acudir y presentar su oferta por medio del formulario electrónico que el sistema Guatemanager genera y presentarlo de acuerdo a la evidencia en los pasos del concurso.
Fecha de publicación:	10.diciembre.2025 01:00:17 p.m.
Fecha de presentación de ofertas:	09.abril.2026 10:00:00 a.m.
Fecha de cierre de recepción de ofertas:	09.abril.2026 10:00:00 a.m.
Tipo Proceso:	Adquisición Computada
Porcentaje de fianza de cumplimiento:	3
Porcentaje de fianza de cumplimiento:	10
Fecha de última actualización:	[--] No Publicado
Fecha del último cambio de estatus:	[--] No Estatusado
Estatus:	Vigente (No se aprueba ofertas electrónicas)
Requiere SNIP:	SI

En el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública, aparece que el 19 de agosto de 2025 fue aprobado el proyecto.

SNIPgt INICIO MENU DE OPCIONES USUARIO REGISTRADO

Código: 333780

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO COMPLEJO DEPORTIVO RONALD G CALAT ENTRE 26 Y 28 AV QUITZALTENANGO QUITZALTENANGO

CICLO DEL PROYECTO

Registro Emission de opinion técnica En ejecución Finalizado

OPINIÓN TÉCNICA

Opinión técnica: APROBADA Ejercicio: 2026

Historial:

EJERCICIO	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
2026	19/08/2025	Aprobada	Ver observaciones

En el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública, el proyecto se encuentra "Activo" para la ejecución 2026, sin embargo no se registra avance físico en dicho sistema, debido a que aún no se encuentra en ejecución.

SNIP Seguimiento de Proyectos

Usuario: MURAN KARINA RODRIGUEZ REVELO (NOV) (MURRODRE) Proyecto: 333780 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO COMPLEJO DEPORTIVO RONALD G CALAT ENTRE 26 Y 28 AV QUITZALTENANGO Fecha límite global: 14/01/2026 m3 | Avance: 80% Ejercicio: 2026 | ACTIVO | Avance Financiero: 100% | Avance Físico: 33%

INFORMACIÓN IMPORTANTE: [Ver](#)

La propuesta de inversión para el ejercicio fiscal 2026, se realizará en forma digital en el SNIP de acuerdo a lo señalado en oficio circular DID-004-2024.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: [Ver](#)

Estimados usuarios, atentamente se les informa:

DESCARGUE MANUAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

[Manual de seguimiento de proyectos](#)

Oficio circular DASID-01-2023, Seguimiento a proyectos de Agua y saneamiento

[Oficio Circular DASID-01-2023](#)

Se recuerda a las entidades de públicas de inversión -EPI-, que de acuerdo a lo señalado en las normas SNIP vigentes, el último día hábil del mes de noviembre de cada ejercicio fiscal, será la fecha límite en la que SEGEPLAN recibirá las respuestas a las observaciones formuladas a los proyectos a ser ejecutados en el año vigente.

Se hace el atento recordatorio, de que como parte de los procesos establecidos las EPI deben identificar, formular evaluar, registrar y cargar los documentos de inversión complejos de manera que los proyectos deben de estar debidamente estructurados y formulados, para dar cumplimiento a lo establecido en las normas SNIP vigentes y la guía FEPIP, esto de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente en el país.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: [Ver](#)

Estimados usuarios, atentamente se les informa:

Oficio circular DASID-02-2023, Finalización de Proyectos en el SNIPgt

[Oficio Circular DASID-02-2023](#)

INFORMACIÓN IMPORTANTE: [Ver](#)

El proyecto SNIP 333856 Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Gimnasio para Gimnasia Rítmica, Calle Ancha de los Herreros No. 5 Centro Histórico, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado se identifica con el NOG 26909227, Licitación Pública No. CDAG-LP-02-2025, la fecha de publicación fue el 03 diciembre 2025, la recepción y cierre de ofertas fue el 27 de enero 2026 en la que se presentaron 2 ofertas.

Detalle de concurso

NOG:	26909227
Descripción:	LICITACION PÚBLICA NO. CDAG-LP-02-2025 AMPLIACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RITMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTORICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.
Modalidad:	Por oferta abierta (art. 11 LPD)
Licitud de oferta:	• Concurrencia y selección libre. Q
Tipo de concurso:	Abierto
Estado:	CERRADO (PROYECTOS Y OFERTAS) (MURRODRE) (03/12/2025)
Tipo de entidad:	Entidades descentralizadas, autónomas y de régimen especial
Unidad organizadora:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Tipo de modalidad de selección:	Selección libre y competitiva. El Proponente debe enviar su propuesta al día de la recepción de ofertas en el formato establecido en el Anexo A. La fecha de recepción de ofertas es el 27 de enero de 2026 a las 12:00 PM (hora local).
Fecha de inicio de ofertas:	03 diciembre 2025 09:00 AM
Fecha de cierre de recepción de ofertas:	27 enero 2026 12:00 PM
Tipo Proceso:	Adquisición de bienes
Participación por Fianza o de garantía:	0
Plazo de ejecución del contrato de cumplimiento:	31
Fecha de última modificación:	1 de febrero 2025
Fecha del último cambio de estado:	1 de febrero 2025
Estado:	Cerrado (no se aceptan ofertas)
Requiere SNIP:	SI
Última Modificación:	03/12/2025 09:00 AM

temala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt



En el Sistema de Información de Inversión Pública, aparece que el 18 de junio de 2024 fue aprobado el proyecto.

Código: 030856

Nombre del Proyecto: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RITMICA CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO 5 CENTRO HISTORICO ANTIGUA GUATEMALA.S.CATEPEQUEZ

CICLO DEL PROYECTO



Registro



Emisión de opinión técnica



En ejecución



Finalizado

OPINIÓN TÉCNICA

Opinión técnica: APROBADO, Ejercicio: 2024

Historial:

EJERCICIO	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
2025	18/06/2024	Aprobado	Ver observaciones

En el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública, el proyecto se encuentra "Activo" para la ejecución 2026, sin embargo no se registra avance físico en dicho sistema, debido a que aún no se encuentra en ejecución.

SNIP Seguimiento de Proyectos

Usuario: MELISSA KARINA RODRIGUEZ ZENONCITO (KARINRODRI) | Proyecto: 333856 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RITMICA CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTORICO ANTIGUA GUATEMALA, S.C. | Datos meta global: META VIGENTE: 211,000 M2 | Avance: 6,00% | Variación de la META: -21,78% | Ejecución 2024: (ACTIVO) Avance Financiero: 3,00% - Avance meta anual: 0,00% | MODAL: -NIC-

OPCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
La propuesta de inversión para el ejercicio fiscal 2025, se realizará en forma digital en el SNIP de acuerdo a lo señalado en oficio circular DID-004-2024.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Estimados usuarios, atentamente se les informa:
DESCARGUE MANUAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Manual de seguimiento de proyectos
Oficio circular DASID-03-2023, Seguimiento a proyectos de Agua y saneamiento
Oficio Circular DASID-03-2023

Se recuerda a las entidades de públicas de inversión -EPI-, que de acuerdo a lo señalado en las normas SNIP vigentes, el último día hábil del mes de noviembre de cada ejercicio fiscal, será la fecha límite en la que SEGEPLAN recibirá las respuestas a las observaciones formuladas a los proyectos a ser ejecutados en el año vigente.

Se hace el debido recordatorio, de que como parte de los procesos establecidos los EPI deben identificar, formular evaluar, registrar y cargar los documentos de inversión completos de manera que los proyectos coben de estar debidamente estructurados y formulados, para dar cumplimiento a lo establecido en las normas SNIP vigentes y la guía FEPIP de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente en el país.


INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Estimados usuarios, atentamente se les informa:
Oficio circular DASID-02-2023, Finalización de Proyectos en el SNIPgt
Oficio Circular DASID-02-2023

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El proyecto que se identifica con número de registro SNIP 301752 Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo Típico de Combate y Muro Perimetral en Complejo Deportivo Maya, 7a calle 3-34 zona 3 colonia El Bosque, Santa Elena, Flores, Petén, según el contrato administrativo No. 390-2025 se encuentra en ejecución, ya que el inicio de la obra es 10 de septiembre 2025 y la fecha de finalización es 5 de agosto de 2026, sin embargo durante el mes de enero no hubo avance de los renglones contractuales, según informa el supervisor del proyecto arquitecto Luis Guillermo López Rivera, mediante oficio No. 041-2026-SPPI-DISUP-CDAG de fecha 29 de enero de 2026 en el que expone lo siguiente: "Si bien se identificaron algunos avances mínimos en campo, estos no representan un progreso significativo en relación con las metas de ejecución establecidas en el cronograma vigente, por lo que no se reflejan como incremento porcentual en el avance general de la obra".



Se adjunta captura de pantalla del registro administrativo en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública.

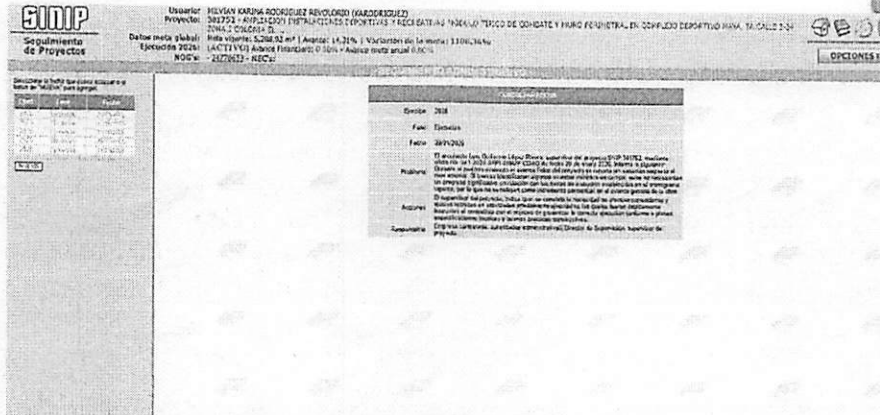

Se adjunta copia del oficio No. 041-2026-SPPI-DISUP-CDAG

Atentamente,



Karina Rodríguez
 Analista de Datos e Información de Proyectos en el SNIP
 Jefatura de Proyectos de Inversión
 Dirección de Diseño y Planificación
 Subgerencia de Planificación de Proyectos de Infraestructura
 Subgerencia General de Infraestructura
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala




HOJA DE TRÁMITE

HT-CDAG-DP-014-2026

DIRECCION DE PRESUPUESTO

Para:	Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez Subgerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
c.c.	Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar Director de Gestión de la Estrategia CDAG
De:	Señora Ruth Odily Corzo Rojas Director de Presupuesto Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Vo.Bo.	Licenciada Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiero Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Fecha:	Guatemala 10 de febrero de 2026
Asunto:	Adjunto a la presente reporte del Sistema SICOIN R00815611.rpt Analítico de Ejecución Física y Financiera correspondiente al mes de enero 2026, para conocimiento y efectos consiguientes. Atentamente,
Firma y sello de recibido:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA</p><p>10 FEB 2026</p><p>RECIBIDO</p><p>FIRMA: <i>Duce</i> HORA: 10:22</p></div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</p><p>10 FEB 2026</p><p>RECIBIDO</p><p>FIRMA: <i>Duce</i> HORA: 10:22</p></div></div>



Pablo te adjunto el reporte de la ejecución con el resultado de ejecución física y financiera del mes de enero 2026 para revisión y efectos consiguientes de acuerdo a la planificación

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

OBRA Mayor o igual a 01

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 10/02/2026
 HORA : 7:45.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

Entidad :

Promedio de ejecución física por actividad:

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:

 **CDAG**
GUATEMALA
 Ruth Odily Garzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto

O-CDAG-SDI-015-2026
Guatemala, 10 de febrero de 2026



Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
17 FEB 2026
Firma: _____ Hora: 9:31
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: "En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."

Por lo anterior, se adjunta de forma impresa el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de enero 2026, reportado por las Unidades Administrativas de CDAG conforme a los procedimientos de la institución; dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-

Arq. Oscar Raúl Barrios Parades
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
-CDAG-

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-

Lic. Pablo Daniel Escobar Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
-CDAG-

Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-

Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
MENSAJERÍA



17 FEB 2025

RECIBIDO

FIRMA:

A

HORA:

7:45



O-CDAG-SDI-014-2026
Guatemala, 10 de febrero de 2026

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente



Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso (ii) que establece: "En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance físico y financiero de los proyectos."

Por lo anterior, se adjunta de forma digital en formato PDF por medio de disco compacto (CD), el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al mes de enero 2026, reportado por las Unidades Administrativas correspondientes; dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
-CDAG-

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente General de Infraestructura
-CDAG-

Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente Financiero
-CDAG-

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente
-CDAG-

Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
-CDAG-

Arq. Mónica de Rosario Oliva Sosa
Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura
-CDAG-

Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
-CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt
