





CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

roms

-

5700

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS



AVANCES SEPTIEMBRE 2022

Tabla de Contenido

Contenido

-

7

Introducción	2
Marco Estratégico Institucional	4
Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración	5
Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental	6

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de septiembre 2022.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados para el presente ejercicio fiscal.

-

El presente informe está integrado por la siguiente de información:

Descripción	Unidad Responsable
Información de la planificación de los proyectos de	Dirección de Gestión de la
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas	Estrategia de la Subgerencia de
para el ejercicio fiscal 2022	Desarrollo Institucional
Avance físico y financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en curso en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP	Subgerencia de Infraestructura
Avance financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en Sistema Informático de Gestión	Subgerencia Financiera

Marco Estratégico Institucional


Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial MISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

VISIÓN

MISIÓN Y VISIÓN

VALORES



Planificación de Proyectos de Inversión

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la Planificación Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2022:

PROYECTO	AVANCE FISIGO	AVANCE FINANCIERO
Construcción sistema de tratamiento aguas residuales finca La Aurora 7 avenida final zona 13, Domo Polideportivo.	100%	89.29%
Construcción edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo.	100%	100%

Nota

El avance reflejado para los proyectos "Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo" y para "Construcción sistema de tratamiento aguas residuales Domo Polideportivo" es correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

1

1





Fecha Emblón:

9/09/2022 13 46 PM

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATE

SNIPgt

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto:

Forms Capital Fijo

CONSTRUCCION SISTÉMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA

FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA

institución responsable:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora responsable:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación:

Planifición Institucional

Modelidad especifica:

Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division:

Función anterior:

AGUA Y SANEAMIENTO Sub-función anterior: AGUA Y SANEAMIENTO

B-PROTECCION AMBIENTAL

2 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

1 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

Ubicación geográfica:

Well State Control GUATEMALA

Área de influencia:

Local

Responsables:

Responsable dol provecto

Pormutador del proyecto:

Nombre: Lic. Luis Néstor Madrid

INTEG Ingenieria integrada/ ing. Gabriel Estuardo Mambra

Cargo: Gerente General Carpo: Formudados

24127500

Teléfono: 24494727/24485207

Teléfoco: cdag.com.gl

inten_quatemata@yahoo.es

Modalidad de ejecucion del Proyecto:

CONTRATO

DIAGNÓSTICO:

Antecedentes:

Al sur de la ciudad de Gualtemala en un campo abierto de tierra, se construyó la conocida Piaza de Toros La Aurora en la fince del mismo nombre en el Hipódromo del Sur, inaugurada el 20 de Octubre de 1953. En el área donde estaba la Plaza de Toros La Aurora, el año 2000 fue construido El Domo Polideportivo de la CDAG, con una capacidad de 7,500 espectadores. Lo utilizan también la Federación Nacional de Fútsal y la Federación Nacional de Balonmano (lugar dende los attetas de ambas federaciones practican rutinas y flevan a cabo tomeos nacionales). En la finca se encuentran también las instalaçiones deportivas de las siguientes federaciones: Federación Nacional de Ciclismo y la Federación Nacional de Patinaje (utilizan el Velódromo Nacional para practicar y realizar eventos deportivos) y las asociaciones nacionales de Ráquelbol y Squash.

Actualmente las instalaciones se utilizan frecuentemente y según los registros administrativos durante el año 2013 en el polideportivo de la zona 13 se ocuparon 75,192 parqueos, de tal cuenta que se tiene un promedio mensual de 8,266 parqueos utilizados, y el número de atlatas matriculados activos de todas las federaciones que aloja es da: 1,985, de los

cuales 752 son mujeres y 1/233 hombres.

ANTECEDENTES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Al inicio de la construcción del centro de recreación, así como la Plaza de Toros, no se contempló el componente ambiental

Como la Plaza de Toros, no se contempló el componente ambiental

Como la Plaza de Toros, no se contempló el componente ambiental

Como la Construcción del Domo para minimizar riesgos y contaminación, principalmente de cuerpos scuiferos. Posteriormente con la construcción del Domo Polideportivo, si se construyeron sistemas de drenajes, tanto pluvial como sanitario, con colactores capaces de canalizar estas aguas de forma adequada, sin embargo, al final de los mismos no se contempló un sistema de tratamiento, por lo que estas aguas desfogan directamente en el río Chinautia. Desde hace varios afios se ha gestionado un proyecto de tratamiento de las aguas residuales, prevenientes de las diferentes Instalaciones que alberga la finca.

ewgagSboleta2020

Pag I de 13



Focha Emisión

26/08/2022 03:48 PM

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO. GUATEMALA, GUATEMALA GENERAL del Proyecto

SNIPgt

Problem	itica /	Arboi	đel	Problema:
---------	---------	-------	-----	-----------

Efectos Indirectos

Efectos Directos

PROBLEMA CENTRAL:

Causas Indirectas

Causas Directas

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01 :

VAN:

.00

itemativa 02 :

TIR:

VAN:

CAE:

CAE:

Itemativa 03 :

TIR:

VAN:

CAE:

Justificación:

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

Desde hace muchos años, uno de los principales problemas del Completo Deportivo de la Finca La Aurora, zona 13, ciudad de Guatemala ha consistido en la faita de un sistema adecuado de disposición de aguas servidas las cuales se canalizan a través de colectores descargando directamente a zanjones y quebradas sin un tratamiento adecuado que minimice los riesgos y la contaminación de ese entomo.

JUSTIFICACIÓN LEGAL:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

El artículo 64 de la Constitución Política de la República de Gualemala, literalmente dice: Artículo 64. Patrimonio natural. Se dectara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentarà la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalianables.

El artículo 97 de ese mismo documento, literalmente indica: Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necedarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.

-ACUERDO GUBERNATIVO No. 236-2006, REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REÚSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICIÓN DE LODOS

Et objeto de este documento es establecer los criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reúso de aguas residuales, así como para la disposición de lodos. Lo enterior para que, a través del mejoramiento de las características de dichas aguas, se logre establecer un proceso continuo que permita:

- Protéger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana.
- Recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización.
- Promover el desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada.

Tambén es objeto dal presente Reglamento establecer los mecanismos de evaluación, control y seguirniento para que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturates promueva la conservación y mejoramiento del recurso hidrico.

Este documento según indica debe aplicarse en los siguientes casos:

- Los entes generadores de aguas residuales.
- Las personas que descarguen sus aguas residuales de tipo especial al alcantarillado público.
- -Las personas que produzcan aguas residuales para reúso.

uncupatholeta 2020 Pen 2 do 13



Fecha Emisión: Hora

9/09/2022 13.46 PM

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,

GUATEMALA, GUATEMALA mación General del Proyecto

SNIPgt

- -Las personas que reúsen parcial o totalmente aguas residuales.
- -Las personas responsables del manajo, tratamiento y disposición final de lodos.

Descripción AJUSTADA:

El sistema de tratamiento de aguas residuates prevista es una planta tipo paquete es decir, tecnologia compaçta de alta eficiencia de aireación extendida o lodos activados.

El proceso tecnológico se denomina Lodos Activados o bien Aireación Extendida, de alta eficiencia en remoción de materia orgánica y reducción de microbiología que es el detalle que nos interesa dentro de este sistema a instalar.

El proceso es de tipo biológico, sin adición de agentes químicos, sino más bien inyección a granel de oxigeno mediante bombas de inyección de aire, accionado eléctricamente.

El proceso es de tipo aerobio sin presencia de maios olores, requerimientos mínimos de espacio físico, alta eficiencia, bajo requerimiento de energia 230 V. trifásico para equipos de aerosión y 230 V. tilonofásico para equipos de bombeo de sólidos en este caso se tienen 2 bombas de sólidos para alimentación del sistema, mismo que servirán para darie el espacio necesario de activación al sistema.

Objetivos:

Generat

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a lograr bajos niveles de contaminación del recurso hidrico en el área de influencia, proveyendo ja las instalaciones que alberga el complejo deportivo de la Finca La Aurora, zona 13 de la ciudad de Guatemala. un siste na de tratamiento adecuado de aguas residuales.

Especificos:

- -Obtener una alta calidad del agua residual tratada, disminuyendo en un 85% la demanda biológica de oxigeno (D.\$.O.). de acuerdo a los mínimos exigidos en la legislación vigente, especialmente con el Acuerdo Gubernativo No. 236-2006. Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos.
- ·Evitar la contaminación y degradación del suelo circundante, en especial las áreas verdes que se encuentran dentro del complejo deportivo completo y las áreas circundantes al mismo.

 -Disminuir los índices deimorbilidad en la población en el área de influencia.

Resultados esperados:

Beneficiarios:

Tipificacion de la población :

Caracterización de la población por EDAD:

Hombres:

Mujeres:

Menores de 4 años

De 5 a 13 años

De 14 a 18 años

De 19 a 28 años

De 29 a 50 años

De 51 a 60 años

De 61 en ådelante

Clasificación por ETNIA Clasificación por ZONA

s/mapSbaleta2020

Pag. 3 de 13

Segeplán	FINCA L	ONSTRUC	CION SISTEM	A DE TRATAM	Publica -SINIP- IENTO AGUAS RI I, DOMO POLIDEP Dyecto	Fecha Entisión Hera ESIDUALES PORTIVO.	
osto/efici anela. Empteo a requestr:	Calificada No calificada	221.00	TIR: Purante la ejecurité en horming/mes , 6 10	0.00 %	VAN: uranteria operation en injuris ylmes:	0.00	
Situación del terreno: Diseños (especificacione: Vida útil del proyecto: Fecha de onicio de la oper	ación:	s	20 aftos I-MAR-22	DEPORTIVA AUTO:	noma de Guatemal	A	
sto anual de opera	REMUNER	RACIONES SERVICIOS			240,638 C 28,020 C	2uetzsi 4 \$	
	MATERIA	ES Y SUMINI	STROS		59.478 C	Fan cesidos	
	MATERIA	es y sumini	STROS		59,478 C		
	MATERIA	es y sumini	STROS		59,478		
	MATERIA	ēs y sumini	STROS		59,478 C		



Fecha Emision

03 46 PM

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA GENERAL GENER

SNIPgt

Información Técnica AJUSTADA:

Duración del proyecto: Inicio

10/10/2013

Finalización .

30/09/2022

Duración 1

108 meses

Meta GLOBAL del proyecto

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AG

19.55 Metro cuadrado

Costo TOTAL del proyecto Q

844,883.87

Metas ANUALES del proyecto:

2.013	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	Metro cuadrado	17.69	60
_\015	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	Metro cuadrado	19.55	66
2.010	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	Metro cuatrado	19.55	00
5.011	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	Metro cuadrado	19.55	90
2.018	CONSTRUCCION SISTEMA DE THATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	Metra quadrazo	19.65	123
2.019	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	Metro cuatrado	19.55	60
2 020	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	Metro cuagrado	14-55	2.69
2.021	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	Metro cuadrado	18:55	72.22
2.022	PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	Documento	1.00	100.00

Programación FISICA Multianual

	United the second of	ericalities ericalities
2,013		
Ser painters	m,	163
Serveria de bombeo y obras.	Metro	60
Estructoras de tratamiento.	in.	327
Microspento de negras	40.7	186
2,015		
Esti schure nodega pro guardian a	Articula de mad	2
Estructuras de tratamiento	Metro	777
Obra extendri, complementand	Metra	108
Mosmoento de tierras	275	194
castema de bombeo y obras.	Articulo imple	5
Maccelimetral	Metra	433
2,016		
Minippermetral	Metro	433
herema de bombea y obras	Articula limpre	5
Estructura bodego y/o guardiama	Art due de mad	2
Estricitures de tratamiento	Metro	777
Obia exterior y complementana	Metro	108
Movemento de Lercas	7.015	194
2.017		
Exhibitura podega vio guardiania	Atticula de mad	2
Situaturas de tratamiento	Metra	7.7.7

Fag Libert



Fecha Emision

29/09/202. 03.46 414

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMA A GUATEMA GENERAL DE PROYECTO

SNIPgt

Objected a complementaria	Metro	108
Maximum to territor	(9) "	194
Minus pentiletra	Metro	433
Sizema de francisio a acres	Articula impie	5
2,018		
Music personalities	fdetro	433
Alexandre patients	701	194
Submode turnion - cura	Amoula limple	- 5
Estudia appropriate guied and	Amount do mind	2
Anthological Spiritistant conto	Metro	77.7
Fits extend on this neotice	Aletro	108
2,019		
Editorial of the Section of the Sect	Mayo	807
Louisia em parte dos	m³	194
The graph of gettings.	Metro	433
Especturary by presuments	Metro	7.7.7
Espectara discreta y comparte a cua	Astroneo de mad	2
Setema de pointies y obras	Articulo Impre-	5
2,020		
Cara extend a compositive tards	Metro	108
Movements de Longs	int/	194
Reservation	Metro	433
Estiticitation de line en orbito	Metro	777
Salema de Cardina - Abras	Articula Impre	8
fishio tida biotega inici panglaria.	Articula de med	2
2,021		
Estructura dibaloga y o poerdisco-	Articula de met	2
Movementa de femas	m'	154
Estructurias de transporto	Merra	777
Territorius de Comitante y (421/35	Aparata electri	62
Lt., a parameter	Metro	433
Totale authorize outcomption resubgrate	Motro	100
2,022		
Residence of Lancette (Co. 19 Cr.)	Documento	1
war I is always a		

Programación FISICA Mensual

2.013

Exemple as the nation care.

2986

Pag 6 de 13



Fecha Emisión: Hora:

29/09/2022 03.46 PM

0138372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMAL

	•	1								
		1								
		1								
Movimiento de Cerres									166	
	2,015	Į.								
Muro perimetral	2,000	ļ			337	25				
Movimiento de tierras		į	150	3	41					
Sistemo de bombeo y obr		1				5				
Estructures do tratamiente			117	647	7	6				
Estructure badage yio gus			2							
Otra extenor y comptome						108				
	2,016	1								
Muro perevetral		1				337	98			
Móvemento do tierros		1		150	3	41				
Sistema de bombeo y obr		İ					5			
Eskuduras de tratemiente		i		117	647	7	6			
Estructura bodaga y/o gus		1		2						
Obre exterior y compleme		1					109			
	2,017									
Mura perimetral						337	98			
Movemento de terras		1		150	3	41				
S-stema do bombeo y obr		İ					5			
Catructuras de tratamiente		į		117	647	7	6			
Estructura bodega y/o gui		!								
Chra exterior y compleme		F								
Co Common y Competition		1					108			
	2,018						108		•••	A a
Muro perimetral	2,018								337	95
lituro perimetral Novembrato de tienas	2,018		v v 2 may 1	·		p.g	150	. 3	337 41	
tiuro perimetral Movemiento de tierras Sistema de bombeo y etic	2,018	* / · • · • ·		·			150	•	41	\$
Mare perimetral Maremiento de tierras Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente	2,018	• , . •	v v s sus ·==	·	•		150	. 3 647		
Maro perimetral Moremiento de tierras Sistema de bombeo y ebc Estructuras de tratumiente Estructura bodega yto gus	2,018	* * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -		······································	· 		150	•	41	\$ 4
Mare perimetral Maremiento de tierras Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente		* , , * . •.			•		150	•	41	\$
Maro perimetral Moremiento de tientes Sistema de bombes y ebc. Estructuras de tratamiente Estructuras bodega yto gua Obra exterior y completto	2,018	P / · P · 41					150	•	41 7	\$ 4
Moremento de tienas Sistema de bembeo y ebc. Estructuras de tratumiente Estructura bedega y/o gua Obra exterior y complema		• / · • · · · · · ·		······································			150 117 2	647	41 7 237	\$ 4
Moremento de tienas Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente Estructura bodega y/o gua Obra exterior y complema Muro perimental Movimiento da barras		• / - • - #1					150	•	41 7	\$ 4 105
Movemento de tienas Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente Estructura bodega y/o gus Obra exterior y complema Movemento da tiamas Sistema de bombeo y ebr.		* / · * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>			117 2	647 3	41 7 237	\$ 9 100 99
Movemental Movementa de tierras Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente Estructura bodega y/o gur Obra exterior y comploma Movemento da tierras Sistema de bombeo y ebr. Estructuras de tratamiento		* / / * · 4		<u> </u>			150 117 2 160	647	41 7 337 41	\$ 9 108 89
Movemento de tienas Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente Estructura bodega y/o gua Obra exterior y complema Movemento da tiamas Sistema de bombeo y ebr. Estructuras de tratamiente Gisiructuras de tratamiente		• • . • .		<u> </u>			117 2	647 3	41 7 337 41	\$ 9 108 89
Movemental Movementa de tierras Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente Estructura bodega y/o gur Obra exterior y comploma Movemento da tierras Sistema de bombeo y ebr. Estructuras de tratamiento	2,019	• • . •		<u> </u>			150 117 2 160	647 3	41 7 337 41	\$ 4 105 89 \$
Movemento de tienas Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente Estructura bodega y/o gua Obra exterior y complema Movemento da tiamas Sistema de bombeo y ebr. Estructuras de tratamiente Gisiructuras de tratamiente		• • • •					150 117 2 160	647 3	41 7 337 41	\$ 4 105 89 \$
Movements de tienas Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente Estructura bodega y/o gur Obra exterior y complema Movimiento da tientes Sistema de bombeo y ebr. Estructuras de tratamientes Estructuras de tratamientes	2,019	• • • •					150 117 2 160	647 3	41 7 337 41 7	\$ 9 105 \$ 9 6 108
Movemento de tierras Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de testamiente Estructura bodega y/o gus Obra exterior y complema Movimiento da tiarras Sistema de bombeo y ebr. Estructuras de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras codega y/o gua Clana cintartor y compleme	2,019						150 117 2 160 117 2	647 3 647	41 7 397 41 7	\$ 9 105 \$9 \$ 6 108
Movemento de tienas Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente Estructura bodega y/o gur Obra exterior y complema Movimiento da tientes Sistema de bombeo y ebr. Estructuras de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras codega y/o gua Chea onterior y compleme Muno perimetral Movimiento de tientes	2,019						150 117 2 160 117 2	647 3 647	41 7 397 41 7	\$ 9 105 \$9 \$ 6 108 96
Maremental Maremental de tierras Sistema de tierras Sistema de temas Sistema de temanient Estructuras de tratamient Estructura bodega y/o gus Obra exterior y completto Movimiento da tiarras Sistema de bombeo y obr. Estructuras de tratamient Estructura bodega y/o gus Vistema de bombeo y obr. Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient	2,019	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		·			150 117 2 160 117 2	647 3 647	397 41 7	\$ 9 100 \$ 9 6 100 \$ 9 6 5 6 6
Maremental Marementa de tienas Sistema de bombeo y ebc. Estructuras de tratamiente Estructura bodega yto gua Obra exterior y complettra Mare perimetral Merimiento da tratas Sistema de bombeo y ebr. Estructuras de tratamiente Estructura bodega y lo gua Obra exterior y complettra Maremental Maremental Maremental Maremental de tratamiente Estructuras de tratamiente Estructuras de barmbeo y obr. Estructuras de tratamiente	2,019 2,020		-				150 117 2 160 117 2	647 3 647	397 41 7	\$ 9 100 \$ 9 6 100 \$ 96 5 5
Maremental Maremental de tierras Sistema de tierras Sistema de temas Sistema de temanient Estructuras de tratamient Estructura bodega y/o gus Obra exterior y completto Movimiento da tiarras Sistema de bombeo y obr. Estructuras de tratamient Estructura bodega y/o gus Vistema de bombeo y obr. Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient Estructuras de tratamient	2,019						150 117 2 160 117 2	647 3 647	397 41 7	\$ 9 105 \$ 9 \$ 6 108 \$ 96 \$ 5 6



Fecha Emision

28/09/2022 03:46 PM

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA GENERAL GENERAL DE PROVECTO

SNIPgt

Estudos policinados Absorberto de ferros Estrados de relación Soveres do trantes y ass

Obra extensi i zomstein-

2,022

Información FINANCIERA del Proyecto:

RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

		Manager at London	disense in a mark		
	223 164 95	223,282 01	199,359.94	89 29	100 00%
221	204 716 46	600,000.00	301,473 12	50.25	98 22%
	754 360 60	150 000 00	150,000.00	100.03	2.65%
2515	754 950 60	00	00		.00%
out to	754 300 66	00	50	00	00%
. 1	544 883 57	00	00	:00	00%
6.11	844 883 87	50	00		.00%
5015	844 883 67	00	00	120	100%
	148 112 25	0.0	00	90	.00%

.00% Avance Financiero: Fuente de Ejecutado Solicitado Desembolsado Monto Financiamiento 2013 2013 Vigente MINEIN TOTAL 1501 Recursos internos 1200 Communication 401 Aprile number Editor appropria 44 Solicitado AsignadoDestendodos lo Ejecutado Otras frientes:

Avence Financiero: .00%
Fuento de Financiamiente 2015 Monto Desembolsado Ejecutado Vigonte MINFIN 2015

TOTAL: Assault
Recursos Internos : Assault
Communicati

Pag 8 de 13




Fecha Emision

9:09:2022 03:46 PM

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA Información General del Proyecto

SNIPgt

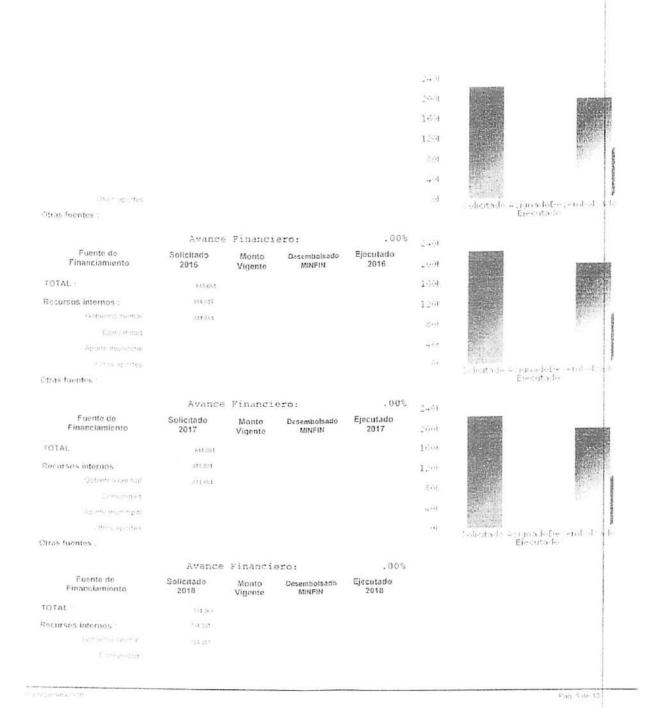



- - - - qrt-setar i

Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-

ecna Emision Hora 29/09/2001 03:46 PM

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO. GUATEMALA. GUATEMATOrmación General del Proyecto

SNIPgt

				2001 2001 1000 1200 300	
				2004 1604 1208 304	
				1504 1205 508	
				1266 501	
				391	
					2000 PM
					(B)(B)(C)(S)
				- 1 E	
				98	
					Johatado Esperadolestem Ejecutado
Avance	Financie	iro:	.00%	No. of Contract	
Solicitado	Monto	Desembolsado	Ejecutado		
2019	Vigente	MINF)N	2019		
75.1.26				1698	
754 167				1200	
15.4 (0.1				301	
				401	
				08.	
					Solicitado AsignadoDessen Ejecutado
Avance	Financie	ero:	100.00%	e e or	
Solicitado	Monto	Desembolsado	Ejecutado		
2020	Vigente	MINFIN	2020		
754-163	160 (c)		150 000	1601	
254.001	156-(43)		150.000	1204	
15.1.15.1	150,000		150,000	56%	
				-e-(d)	
				100	Solicitado - signiadofessem Ejecutado
•			F.0. 250		
2021	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	2021		
WAT 1764	600 000		101.114		
1144-116	160,600		501.473		
30172%	500 (9%)		301.474		
	Avance Solicitade 2019 Avance Solicitade 2020 Avance Solicitade 2021	Avance Financie Solicitado Vigente Avance Financie Solicitado Vigente Avance Financie Solicitado Monto Vigente Avance Financie Solicitado Monto Vigente Avance Financie Solicitado Monto Vigente Solicitado Monto Vigente Avance Financie Solicitado Monto Vigente Avance Financie Solicitado Monto Vigente Avance Financie Solicitado Monto Vigente	Avance Financiero: Solicitado Monto Desembolsado MINFIN 154 164 154 165 155 165 155 1	Avance Financiero: 100.00% Ejecutado 2019	Solicitado Monto Desembolsado Ejecutado 2009 2006

Pag 10 de 43



Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-

Fecha Emisión Hora

9/09/2022 13:46 PM

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMAL

SNIPgt




	Avance	Financie	ro:	89.49%	24-1		310
Fuento de Financiamiento	Solicitado 2022	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2022	2001		
TOTAL:	223,542	225,222		109.809	100		
Recursos internos :	223 162	22.1,782		196 319	129		
Consumo central		223,787		199,155	Sel		1
Cro. undisa							and the same of th
Appete description					41.4	12	1
Chos apartes	271.792				01	olicitado esigna	later entel 1
Orns tuentes						Electi	t vile

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

ornegicaleta, coo

		1000	110	Eq.	Julia				1
	2013								
TOTAL							256 057	756 037	250
Recauses entories.							256 007	256.037	982
275, 2719, 4719, 9									
Carry of all									
April 10 per per per per per per per per per per									
Office apported							266.037	256.007	29
Otras frentes									
	2015								
TEXTAL.			166 925	186 817	221 (4)	205 994			
Fesursas internas			188 975	188,817	321146	265 994			
General control			158.925	188 217	221 -45	265 994			
775 (64) (144)									

 1	1								i.		
_									<u> </u>		
_									Ì		
 											
									1		
_							A 1445		Fecha Emis	fón:	29/09/2022
				Nacional de					} #	ora:	03:46 PM
-			CONSTRUC	CION SISTEMA A 7 AVENIDA FI	DE TRATA	MIENTO 13. DOM	AGUAS POMBI	RESIDU EPORTII	ALES 70.		i
_	Sapeptor	GUATEMAI	LA, GUATE	incormación G	eneral del	Provesto			[]	81	KIPgt .
<u>(- , </u>								_			
											
(2 7)											
• • •									l		
-	ļ										
(Per											
[
	}										
<u> </u>	_										
_	Otros epoctos Otras functos:										
		016									
	TOTAL	710	•			224 440	265,894				
	Recursos Internos			186,92 158,92		221,148 221,148	265,594				
	Gabusto control .			185,92		221,148	265,894	:			
-	Communicad .										
l 1	Aporto municipal ·										•
	Otro sportes .	·									
_	Otras functor:										
	20	017									
	TOTAL			186,92	8 188,817	221,148	205.984				
	Recursos internos			168,92		221,148	265,994				
—	Goberno consel ·			158,92	5 188,817	221,148	265,994	· • · ·	· -··-		
	Contunited										
	Aposta trasscripti Otras apostos										
	Olres fuentes:									*****	
	į.	018									
—	TOTAL	F - T					141,219	183,468	199,703	249,936	
, lead	Recursos internos						141,219	163,466	189,708	249,936	
	Galmana consei						141,218	163,498	199,708	249,936	
(Comunidad							j		•	
-	Aporto menungal			•							
	Otro) apenes]			
P	Otras frantés:							1			
)1 9									
	TOTAL						141,218	163,498	199,768	249,938	
	Recursos insursos Gobieno central .						141,219	163,498	199,708	249,938	
	Comunicae :						141,219	183,495	199,708	249,938	
	scrpagibolota2020									Pag. 12 de 13	
- -								Į	,		-
]			000010
											000019
	ľ							l			

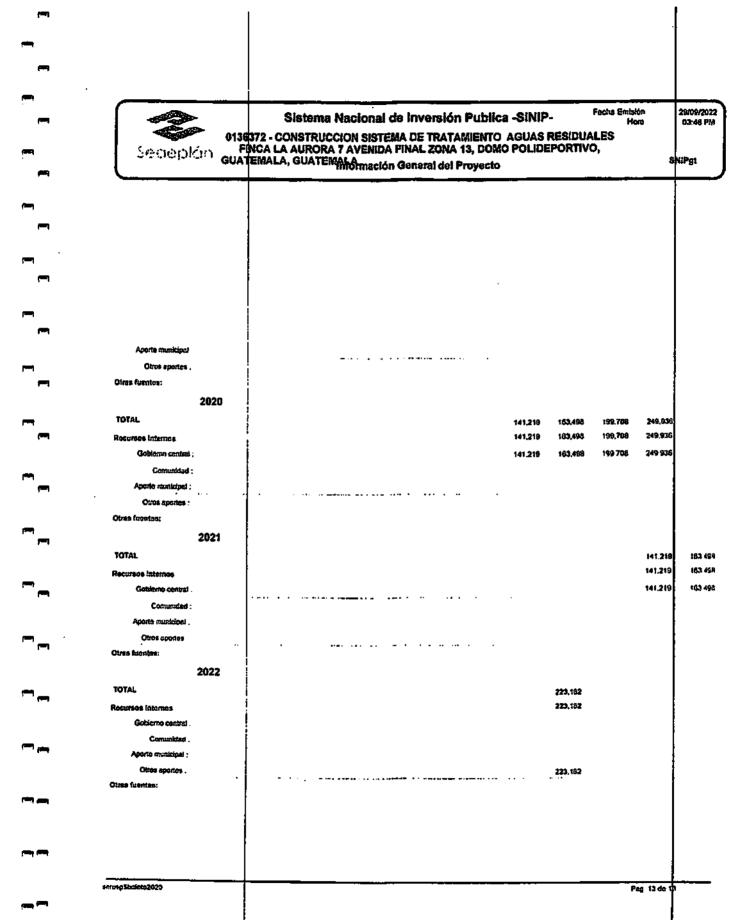

\$0002**0**



Fecha Emisión: Hove

22/09/2022 10'43 AM

seaeolán.

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13 GUATEMAI GORIATEI ALS OCTO

SHIPBE

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto:

Forma Capital File

CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA

institución responsable:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora responsable:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación

Planifición Institucional

Modalidad especifica:

Planificación Institucional

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES Sub-función anterior :

Finalidad-Función-Division:

9 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION 1 - SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

CULTURA Y DEPORTES

1 - SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación geográfica:

GUATEMAN A

Área de influencia:

Departamental

Responsables

Responsable del proyecto:

Formulador del provecto:

Noorbee:

Licenciado Luis Nester Madrid González

Mornbre² ARCASA/Arquitecto Sergio Guillen Gamas

Carao: Gerente General

Cargo: Consultor Externo

Taláfono 6412 5121

24127500 Telefono:

arcasa128@hotmail.com Ernait:

Emañ: arcess126@hotmail.com

Modelidad de ejecucion del Proyecto: CONTRATO

DIAGNÓSTICO:

Antecedentes:

El Taekwondo es un deporte para todas las personas, sin distinción de sexo ni edad. Es un arte marcial en el que se practica

la técnica y el entrenamiento del cuerpo y la mente. El maestro Yon Duck Kim introdujo el Taakwondo en Guaternata, quien en el aflo de 1959 llega a Guaternata en un intercambio de postgrado à la Universidad de San Carlos de Guatemate, se inscribió en la Facultad de Humanidades y algunos muchachos universitarios le solicitaron impartiera clases de Taekwondo. Al tiempo muchos muchachos solicitaron los servicios de Yon Duck Kim como instructor de Taelovondo.

También se crea el club de Taekwondo bajo la dirección general del profesor Kim, Marco Antonio Peña Gutiérrez como secretario general, además de una sección en la Fuerza Aérea de Guatemaia presidida por el señor Julio Rafael Peña.

La Escuela Chang Mu Kwan, en 1971 brinda su primera exhibición al público en INTERFER, donde se hicieron prasentes los cinturones corintos Marco Antonio Peria y Juan Carlos Peria, en diciembre de ese mismo año brindaron otra exhibición en el Club Luz y Fuerza de la Empresa Eléctrica, en 1973 es fundado un nuevo gimnasio con el nombre de Dragón Azul, un año más tarde el 31 de Octubre de 1974 surge el Gimnasio Úlsan, propulsor de este arte, bajo la dirección de los Profesores Juan Carlos Peña Leal y Marco Antonio Peña Gutiérrez, por lo que ya para ese año se brindaba mayor oportunidad a todos los

desensos de conocer este arte marcial. El año de 1981 se constituye la Fraternidad Guatemalteca de Taekwondo ITF, con la asociación de diversos departementos de 1981 se constituye la Fraternidad Guatemalteca de Taekwondo ITF, con la asociación de diversos departementos de 1981 se constituye la Fraternidad Guatemala, ante el incremento masiro de de la República de Guatemala y un conglomerado de gimnasios en la Ciudad de Guatemala, ante el incremento masivo de sus exponentes y practicantes del Arte Marcial de Taekwondo.

Se constituye como ente legal y única entidad representativa del Taekwondo ITF en Guatemala al clorgéraele su personelidad jurídica y reconccimiento de la junta directiva regidora, bajo el lema FIELES A NUESTRO ORIGEN Y POR LA UNIFICAÇIÓN

samegSbalata2020

Pon. 1 do 13

3 0 (Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP- 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, AVENIDA 7-10 ZONA 13 INCIMITATION CONTROL DE TAEKWONDO,	Facha Emisión: Hora: 7A.
	į	
DEL T	AEKWONDO	
Problem:	itica / Arbol del Problema:	
Efecto	ndirectos	
Efecte	3 Directos	

PROBLEMA CENTRAL:

Causes indirectes

Causas Directas

ALTÉRNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01 :

TIR :

.00

VAN:

CAE:

itemativa 02 :

VAN:

CAE:

Attemativa 03 :

VAN:

CAE:

Justificación:

El Taekwondo es una disciplina deportiva que se practica popularmente en todo el departamento de Gustemala,sin contar con instalaciones propias adecuadas para su desarrollo, por lo que la Federación Nacional de Taekwondo de Gustemala ha solicitado la ayuda a diferentes instituciones, especialmente a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). ente lector del deporte federado, el proyecto de construcción de los gimnasios e instalaciones debortivas para la práctica de este deporte, esi como las instalaciones y oficinas administrativas para el buen funcionamiento de la propia Federación. La ejecución de este proyecto tiene su justificación legal basada en la tegislación nacional, específicamente en:

La Constitución Politica de la República de Guatemala establece que la educación tiene como fini el desarrollo integral de la persona humana y determina que es obligación del Estado procurar el más completo bienestar fisico, mental y social.

La Ley Nacional para el desarrollo de la Cultura física y el Deporte en su artículo 3 indica que:

-Todo individuo tiene derecho a la práctica de la educación física, la recreación física y el deporte.

·La eflucación física, la recreación física y el deporte, son derechos de la comunidad cuyo ejercició no tiene más limitaciones que las impuestas por la moral, la salud pública y el orden legal.

-Es obligación del Estado, la promoción y fomento de la educación física, la recreación física y el deporte, como factor importante de desarrollo humano, por lo que deben ser favorecidos y asistidos en forma apropiada por los fondos públicos. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es el ente rector del deporte federado, y tiene entre sus atribuciones

(según decreto 76-97 Ley del deporte): -Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el país y la participación del deporte federado fuera

del mismo. -Velaf porque el deporte se porque el deporte se practique conforme a las reglas internacionales.

Descripțion AJUSTADA:

consiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de Taelavondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) 3 áreas de compate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inedoro para personas con capacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna, (d) servicios sanitarios para hombres que incluyen 1 inodoro para personas con capacidades especiales, un inodoro, 3 unhales, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y especiales, 4 lavamanos, 3 duchas, 4 lavamanos, 3 duchas, 4 lavamanos, 3 duchas, 4 lavamanos, 4 lavamano ductas, vestidores y sauna, (e) un área de limpieza con una pila, (f) una caseta para el control del audio de las instalaciones, (g) un área médica que incluye clínica y enfarmeria, (i) un área de espera y recepción, (j) módulo de gradas, (k) servicio sanitario para la recepción, (l) guardianía con servicio sanitario, (m) sala de reuniones, (n)

sampso Ehorem 2020

Pag. 2 do 13

22/08/2022

10:43 AM

SNIPat

		<u> </u>
	Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-	22/09/202 10.43 A
Segeplán ADM AVENI	0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS NISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. DA 7-10 ZONA 13 _{INTOTRIENT} A <u>GUATEMALA</u> GUATEMALA SI	#Pgt
presidencia, de gerencia auditoria, (t) oficina pari inodoros y 2 lavamanos, (y) equipamiento conside de seguridad, rotulación la suma de Q.6,803,332 presupuesto adjuntos.	presidencia con servicios sanitarios, (o) oficina de la gerencia, (p) área para la asister y sata de espera, (q) área técnica con recepción, (r) oficina de administración, (s) oficia de ila dirección técnica, (u) oficina de contraloría, (v) servicios sanitarios para mujeres (w) servicios sanitarios para hombres con un inodoro, un urinal y 2 lavamanos, (x) co tente en equipo de bombeo, inatalaciones telefónicas, para internet, de aire acondici y de sonido, y (z) traslado de colector pluvial. El presupuesto total del proyecto asciudi, para detalles ver planos, especificaciones técnicas de materiales y constructoroyecto relacionado es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemaia (CDAG).	con 2 cineta, onado, ende a ción y
Objetivos: General:		
incrementar la cobertu de Taekwondo de insta	a del deporte Taekwondo a nivel deparlamental y nacional, proveyendo a la Federación N aciones deportivas y administrativas y adecuadas.	aclonal
Especificos:		
departamental, naciona -Control de los recurs instalaciones tanto den	os económicos de la Federación Nacional de Taekwondo y evitar el pago de alquite rtivas como administrativas. ciente sobre los deportistas dedicados al Taekwondo, con la construcción de la infraesto	es de
Resultados esperados:		
Beneficiarios :		
Tipificacion de la poblad		
Caracterización de la pol	lacion per EDAD : Hombres : Mujeres :	
Menores	de 4 años	
De 5 a 1		
De 14 a		
De 19 a 2		
De 29 a 5	·	
De 51 a 6 De 61 ex	adelante	
Clasificación por ETNIA Clasificación por ZONA		

0.CO %

TIR:

Duranto la ejecución en hombre/mes

14

Legatizado

S1

733.00

Calificada No calificada VAN:

Durente la operación en hombretmes

19

0.00

Costo/eficiencia:

Empleo a requerir:

Situación del terreno:

srzpsg\$boleta2020

Diseños (especificaciones):

2000

Peg 3 de 1

_		1		
_		İ		
_				
		Fecha Emisión:	22/09/2022	
••••	Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-	Hora:	10:43 AM	
-	O138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO AVENIDA 7-10 ZONA 13 HOMENTON GENERAL GUA TEMPLO PECTO	7A.	SNIPgt	
~	This is a second of the second	 		
(j				
—				
لجا				
_				
_				
(-1				
	Vide utili del proyecto: 20 effet Feche de Inicio de la operación: 02-JAN-22			
—	Institución responsabla de operación: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA			
- -1	Costo anual de operación:			
 1	REMUNERACIONES 1,086,386 Quetzate BIENES Y SERVICIOS 41,600 Quetzate MATERIALES Y SUMINISTROS 58,809 Quetzate	s		
	MATERIALES Y SUMINISTROS 58,809 Queizans	•		

(—)				
<u> </u>				
(FE)				
_				
, ileni				
لتعنأ (يميرا				
-				
			•	
Less (CC)				
	spegSpoteta20C0	Pag. (4 do 13	
, ·				
_			000024	Ą
			000024	Ť



Fecha Emision Flora 10.43 AM

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13 INDIMENAL GUATEMALA GUATEMALA.

SN) Pgt

Información Técnica AJUSTADA:

Duración del proyecto. Inicio

01/08/2013

Finalización

30/09/2022 Duracion

110 mesei

Meta GLOBAL del proyecto:

CONSTRUCCION EDIFICIO

17,752.72 Metro cuadrado

Costo TOTAL del proyecto Q

6.803,332.01

Metas ANUALES del proyecto:

	TO SECURE A SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION OF THE	BORREST PROPERTY OF THE	ter en	
2.013	CONSTRUCCION EDIFICIO	Metro cuadrado	1,570.00	0.0
2.015	CONSTRUCCION EDIFICIO	Метго синатако	17 757 72	0/1
2.014	CONSTRUCCION EDIFICIO	Metro cusorado	17762.72	0.0
2017	CONSTRUCCION EDIFICIG	Metro cuadrado	17.792.72	O.O.
2019	CONSTRUCCION EDIFICIO	Metro cuadrado	17 752 72	0.0
2019	CONSTRUCCION EDIFICIO	Metro cuadrado	1.7 752 72	3.07
7.073	CONSTRUCCION EDIFICIO	Metro cundrado	17 75/2 2	12.51
2.021	CONSTRUCCION EDIFICIO	Metro cuadrato	17 752 72	28.50
2 022	PROCESO DE PEGEPCION Y LIQUIDACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO	Documento	1.00	100.00

Programación FISICA Multianual

email Shided A 70.20

-			-
2	- [и	3
**	,~	٠,	v

Estructuras (incluye mercas - techas yla- encantingen entra)	1614	3 460
Consetacion	011014	327
Acutosars	292.5	3 3 1 6
instalació ses interior edificio	2005	Ď
Publish contacted	mi*	181
Search Joseph Externs	Documento	
Transce profesorance	Merron	654
2,015		
Estructuras (moloye moros i techos vio encartinamiento)	m*	6.006
1 Internation	Metto	348
Acabados	10.4	6.951
earthrolones ordered addition	Metro	684
tradages preteninares	m ²	4,795
Filedisa was being	Articulo de met	105
2.016		
Estructures involve militals, fector y/o exceptionamental	₩.	3.003
Cigno-stated:	Metro	340
frataxist prefinances.	205.7	4.795
2,017		
Fundas a varianas	Arricula de met	106
estable one someone entire of	Metro	384
barracturas inchige inutos i tecnos vio incaminamiento)	m ²	6,006
Tractagos pregimenanas	mt	4.795
Acatoses		

Pag Lide 13



Fecha Emisión

22/09/2022 10:43 AM

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13 INFORMETION GENERAL

SNIPgt

	Mr. e.	6.951
Service City	Mitte	348
2,018		
Acatauris	(2)*	6,951
Cementacion	Metro	345
Test and professional	m ^a	4,795
Postote s velicina -	Affician do niel	106
Established orders with the	15910	854
Entradoras do tiga en pras de pras y os Granden acodoto.	m²	5,005
2,019		
Contagns asset to the	111	4.795
- ACO 47 44 44 M 144	Mento	665
structures include minus secretarity	mi	6,006
errenne estretute Instruktoria finiteian estrene	Meno	887
Atlatisation	1914	6 951
Pagetas y southern	Articulo de met	106
Estipamento	Approxis electri	723
2,020		
Campativione	Metro	787
Fill attent	1714	7 039
Fig. supervised	Aparato electri	708
is an againg and some	417.	2 302
Puteties comptons:	Articulo de met	106
His United the Control of the Contro	Metro	848
Estructur is de trave income decreas y/o organismi income	. 20%	3.749
2.021		
Sical adrey	166	10,368
the spiriture and to	Appende electo	963
Laboration de Augentier de Personal de Per	10.5	3.781
astaucenie unteres editrie	Mero	1 320
Programs y venturing	Articulo de met	126
1000		
2,022		

2,013

Agrij Haretar (2)

Pag 6 de 15

1.658

Segepló	ADMI AVENII	01389	20 - COI	NSTRUC	CON EDI	versión FICIO DE CIÓN NA WATEM	GIMNASI	-SINIP- OYOFIC DE TAEKY	INAS	Fecha Emisi Ho 7A.	er s	12/0: 10.4
				·				<u></u>		-		
Trabajos profinsinaras								654				١
Puertos y ventanos		İ										
Supervisión externa		1										
Installaciones (interior edil		į								2	2	
Aczbados	2,015									3,500	3,461	
Cimentación		İ				124	174			3.500	9,401	
Trabajos prefiminares		<u> </u>				4,795	114					1
Instalaciones (Interior edif		ĺ				4,110			200	300	384	1
Puerias y ventanas		į							•	*	103	
Estructures (Incluyo muro:						1,001	1,00t	1.001	1,001	1.001	1 501	ı
	2,016	1										l
Acabedos		l										l
Comentación		ŀ						174	174			ı
Viehajos prelimineros		1					2,396	2.397				1
instalaciones (mierior edif		ĺ										ı
Publis y ventarias		ļ								4.001		
Estructures (incluye munts	2 647	1								1,001	1,001	ŀ
Acabados	2,017	i									3,951	
Comentación		174	174									l
Trahejos preliminares	4.795	1		#		1-14						
Instalacionna (Interior edil									284	200	200	ŀ
Puntos y ventanas		1									40	
Estructures (incluye mune:]		858	858	658	858	859	858	858		
	2,018	Ī										
Acetados		!									1,951	
Cimentación		174	174									
Verbajos pretiminaros	4.795	 							404	200	200	
Instalaciones (interior edif Puertas y ventanas		1							284	200	40	
Estructures (Incluyo muror		į		858	650	656	858	858	858	850		1
,,	2,019			***************************************			***					ĺ
Trabajos prelimbranos	4,795											
Chrentopion		174	174									
Estructuros (incluyo murqu				659	85B	658	858	658	858	858		
Installationes (Interfer edil									284	200	200	
Acabedos Puertas y ventanas	ļ										3.951 40	
Ecopaniento											~	
-	2,020											ŀ
Acstedos	773	773	773	772	772	772	772	772	772			
Simentación	74	74	74	74	74	74	74	74	74			
Equipamiento	79	79	78	78	79	70	79	79	70			



Fecha Emision Horn 22/09/2022 10:43 AM

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13 INTOMECIÓN GENETAL CIPATO PECO

SNIPgt

Donago percenta es	28-5		260	265	266	266	267	267	267
Telepiscopes intermedia		97	20	1/2	92	92	52	9.3	0.8
Freshes y verticus.		3.2	12	12	12	12	12	12	123
Established outline made	6.000	601	601	661	501	601	651	691	0.01
	2,021								
mittale kill to	9.04	994	0.54	994	694	595	955		
leq-spanisons:	27	96	69:	99	9.9	99	100		
ene tay, seethman	3.8	31	2.1	24	22				
Patakapanes Biterus est				207	207	767	207		
4 to 2 years regarded in the	576	6.74	576	577					
	2,022								

freezione y della com-

Información FINANCIERA del Proyecto:

RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

		THE PROPERTY OF	Era viji sare koja s		
	1 244 533 97	1,350,488.58	1,350,488,58	100 00	100 00%
	3.797.847.29	3 010,558 28	2 480 132 83	62.50	08.53%
-02	5 117 305 69	4 440 977.68	1.405.482.14	11.65	22514
415.0	5 672 627 36	5 533 928 57	1 105 765 71	20.00	6.07%
2010	9 872 C27 36	0.0	0.0		0012
244	5 803 337 01	043	do		00%
(20.50)	3.439.591.07	0.0	0.0	32	93%
200	5 407 237 31	00	200	90	100%
\$6±1	4 941 699 16	GØ.	93	0.0	00%
			6 346 389 26		

	Avance	Financi	ero:	.00%	1,600		
Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Monto Vigente	Desembolando MINFIN	Ejecutado 2013	1,-00		TONORNOUS
		00.04000000			1,2001		
TOTAL:	1/21/500				1.0004		NEW YEAR
Recursos internos	1011404				56.64		
GOLDEN C. CONTON							1000
12.0% Ind51					+001		
					2500	1000	ž
Drive application	1-11-19				17.5	filestada Adiena John	e sembolsodo
Otras fuentes .						Solicitado AsigmadoCe Ejecutado	

	Avance	.00%		
Fuente de Financiamiento	Solicitado 2015	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2015
TOTAL	6.60(1.0)			
Recursos internos	v-91 (L)			

Pag Bule 15




Fecha Emisión Hero

18/89/2000 18/40 AM

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13 INDUATEMAN GENEVAL GENEVA DE PARA DE CONTRA DE C

SNIPH

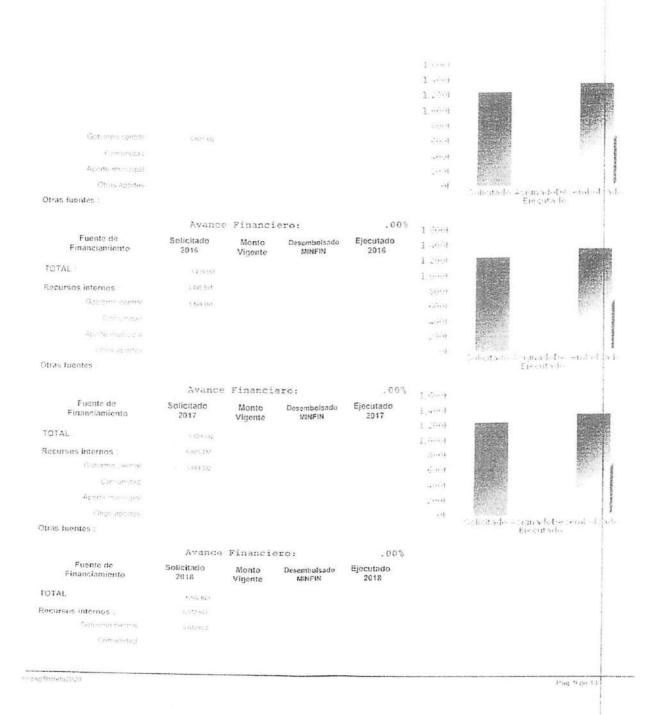

Fecha Emisión Hora 22/09/70/22 10/43 AM

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13 INDIATEMALO GUATEMALO PECTO

-10 MENON

SNIPgt

					1,400)	
					1 600	Managemen
					1.100	
					1.0004	
					3000	
					5001	
Agripite incides por					2004	
two aggress					*:F_	Culturado Aciona dofres emitrado
Otras frientes						Colicitado Asignado Decembol Cado Electrado
BERTON WATER COUNTY	4 000000000000000000000000000000000000	and the second of	Also see to the	20.00%		
		Financie		Ejocutado	1 95 94	
Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Monto Vigento	Desembolsado MINFIN	2019	1	100000000000000000000000000000000000000
		350000		1.106,786	1.200	
TOTAL:	6/07/06/7	6,533,575		1 (0) 105	1, desired.	
Recursos internos .	$\partial_{\mu} L \cdot \partial_{\mu} = \int_{-\pi}^{\pi} d^{2} \zeta \cdot \zeta^{\mu} d^{\mu} d^{\mu}$	5,533,529			3000	
Geographic Centers	6412397	7.23.664		1.100.785		
Contra 400					41119	
Aparte man draf					11/6/1	
Consultation and Consultation of the Consultat					44).	Solicitade Augnadoljecembelt ale
Diras fuentes						Elecutado
	Avance	Financie	ro:	31.65%	1.500	
Fuente de	Solicitado	Monto	Desembolsado	Ejecutado	1,4000	
Financiamiento	2020	Vigente	MINFIN	2020	1,200%	Excesses 1
TOTAL:	% \$37.7%	4.440 (11		1 (0), (0)	1,6604	
Recursos internos	5.517.00+	4.410.510		1.03.102	840,0	
Gebruie control	5.151(0)	4.517.512		13/5/10	10001	40年
Composited					4500	
Var. die night in 19					290)	
Others epicaties					*.*	Sokotado 4 ranadofes embolado
Otras fuelities .						Eje-otado
	Avance	Financie	ro:	82.58%		
Fuento de Financiamiento	Solicitado 2021	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2021		
TOTAL	1.4.40	31410.550		2.1(4, 132		
Recursos internos	1,0004	3.050-558		22/6 (1)		
16.5 ct - 1988		1/026/5/3		4,450,411		
330000000000000000000000000000000000000						

Pag. 19 de 13



Commentat Commentat Aporte municipal


Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-

Fecha Emisian

10 41 411

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13 INGUATEMAL & GUATEMALO, ecto

SNIPgt

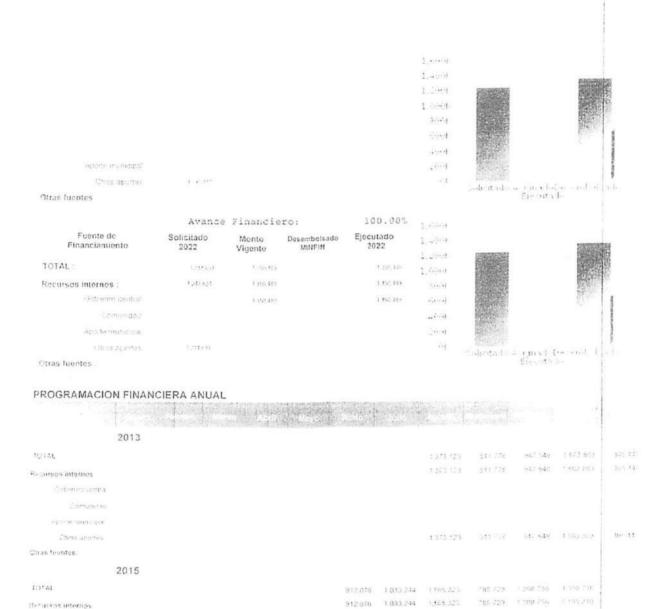

segeplá	Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP- 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO AVENIDA 7-10 ZONA 13 GUATEMA GUATEMA GUATEMA GUATEMA GUATEMA G								SANE	Fecha Emisión: 22:08/20 Hore: 10:43 A , 7A. SNIPgt		
									į			
Otrod aportes :												
Olras fuentos												
TOTAL	2016						626,966	281,422	484,392	545,170	1,088,065	493,57
Recursos Internos							626,965	281,422	484,392	545,170	1.068,085	493.5
Gobierno cerevel							826,966	281,422	484,392	545,170	1,058,085	493.5
Comunicad -												
Aporto municipal .									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Circs aportes Circs fugatos												
	2017											
YOTAL '	634,168	247,160	474,468	547 557	1,120,199	484,772	372,475	387,350	433,434	916,928	490.698	711.10
Recursos Internos	634,188	247,160	474,488	542,557	1,128,189	484,772	372,476	387,350	433,434	916,926	490,598	711,1
Gottiered central .	634.158	247,180	474,488	642,657	1,129,199	484,772	372,475	387,350	433,434	916.926	490,698	711 10
Comunidad .												
Aporto municipal -												
Otros aportes												
Otras fuentas	2019								- 1			
TOTAL	2018 623 228	238,217	463,644	631 615	1,117,257	473,830	381,533	358,408	422,492	205,984	479,754	700,18
lecursos internos	623 226	236,217	463,544		1,117,257	473,830	381,633	358,408	422,492	905,984	479,754	700,16
Gober to central	623,226	238,217	483,544		1,117,257	473,830	381,533	358,408	422,492	935 9B4	479.754	700,16
Committed												
Aporto municipal :												
Ocras apones												
Otros fuentos	2019											
TOTAL	623,226	238,217	463,544	<u> </u>	1.117.257	473,830	361,533	356,408	422,492	805,884	479,754	700,18
locursos (nicrnos	623,226	236,217	483,544		1,117,257	473,830	361,533	356,408	422,492	905,984	479 754	700 16
Gobierto central	623,226	238,217	453,544		1,117,257	473,830	361,533	356,408	422,492	805,964	479 754	700, 16
Comunidad									- 1			

Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP- Peche Emaleira 141,920 - CONSTRUCCION ENFICICO DE GIMMASIO Y OFICINAS 104,514 10						_							
Agorto municipal . Otros apontes : Citras fuentes: 2020 TOTAL		•	S	istema	Nacion	al de In	versión	Publica	a -SINIF)_			
Aporto numicipal . Citres plantes: Citres function: 2020 TOTAL 646,831 508,780 550,163 980,168 723,800 458,788 905,771 494,977 Commenced internor Commenced: Aporto municipal : Commenced: Aporto municipal : Citres pontes: Citres function: 2021 TOTAL 457,449 615,322 641,204 590,595 572,775 657,773 343,729 Citres function: Commenced: Aporto municipal : Commenced: Commenced: Aporto municipal : Commenced: Commenced: Aporto municipal : Commenced: Aporto municipal : Commenced: Aporto municipal : Commenced: Aporto municipal : Commenced: Aporto municipal : Commenced: Aporto municipal : Commenced: Aporto municipal : Commenced: Aporto municipal : Commenced: Aporto municipal : Commenced: Commenced: Commenced: Commenced: Commenced: Commenced: Commenced: Commenced: Aporto municipal : Commenced: Commenced: Aporto municipal : Commenced: Commenced: Commenced: Aporto municipal : Commenced:		- ADM	01389	20 - CON	STRUCC	NON EDI	FICIO DE	GIMNASI	O Y OF	CINAS	, 7Å.		
Otros sportes : Citras fuentes: 2020 TOTAL) seciebic	OF AVEN	DA 7-10	ZONA 1	TAUR.			hoyecto	VE TAER	.,,,,,,,,,	, ,,,,	8	NiPgi
Otros sportes : Citras fuentes: 2020 TOTAL		-											
Otros sportes : Citras fuentes: 2020 TOTAL													
Otros sportes : Citras fuentes: 2020 TOTAL													
Otros sportes : Citras fuentes: 2020 TOTAL													
Otros sportes : Citras fuentes: 2020 TOTAL													
Otros sportes : Citras fuentes: 2020 TOTAL		į											
Citres Aportes Citres Chantles 2020												İ	
Otros sportes : Citras fuentes: 2020 TOTAL													
Otros aportes : Citras fuentes: 2020 TOTAL	Aporto municipal ,						*** -4. * ** *4						
### TOTAL 648,831 508,780 550,103 580,169 723,800 458,788 505,771 484,077 Recurses intermos													
TOTAL 66.6.31 508.780 550,163 680,158 723,800 458,783 905,771 494,077 Recurses intermae 548,831 568,780 550,103 960,158 723,800 458,789 905,771 494,077 Goldenne central 548,831 568,780 850,103 960,158 723,800 458,789 605,771 494,077 Comunicad : Aponte municipal : Oliva sparters Civas sparters Civas fuentase: Comunicad : Aponte municipal : Aponte municipal : Aponte muni	Ciras fuentes:												
Recurses intermos	TOTAL	2020								474 497		ļ	
Gobierne central Comunidad : Aponte municipal : Otres apontes : 2021 TOTAL			_	-	-								
Aponto nunicipal: Otres fuentes: 2021 TOTAL 457.449 615,322 841,204 509,595 572,775 657,773 343,729 Recursos internos 457.449 615,322 841,204 509,595 572,775 657,773 343,729 Gebienno central: Comunicipal: Aponto municipal: Otros sportes: 457,449 615,322 641,204 509,595 572,775 657,773 343,729 Otros fuentes: 2022 TOTAL 1,244,634 Recursos Internos 611,244,634 Recursos Internos 611,244,634 Aponto municipal: Comunicidal: Aponto municipal: Comunicidal: Aponto municipal: Comunicidal: Aponto municipal: Comunicidal: Aponto municipal: Comunicidal: Aponto municipal: Cotros sportes: 1,244,634	-				-				605.771	464.077			
Otres functes: 2021 TOTAL 457,449 515,322 841,204 509,59\$ 572,775 657,773 343,729 Recursos internos 457,449 615,322 841,204 509,59\$ 572,775 657,773 343,729 Gobiento contral: Communicipal: Otros aportes: 457,449 615,322 641,204 509,59\$ 572,775 657,773 343,729 Otras fuentos: 2022 TOTAL 1,244,634 Rocursos internos Gobiento contral: Comunicipal: Comunicipal: Comunicipal: Comunicipal: Comunicipal: Comunicipal: Comunicipal: Comunicipal: Comunicipal: Aponto managal. Otros sportes: 1,244,634	Comunidad:												
Cores fuentes:	_												
### TOTAL													
TOTAL 457,449 615,322 841,304 509,595 572,775 657,773 343,729 Recursos internos 457,449 615,322 841,204 509,595 572,775 657,773 343,729 Getiatro central: Comunidad: Aponte municipal: Otros sportes: 457,449 615,322 641,204 609,595 572,775 657,773 343,729 Otros fuentos: 2022 TOTAL Recursos internos Gobierno central: Comunidad: Aponte menicipal: Otros sportes: 1,244,634		2021										ľ	
Recursos Internos 457,449 615,322 641,204 509,595 572,775 657,773 343,729	TOTAL		615.322	841,204	509.595	572.776	667.773	343,729				ŀ	
Comunidad : Aporte municipal : Otros aportes : 457,449 616,322 641,294 609,695 672,775 657,773 343,729 Otros fuentos: 2022 TOTAL 1,244,634 Recursors (internes 1,244,634 Gabitano central : Comunidad : Aporte mencupal . Otros aportes : 1,244,634	Recursos Internos	i	i					-					
Aporte municipal : Otros aportes : 457,449	Gobiemo central :	.,											
Otres sportes: 457,449 616,322 641,294 809,695 572,775 857,773 343,729 Otres fuentes: 2022 TOTAL 1,244,634 Recursos (internes Gobierno central : Comunidad : Aporte managel . Otres sportes : 1,244,634													
Otres fuentos: 2022 TOTAL 1,244,634 Recursos internos 1,244,634 Gobierno central : Comunidad : Aporte menacipal . Otros sportos : 1,244,634		457 449	415 323	A44 204	Ann dos	673 77S	857 773	343 729				ļ	
TOTAL 1,244,634 Recurses (internes 1,244,634 Gobierne central : Comunidad : Aporte managel . Otros sportes : 1,244,634	• • • •		* *****		943,000			.,, .,	, ,			- 1	
Recursos (nizmos 1,244,634 Gobierno central : Comunidad : Aporte mensopal . Otros sportes : 1,244,634		2022											
Gobiano central : Comunidad : Aponte manacapal , Otros spontes : 1,244,634	TOTAL									1,244,634		1	
Comunidad : Aporte managel . Otros aportos : 1,244,634										1,244,634			
Aporto managel . Otros sportos : 1,244,634												l	
tion of the second of the seco													
Ctras Recutes:			•							1,244.634			
l l	Cires fuentes:	ļ											
												·	
												l	
Peg. 13 do 3	erapsgSboleta2020										Pi	ig. 13 da (1





O-CDAG-SDI-072-2022 Guatemala, 05 de septiembre de 2022

Licenciada Luz Keila Gramajo Vílchez Secretaria Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN Presente.

10 OCT 2022

Estimada Licenciada Gramajo:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance físico y financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de septiembre 2022.

Cordialmente.

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez

Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda Marta Alicia Meighan de Aguilar Subgerente Financiera

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes Subgerente de Infraestructura

> Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González Gerente – CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412-7500 • www.cdag.com.gt

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAUSECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

10 OCT 2022

Hora: 11 19 Firma:
Registro Único de Expediente:

Copia



O-CDAG-SDI-073-2022 Guatemala, 05 de septiembre de 2022

Licenciado Edwin Martínez Cameros Ministro de Finanzas Públicas Presente

> Atención: Licenciada Marta María Ríos Gutiérrez Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Martinez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) Remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de septiembre 2022.

Cordialmente.

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez Subgerente de Desarrollo Institucional Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar

Subgerente Financiera

Arq. Oscar Raul Barrios Paredes Subgerente de Infraestructura

> Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González Gerente –CDAG-

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
