CDAG GUATEMALA

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS - Secretaría General - Centro de Atención al Usuario - Guatemala, C. A.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

SEGEPLAN RECEPCION 10 ENE 2019 HORA: 11:40 NOMBRE: Flor M.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

CDAG GUATEMALA Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CDAG GUATEMALA Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA DIRECTORA GESTION DE LA ESTRATEGIA

CDAG GUATEMALA Licda. Laura Elizabeth Melchor Arlleu
Directora de Gestión de la Estrategia
CDAG

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
SUBGERENTE FINANCIERO
CDAG

AVANCES A DICIEMBRE 2018

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA GERENCIA GUATEMALA, C. A.

Gerente en Funciones
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Tabla de contenido

Contenido

Introducción ____ 2

Marco Estratégico Institucional ____ 4

Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración ____ 5

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental ____ 6

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de diciembre 2018.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados para el presente ejercicio fiscal.

El presente informe está integrado por la siguiente de información:

Descripción	Unidad Responsable
Información de la planificación de los proyectos de Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas para el ejercicio fiscal 2018	Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional
Avance físico y financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en curso en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-.	Subgerencia de Infraestructura
Avance financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en Sistema Informático de Gestion	Subgerencia Financiera

Marco Estratégico Institucional

Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Visión

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

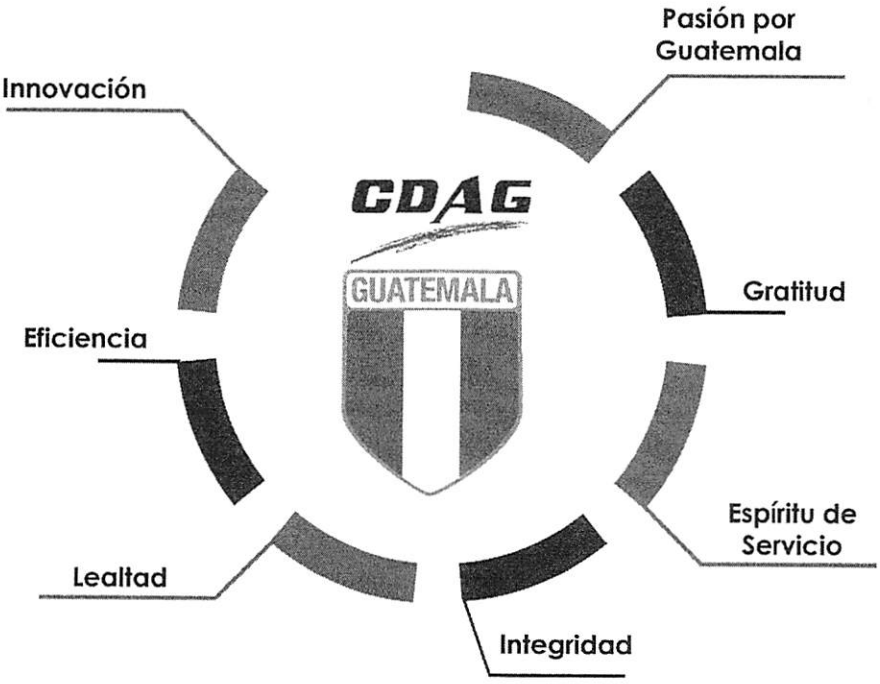

Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la Planificación Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2018:

PROYECTO	PRESUPUESTO PLANIFICADO POA 2018	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Piscina, Aldea Llano Grande, Quetzaltepeque, Chiquimula.	Q471,435.00	100.00%	100.00%
Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo de Boxeo, 4ª calle 25-40 zona 3, Complejo Deportivo de Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Q1,537,377.35	20.03%	20.00%
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Campo Numero 2 y Campo Numero 3 de la Asociación Nacional de Softbol, 3ª calle 17-04 zona 15 Colonia Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala.	Q1,281,785.71	100%	93.57%
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, 4ª. Calle 0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapán, Totonicapán.	Q 1,357,878.91	32.00%	20.00%
*Construcción de Edificio Instalaciones Deportivas y Oficinas Administrativas para la Asociación Nacional de Raquetbol 7 avenida 10-27 zona 13 Guatemala, Guatemala.	Q1,448,748.62	100%	23.74%

*El avance Físico y financiero del proyecto que se identifica con número de SNIP 51069 Construcción de Edificio Instalaciones Deportivas y Oficinas Administrativa de la Asociación Nacional de Raquetbol corresponde a lo registrado en el año 2016 en el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala aprobó la liquidación del proyecto mediante acuerdo 153/2018-CE-CDAG donde aprueba lo actuado por la Comisión Receptora y liquidadora del proyecto en oficio No. O-CDAG-1102-2018 donde se autoriza dar por finalizado el proyecto. (Ver reporte "Listado de Proyectos Finalizados" del Sistema Nacional de Inversión Pública)

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

Resumen del Proyecto

Proyecto: 190563

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN PISCINA, ALDEA LLANO GRANDE, QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division

Función anterior: CULTURA Y DEPORTES — 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

Sub-función anterior: ULTURA Y DEPORTES — 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

icación: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Departamento	Municipio
CHIQUIMULA	QUEZALTEPEQUE

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Néstor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones de la piscina ubicada en la Aldea Llano Grande, municipio de Quezaltepeque, con los siguientes elementos: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto reforzado, de 8.30 metros de longitud, con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) relleno controlado, (d) drenaje francés, (e) zampeado de piedra, y (f) cuneta e concreto reforzado.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2018	441,964.29	441,964.29	100.00%	100.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		441,964.29		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/10/2018 **Fecha de finalización** 30/11/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones de la piscina ubicada en la Aldea Llano Grande, municipio de Quezaltepeque, con los siguientes elementos: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto reforzado, de 8.30 metros de longitud, con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) relleno controlado, (d) drenaje francés, (e) zampeado de piedra, y (f) cuneta de concreto reforzado.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 100.00% al: 06/12/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 06-DEC-18
TOTAL :	528,002	441,964		441,964
Recursos internos :	528,002	441,964		441,964
Gobierno central :	528,002	441,964		441,964
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

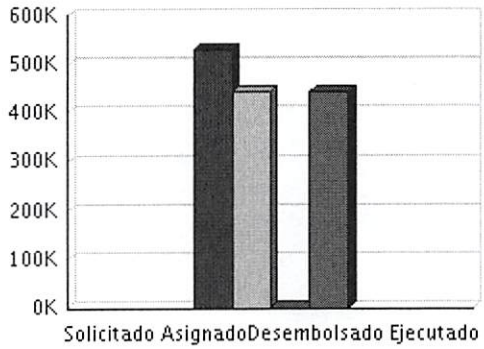

Seguimiento Físico

Avance fisico: 100.00% al: 25/09/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Trabajos preliminares	Metro	8	8
Adecuación del terreno	Metro	669	669
Circulación de areas	Metro	24	24
Instalaciones	Metro	16	16

Seguimiento Administrativo al: 29/11/2018

Problema(s):

El supervisor del proyecto, arquitecto Omar Galindo informó que el proyecto que se identifica con número de NOG 8233063 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN PISCINA, ALDEA LLANO GRANDE, QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA se encuentra recepcionado y liquidado según consta en las actas No. 58-SGI-CDAG y No. 59-2018-SGI-CDAG; dichos documentos fueron trasladados a la gerencia de la Institución.

Accion(es):

La gerencia de CDAG procede a presentar a Comité Ejecutivo las Actas de Recepción y Liquidación para su revisión y aprobación correspondiente. En espera de que Comité Ejecutivo apruebe la liquidación del proyecto, para proceder con la gestión interna de solicitar autorización a la gerencia de CDAG para reportar como finalizado el proyecto en el Módulo de Seguimiento.

Responsable: Autoridades de la Confederación, Comisión de Recepción y Liquidación, supervisor y contratista.

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

Resumen del Proyecto

Proyecto: 170435

Nombre: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad especifica: Ejercicio de identificación de proyectos

	Finalidad-Función-Division
Función anterior: CULTURA Y DEPORTES	9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES	1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
	1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.g

Descripción:

El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructura de concreto reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mampostería de block de 0.19 x 0.19 x 0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm², (d) cubierta de techos, consistente en estructura metálica de marcos de alma llena tipo I y cubierta de lámina termo acústica, (e) pisos de concreto, interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguas pluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h) acabados, puertas de metal y ventanería de PVC.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2018	1,473,214.29	294,642.86	20.00%	20.03%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2015	.00	.00	.00%	.00%
		294,642.86		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/07/2018 **Fecha de finalización** 30/11/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructura de concreto reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mampostería de block de 0.19 x 0.19 x 0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm², (d) cubierta de techos, consistente en estructura metálica de marcos de alma llena tipo I y cubierta de lámina termo acústica, (e) pisos de concreto, interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguas pluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h) acabados, puertas de metal y ventanería de PVC.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 20.00% al: 12/10/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 12-OCT-18
TOTAL :	1,721,863	1,473,214		294,643
Recursos internos :	1,721,863	1,473,214		294,643
Gobierno central :	1,721,863	1,473,214		294,643
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance fisico: 20.03% al: 31/12/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Trabajos preliminares	Metro	87	87
Circulación de areas	m²	1,829	251
Graderio y cubierta	m²	835	
Pavimentación	m²	750	21
Instalaciones	Metro	253	204
Equipo	Aparato electrico	19	

Seguimiento Administrativo al:

Problema(s): **Accion(es):**

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s): **Accion(es):**

Información complementaria:

Resumen del Proyecto

Proyecto: 167021

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SOFTBOL, 3A. CALLE 17-04 ZONA 15, COLONIA JARDINES DE MINERVA, GUATEMALA, GUATEMALA

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division

Función anterior: CULTURA Y DEPORTES — 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES — 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

Ubicación: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Departamento	Municipio
GUATEMALA	GUATEMALA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 6176674

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas de la Asociación Nacional de Softbol, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) colocación de 8 postes de concreto como torres de iluminación con sus respectivas lámparas para los campos números 2 y 3, con un área estimada de iluminación de 6,567.26 metros cuadrados, (c) construcción de una cabina de control de 2.00 m x 3.00 m, para albergar los equipos eléctricos, (d) construcción de una acometida eléctrica, (e) instalación del cableado y demás equipo para hacer funcionar las lámparas el equipo.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2018	1,281,785.71	1,199,318.79	93.57%	100.00%
2017	1,850,890.00	320,446.43	17.31%	.00%
2016	.00	.00	.00%	.00%
		1,519,765.22		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 03/03/2018 **Fecha de finalización** 13/04/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en: (a)rótulo de identifica-ción del proyecto(b)colocación de 8 postes de concreto(c)Cuarto de control(d)gestión acometi-da eléctrica(e)Alimentación hacia tablero de distribución f)bodega g)losa de techo h)Alimenta-ción desde tablero hacia sistema de control de encendido i)Instalación de lámparas en postes de concreto j)Flippón principal k)Panel de control a base de contactores y botoneras l)Instalación de banco trifásico de transformadores de 150KVA m)Bóveda de registro n)Red de tierras ñ)Alimentación hacia protección principal de 400 amperios en 208/120 voltios o)Alimentación de circuitos para torres del sistema de alumbrado en canchas No. 2 y No. 3 p)Unidad de tablero tipo centro de carga para protección de circuitos.
Para el proyecto que se identifica con número de registro SNIP 167021 el plazo original de terminación contractual se trasladó al 13 de marzo de 2018 según consta en acta No. 09-2018-SGI-CDAG luego en Acuerdo Número 47/2018-CE-CDAG en el artículo 2 aprueba la solicitud de aprobación de ampliación de 20 días hábiles de tiempo de ejecución del contrato, posteriormente el supervisor del proyecto en el Informe de Evaluación de la ejecución física y financiera del proyecto SNIP 167021 en expediente presentado a SEGEPLAN para su aprobación para el ejercicio fiscal 2018, en el folio 12 Modificación Ampliatoria Tiempo indica que: el tiempo modificado ampliatorio finaliza el 13 de abril 2018.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 93.57% al: 13/12/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 13-DEC-18
TOTAL :	1,264,511	1,281,786		1,199,319
Recursos internos :	1,264,511	1,281,786		1,199,319
Gobierno central :	1,264,511	1,281,786		1,199,319
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance fisico: 100.00% al: 04/06/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Area de deportes y recreación	m²	51	51
Instalaciones	Equipo electronico	121	121

Seguimiento Administrativo al: 30/11/2018

Problema(s):

El supervisor del proyecto Arquitecto Douglas José David Paredes Tórtola, supervisor del proyecto Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Campo Número 2 y Campo Número 3 de la Asociación nacional de Softbol, 3a. calle 17-04 zona 15, Colonia Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala mediante oficio 622-2018-SGI-DISUP-CDAG informó que el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de

Accion(es):

Se procederá a solicitar al gerente de la Confederación, que se autorice reportar como finalizado el proyecto en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública.

Guatemala aprobó lo actuado por la Comisión Receptora y Liquidadora, en consecuencia aprueba la Liquidación del proyecto, esto mediante Acuerdo Número 157/2018-CE-CDAG.

Responsable: Autoridades de la Confederación, Subgerencia de Infraestructura

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

Resumen del Proyecto

Proyecto: 190562

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA 2, PARAJE PARRAMÓN, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

	Finalidad-Función-Division
Función anterior: CULTURA Y DEPORTES	9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES	1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
	1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
TOTONICAPAN	TOTONICAPAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Néstor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de Totonicapán: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto ciclópeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) juntas de construcción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto reforzado.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2018	1,330,357.14	266,071.43	20.00%	32.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		266,071.43		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/08/2018 **Fecha de finalización** 30/11/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de Totonicapán: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto ciclópeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) juntas de construcción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto reforzado.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 20.00% al: 29/11/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 29-NOV-18
TOTAL :	1,520,824	1,330,357		266,071
Recursos internos :	1,520,824	1,330,357		266,071
Gobierno central :	1,520,824	1,330,357		266,071
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance fisico: 32.00% al: 04/01/19

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Trabajos preliminares	Metro	43	43
Adecuación del terreno	Metro	43	43
Circulación de areas	Metro	130	
Instalaciones	Metro	87	

Seguimiento Administrativo al: 29/11/2018

Problema(s):

El supervisor del proyecto Arq. Omar Galindo informó que el avance físico del proyecto que se identifica con NOG 7943059 es cero por ciento y que el proceso de acreditación del anticipo se encuentra en trámite en la unidad correspondiente de CDAG. Informa también que en lo que respecta a la parte física del proyecto, se le ha notificado al contratista el oficio NO. 607-2018-SGI-DISUP-CDAG con el fin de recordarle que en la supervisión que se ha realizado al proyecto, se ha verificado que el proyecto no presenta avance fisico y que la bitácora no se encuentra en la obra por lo que no se ha podido dejar constancia de dicha situación.

Accion(es):

El supervisor del proyecto espera que el contratista atienda las observaciones señaladas en el oficio No.607-2018-SGI-DISUP-CDAG.

Responsable: El contratista del proyecto, supervisor y autoridades administrativas de CDAG.

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

LISTADO DE PROYECTOS FINALIZADOS

(Quetzales)

Codigo	Proyecto	Ubicación	Función	Fase	Asignado Q.	Ejecutado Q.	Fecha inicio	Fecha	Grafica
Entidad: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA					0.00	451,251.38			
Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA					0.00	451,251.38			
0051069	CONSTRUCCION EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE RÁQUETBOL 7A. AVENIDA 10-27 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	CULTURA Y DEPORTES	EJECUCION	.00	451,251.38	02/01/16	14/08/16	Avance financiero 23.74% Avance físico 100.00% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
