SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 08 NOV 2018 HORA: 9:34 NOMBRE: Flor M.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Centro de Atención al Usuario Secretaría General

GUAG GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA DIRECTORA GESTION DE LA ESTRATEGIA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA GERENCIA GUATEMALA, C. A.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA C.D.A.G. SUB-GERENTE FINANCIERO

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA CDAG SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE GUATEMALA

AVANCES A OCTUBRE 2018

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de octubre 2018.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados para el presente ejercicio fiscal.

000002

El presente informe está integrado por la siguiente de información:

Descripción	Unidad Responsable
Información de la planificación de los proyectos de Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas para el ejercicio fiscal 2018	Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional
Avance físico y financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en curso en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-.	Subgerencia de Infraestructura
Avance financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en Sistema Informático de Gestion	Subgerencia Financiera

Marco Estratégico Institucional

Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Visión

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

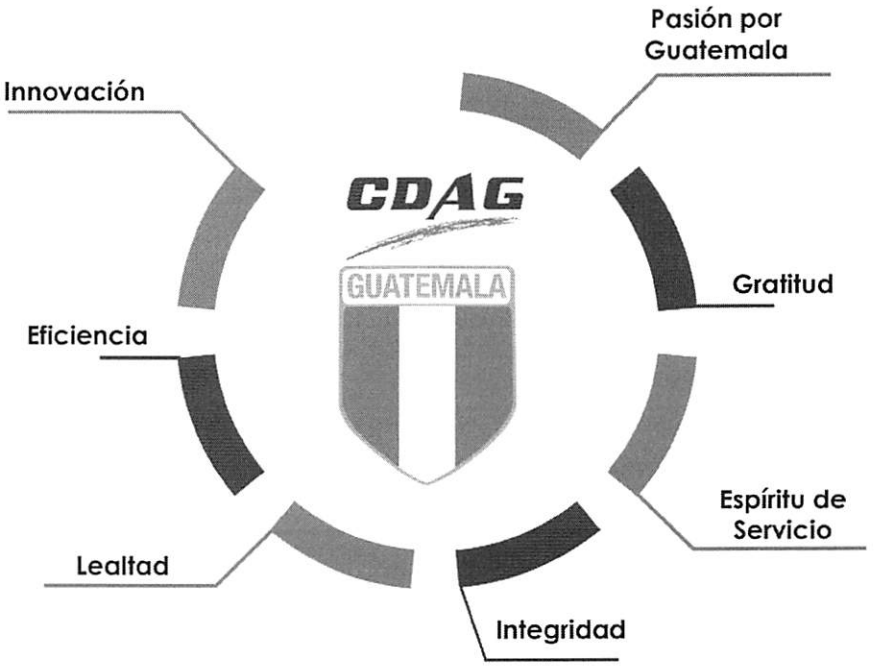

Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la Planificación Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2018:

PROYECTO	PRESUPUESTO PLANIFICADO POA 2018	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Piscina, Aldea Llano Grande, Quetzaltepeque, Chiquimula.	Q471,435.00	100%	20.00%
Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo de Boxeo, 4ª calle 25-40 zona 3, Complejo Deportivo de Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Q1,537,377.35	6.78%	20.00%
*Construcción de Edificio Instalaciones Deportivas y Oficinas Administrativas para la Asociación Nacional de Raquetbol 7 avenida 10-27 zona 13 Guatemala, Guatemala.	Q1,448,748.62	100%	23.74%
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Campo Numero 2 y Campo Numero 3 de la Asociación Nacional de Softbol, 3ª calle 17-04 zona 15 Colonia Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala.	Q1,281,785.71	100%	51.52%
**Mejoramiento instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, Calzada Ramiro de León Carpio Kilometro 1.80 carretera a Santa Lucia, Zacapa, Zacapa.	Q 79,852.83	100%	100%
***Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, 4ª. Calle 0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapán, Totonicapán.	Q 1,357,878.91	0%	0%

*El avance Físico y financiero del proyecto que se identifica con número de SNIP 51069 Construcción de Edificio Instalaciones Deportivas y Oficinas Administrativa de la Asociación Nacional de Raquetbol corresponde a lo registrado en el año 2016 en el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autonoma de Guatemala aprobó la liquidación del proyecto mediante acuerdo 153/2018-CE-CDAG en el cual se determina que la Confederación deberá requerir al contratista la cantidad de Q 1,579,285.14 (monto sin IVA)

**El proyecto de Mejoramiento Instalaciones Deportivas del Complejo Deportivo de Zacapa refleja en la Planificación Operativa Anual –POA- un monto de Q.79, 852.83 que corresponde únicamente al costo de materiales, este proyecto es ejecutado bajo la modalidad de ejecución por vía administrativa, el cual en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SINIP- incluye costos por materiales y mano de obra, se encuentra en fase de recepción y liquidación por lo que se encuentra pendiente el registro de finalización en Sistema Nacional de Inversión Pública.

*** El proyecto inicio su ejecución el 25/10/2018 por lo que no se registran avances físicos ni financieros.

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

Resumen del Proyecto

Proyecto: 190563

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN PISCINA, ALDEA LLANO GRANDE, QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division

Función anterior: CULTURA Y DEPORTES — 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES — 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
CHIQUIMULA	QUEZALTEPEQUE

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Néstor Madrid González

Cargo: Gerente

Teléfono: 2412-7500

Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones de la piscina ubicada en la Aldea Llano Grande, municipio de Quezaltepeque, con los siguientes elementos: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto reforzado, de 8.30 metros de longitud, con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) relleno controlado, (d) drenaje francés, (e) zampeado de piedra, y (f) cuneta de concreto reforzado.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2018	441,964.29	88,392.86	20.00%	100.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		88,392.86		

000007

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/10/2018 **Fecha de finalización** 30/11/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones de la piscina ubicada en la Aldea Llano Grande, municipio de Quezaltepeque, con los siguientes elementos: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto reforzado, de 8.30 metros de longitud, con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) relleno controlado, (d) drenaje francés, (e) zampeado de piedra, y (f) cuneta de concreto reforzado.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 20.00% al: 31/08/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 31-AUG-18
TOTAL :	528,002	441,964		88,393
Recursos internos :	528,002	441,964		88,393
Gobierno central :	528,002	441,964		88,393
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

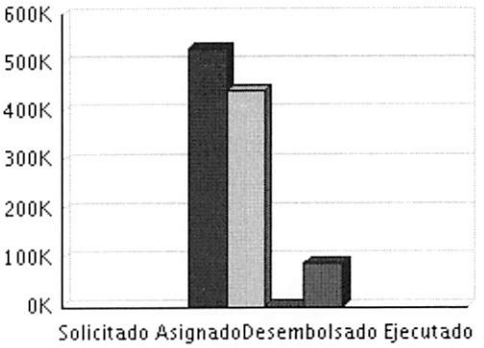

Seguimiento Físico

Avance fisico: 100.00% al: 25/09/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Trabajos preliminares	Metro	8	8
Adecuación del terreno	Metro	669	669
Circulación de areas	Metro	24	24
Instalaciones	Metro	16	16

Seguimiento Administrativo al: 31/10/2018

Problema(s):

. En el informe que presentó el Arq. Omar Galindo en el mes de septiembre, como supervisor del proyecto que se identifica con registro SNIP190563 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Piscina Aldea Llano Grande, Quezaltepeque, Chiquimula, indica que el avance físico del proyecto es 100 % y el financiero es 20 %. El arquitecto Galindo presentó el oficio sin número de fecha 15 de octubre de 2018 dirigido al Director de Supervisión, en el que informa de la finalización del proyecto a la vez presenta informe pormenorizado.

El director de supervisión presentó a la gerencia el oficio No. 527-2018-SGI-DISUP-CDAG con visto bueno del encargado del despacho de la Subgerencia de Infraestructura, en el que solicita el nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 55 de la Ley de

Accion(es):

La Comisión de Recepción y Liquidación dará inicio con el trabajo asignado.

000008

Contrataciones del Estado. Mediante oficio No. O-CDAG-G-1059-2018 el gerente de la Confederación nombra a los integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora.

Responsable: Comisión de Recepción y Liquidación, contratista y supervisor del proyecto.

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

000009

KARINA RODRIGUEZ.

Proyecto: 170435

Nombre: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación: Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad especifica: Ejercicio de identificación de proyectos

	Finalidad-Función-Division
Función anterior: CULTURA Y DEPORTES	9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES	1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
	1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO

Número de Operación de Guatecompras (NOGs):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González

Cargo: Gerente

Teléfono: 2412-7500

Email: cdag.com.g

Descripción:

El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructura de concreto reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mampostería de block de 0.19 x 0.19 x 0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm², (d) cubierta de techos, consistente en estructura metálica de marcos de alma llena tipo I y cubierta de lámina termo acústica, (e) pisos de concreto, interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguas pluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h) acabados, puertas de metal y ventanería de PVC.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2018	1,473,214.29	294,642.86	20.00%	6.78%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2015	.00	.00	.00%	.00%
		294,642.86		

000010

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/07/2018 Fecha de finalización 30/11/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructura de concreto reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mampostería de block de 0.19 x 0.19 x 0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm², (d) cubierta de techos, consistente en estructura metálica de marcos de alma llena tipo I y cubierta de lámina termo acústica, (e) pisos de concreto, interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguas pluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h) acabados, puertas de metal y ventanería de PVC.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 20.00% al: 12/10/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 12-OCT-18
TOTAL :	1,721,863	1,473,214		294,643
Recursos internos :	1,721,863	1,473,214		294,643
Gobierno central :	1,721,863	1,473,214		294,643
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

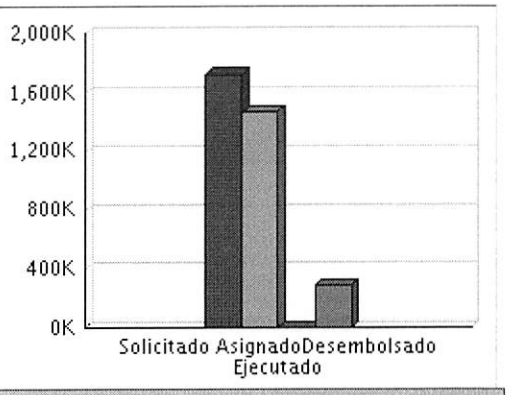

Seguimiento Físico

Avance físico: 6.78% al: 30/10/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Trabajos preliminares	Metro	87	87
Circulación de areas	m²	1,829	159
Graderio y cubierta	m²	835	
Pavimentación	m²	750	
Instalaciones	Metro	253	
Equipo	Aparato electrico	19	

Seguimiento Administrativo al:

Problema(s): Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s): Accion(es):

000011

Información complementaria:

000012 KARINA RODRIGUEZ

Resumen del Proyecto

Proyecto: 167021

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SOFTBOL, 3A. CALLE 17-04 ZONA 15, COLONIA JARDINES DE MINERVA, GUATEMALA, GUATEMALA

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division

Función anterior: CULTURA Y DEPORTES — 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES — 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
GUATEMALA	GUATEMALA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 6176674

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas de la Asociación Nacional de Softbol, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) colocación de 8 postes de concreto como torres de iluminación con sus respectivas lámparas para los campos números 2 y 3, con un área estimada de iluminación de 6,567.26 metros cuadrados, (c) construcción de una cabina de control de 2.00 m x 3.00 m, para albergar los equipos eléctricos, (d) construcción de una acometida eléctrica, (e) instalación del cableado y demás equipo para hacer funcionar las lámparas el equipo.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2018	1,281,785.71	660,406.79	51.52%	100.00%
2017	1,850,890.00	320,446.43	17.31%	.00%
2016	.00	.00	.00%	.00%
		980,853.22		

000013

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 03/03/2018 **Fecha de finalización** 13/04/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en: (a)rótulo de identifica-ción del proyecto(b)colocación de 8 postes de concreto(c)Cuarto de control(d)gestión acometi-da eléctrica(e)Alimentación hacia tablero de distribución f)bodega g)losa de techo h)Alimenta-ción desde tablero hacia sistema de control de encendido i)Instalación de lámparas en postes de concreto j)Flippón principal k)Panel de control a base de contactores y botoneras l)Instalación de banco trifásico de transformadores de 150KVA m)Bóveda de registro n)Red de tierras ñ)Alimentación hacia protección principal de 400 amperios en 208/120 voltios o)Alimentación de circuitos para torres del sistema de alumbrado en canchas No. 2 y No. 3 p)Unidad de tablero tipo centro de carga para protección de circuitos.

Para el proyecto que se identifica con número de registro SNIP 167021 el plazo original de terminación contractual se trasladó al 13 de marzo de 2018 según consta en acta No. 09-2018-SGI-CDAG luego en Acuerdo Número 47/2018-CE-CDAG en el artículo 2 aprueba la solicitud de aprobación de ampliación de 20 días hábiles de tiempo de ejecución del contrato, posteriormente el supervisor del proyecto en el Informe de Evaluación de la ejecución física y financiera del proyecto SNIP 167021 en expediente presentado a SEGEPLAN para su aprobación para el ejercicio fiscal 2018, en el folio 12 Modificación Ampliatoria Tiempo indica que: el tiempo modificado ampliatorio finaliza el 13 de abril 2018.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 51.52% al: 16/05/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 16-MAY-18
TOTAL :	1,264,511	1,281,786		660,407
Recursos internos :	1,264,511	1,281,786		660,407
Gobierno central :	1,264,511	1,281,786		660,407
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance fisico: 100.00% al: 04/06/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Area de deportes y recreación	m²	51	51
Instalaciones	Equipo electronico	121	121

Seguimiento Administrativo al: 30/10/2018

Problema(s):

Mediante oficio No. 550-2018-SGI-DISUP-CDAG de fecha 29 de octubre de 2018 el supervisor del proyecto Arquitecto Douglas José David Paredes Tórtola informa que la Comisión de Recepción y Liquidación presentó el acta de Liquidación No. 0016-2018-SGI-CDAG de fecha 05 de octubre de 2018. Dicha Comisión tambien presentó el oficio 003-JRYL-SOFTBOL de fecha 26 de octubre de 2018.

Accion(es):

En espera de que el Comité Ejecutivo de la Confederación apruebe la Liquidación del Proyecto presentada por la Comisión de Recepción y Liquidación; luego la Dirección de supervisión deberá solicitar la autorización de la gerencia para reportar como finalizado el proyecto en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información Nacional de Inversión Pública.

000014

Resumen del Proyecto

Responsable: Autoridades Administrativas de CDAG y Dirección de Supervisión

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

000015

KARINA RODRIGUEZ

Resumen del Proyecto

Proyecto: 190562

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA 2, PARAJE PARRAMÓN, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

	Finalidad-Función-Division
Función anterior: CULTURA Y DEPORTES	9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES	1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
	1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
TOTONICAPAN	TOTONICAPAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Néstor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de Totonicapán: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto ciclópeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) juntas de construcción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto reforzado.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2018	1,330,357.14	.00	.00%	.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		.00		

000016

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/08/2018 **Fecha de finalización** 30/11/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de Totonicapán: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto ciclópeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) juntas de construcción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto reforzado.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 30/10/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 30-OCT-18
TOTAL :	1,520,824	1,330,357		
Recursos internos :	1,520,824	1,330,357		
Gobierno central :	1,520,824	1,330,357		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance fisico: .00% al: 30/10/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	Artículo de metal	1	
Trabajos preliminares	Metro	43	
Adecuación del terreno	Metro	43	
Circulación de areas	Metro	130	
Instalaciones	Metro	87	

Seguimiento Administrativo al: 30/10/2018

Problema(s):

Mediante oficio No. 560-2018-SGI-DISUP-CDAG de fecha 30 de octubre de 2018 el supervisor del proyecto arquitecto Omar Galindo informa que el avance físico y financiero del proyecto que se identifica con NOG 7943059 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, 4a. calle 0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapán, Totonicapánes es de 0 por ciento ya que el 25 de octubre del año en curso dio inicio dicho proyecto.

Accion(es):

La obra dió inicio el 25 de octubre, por lo que se espera que para el mes de noviembre se reporte avance físico de la obra.

Responsable: Contratista y supervisor de la obra.

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

000017

Información complementaria:

000018

KARINA RODRIGUEZ
