MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Centro de Atención al Usuario -CAU-
Secretaría General
Guatemala, C. A.

CDAG
GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
RECEPCIÓN
10-12-2019

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA
CDAG
GUATEMALA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUBGERENTE FINANCIERO

CDAG
Licda. Laura Elizabeth Melchor Anleu
Directora de Gestión de la Estrategia
CDAG

CDAG
Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

AVANCES NOVIEMBRE 2019

Tabla de contenido

Contenido

Introducción ____ 2
Marco Estratégico Institucional ____ 4
Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración ____ 5
Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental ____ 6

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de noviembre 2019.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados para el presente ejercicio fiscal.

El presente informe está integrado por la siguiente de información:

Descripción	Unidad Responsable
Información de la planificación de los proyectos de Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas para el ejercicio fiscal 2019	Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional
Avance físico y financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en curso en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-.	Subgerencia de Infraestructura
Avance financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en Sistema Informático de Gestión	Subgerencia Financiera

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de noviembre 2019.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados para el presente ejercicio fiscal.

El presente informe está integrado por la siguiente de información:

Descripción	Unidad Responsable
Información de la planificación de los proyectos de Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas para el ejercicio fiscal 2019	Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional
Avance físico y financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en curso en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-.	Subgerencia de Infraestructura
Avance financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en Sistema Informático de Gestión	Subgerencia Financiera

Marco Estratégico Institucional

Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Visión

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la Planificación Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2019:

PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
*Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo de Boxeo, 4ª calle 25-40 zona 3, Complejo Deportivo de Quetzaltenango, Quetzaltenango.	100%	0%
*Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, 4ª. Calle 0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapán, Totonicapán.	100%	0%
**Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2ª. Avenida 6-89 Zona1, Barrio Agua Caliente, Salamá, Baja Verapaz.	99.14%	64.91%
***Construcción edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo.	5.80%	20%

Nota:

*Los proyectos de inversión citados, presentan avance físico por ser proyectos de arrastre del año 2018, mismos que para el 30 de noviembre de 2019 no presentaron ningun desembolso financiero correspondiente al ejercicio 2019, en virtud que los proyectos serán pagados al momento de concluir el proceso recepción y liquidación.

** El avance físico del proyecto de Salamá Baja Verapaz al 30 de noviembre no reflejó un avance del 100% debido a que se encuentran en fase de recepción de obra.

***El proyecto de Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo ya se encuentra habilitado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN- mismo que al 30 de noviembre 2019 refleja una ejecución física de 5.80%.

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 170435

Nombre: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad especifica: Ejercicio de identificación de proyectos

	Finalidad-Función-Division
Función anterior: CULTURA Y DEPORTES	9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES	1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
	1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 7334737

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.g

Descripción:

El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructura de concreto reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mampostería de block de 0.19 x 0.19 x 0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm², (d) cubierta de techos, consistente en estructura metálica de marcos de alma llena tipo I y cubierta de lámina termo acústica, (e) pisos de concreto, interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguas pluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h) acabados, puertas de metal y ventanería de PVC.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2019	1,234,231.45	.00	.00%	100.00%
2018	1,473,214.29	294,642.86	20.00%	20.03%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2015	.00	.00	.00%	.00%
		294,642.86		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2019 **Fecha de finalización** 14/02/2019

Descripción de la fase a financiar:

Consiste en concluír los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 192/2018.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 02/12/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 02-DEC-19
TOTAL :	1,320,000	1,234,231		
Recursos internos	1,320,000	1,234,231		
Gobierno central :	1,320,000	1,234,231		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

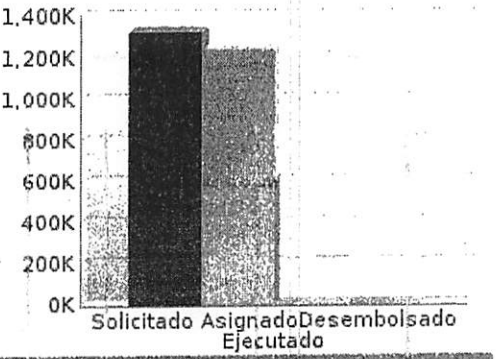

Seguimiento Fisico

Avance fisico: 100.00% al: 28/02/19

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Pavimentación	m²	729	729
Instalaciones	Metro	49	49
Circulación de areas	m²	1,577	1,577
Graderio y cubierta	m²	835	835
Equipo	Aparato electrico	19	19

Seguimiento Administrativo al: 02/12/2019

Problema(s):

En relación al proyecto que se identifica con número de registro SNIP 170435 Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo de Boxeo, 4a. calle 25-40 zona 3, Complejo Deportivo, Quetzaltenango, Quetzaltenango, el arquitecto Omar Galindo, mediante oficio No. 589-2019-SGI-DISUP-CDAG informa que con fecha 15 de octubre de 2019 el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala emitió acuerdo No. 126/2019-CE-CDAG, en el cual aprueba la liquidación del proyecto.

Accion(es):

En espera de que la Subgerencia Financiera de la Confederación, liquide financieramente el proyecto que se identifica con número de registro SNIP 170435, ya que al momento en el SINIP aparece que el avance financiero es de 0 por ciento.

Responsable: Dirección de Supervisión, Dirección de Gestión de Proyectos y Gerencia.

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 190562

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA 2, PARAJE PARRAMÓN, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

	Finalidad-Función-Division
Función anterior: CULTURA Y DEPORTES	9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES	1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
	1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
TOTONICAPAN	TOTONICAPAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 7943059

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Néstor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de Totonicapán: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto ciclópeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) juntas de construcción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto reforzado.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2019	1,061,304.99	.00	.00%	100.00%
2018	1,330,357.14	266,071.43	20.00%	32.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		266,071.43		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2019 Fecha de finalización 14/02/2019

Descripción de la fase a financiar:

Consiste en finalizar los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No.213/2018.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 02/12/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 02-DEC-19
TOTAL :	1,192,000	1,061,305		
Recursos internos :	1,192,000	1,061,305		
Gobierno central :	1,192,000	1,061,305		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

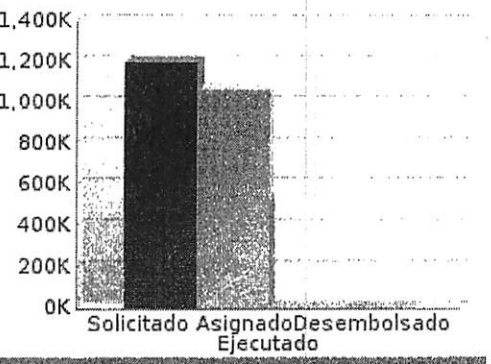

Seguimiento Fisico

Avance fisico: 100.00% al: 28/02/19

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Instalaciones	Metro	87	87
Circulación de areas	Metro	130	130

Seguimiento Administrativo al: 02/12/2019

Problema(s):

Sobre el proyecto que se identifica con número de registro SNIP 190562 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, 4a. calle 0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapán, Totonicapán, el supervisor, Arquitecto Omar Galindo, mediante oficio No.590-2019-SGI-SUP-CDAG informa que con fecha 30 de octubre der 2019 el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala emitió acuerdo No. 139/2019-CE-CDAG, en el cual se aprueba la liquidación del proyecto.

Accion(es):

En espera de que la Subgerencia financiera de la Confederación, liquide financieramente el proyecto que se identifica con número de registro SNIP 190562 ya que al momento en el SINIP aparece que el avance financiero es de 0 por ciento.

Responsable: Comisión de Recepción y Liquidación, supervisor del proyecto y autoridades administrativas de (

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 211117

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPORTIVA, 2A. AVENIDA 6-89 ZONA 1, BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

	Finalidad-Función-Division
Función anterior: CULTURA Y DEPORTES	9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES	1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
	1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
BAJA VERAPAZ	SALAMA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 8647542

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva de Salamá: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinete y de vigas existentes, (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva, (d) instalación de cubierta de techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lámina troquelada termo acústica con recubrimiento de aluzinc, (e) construcción de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una resistencia a la compresión de 100 kg/cm², y (f) instalación de un sistema de evacuación de aguas pluviales por medio de tubería PVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2019	1,339,285.71	869,297.52	64.91%	99.14%
2018	.00	.00	.00%	.00%
		869,297.52		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/07/2019 **Fecha de finalización** 30/11/2019

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva de Salamá: (a) rótulo de identificación del proyecto; (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinete y de vigas existentes; (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva; (d) instalación de cubierta de techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lámina troquelada termo acústica con recubrimiento de aluzinc; (e) construcción de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una resistencia a la compresión de 100 kg/cm²; y (f) instalación de un sistema de evacuación de aguas pluviales por medio de tubería PVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 64.91% al: 06/06/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 06-JUN-19
TOTAL :	1,347,654	1,339,286		869,298
Recursos internos :	1,347,654	1,339,286		869,298
Gobierno central :	1,347,654	1,339,286		869,298
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

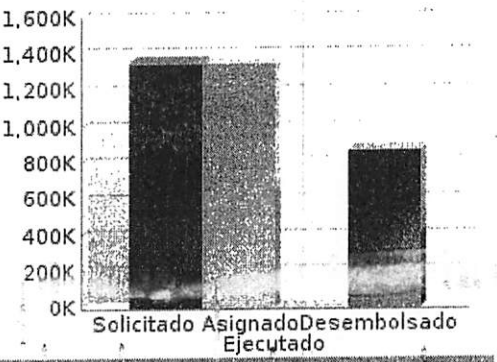

Seguimiento Físico

Avance fisico: 99.14% al: 31/05/19

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Instalaciones	Metro	630	616
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Trabajos preliminares	m²	1,237	1,237
Graderio y cubierta	m²	1,704	1,704
Circulación de areas	Artículo de metal	110	108
Limpieza y detalles finales	Artículo limpieza	1	1

Seguimiento Administrativo al: 30/11/2019

Problema(s):

El ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real, supervisor del proyecto que se identifica con número de registro SNIP 211117 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2ª avenida 6-89 zona 1, Barrio Agua Caliente, Salamá, Baja Verapaz mediante oficio No. 595-2019-SGI-DISUP-CDAG informa que: a) La Comisión Receptora y Liquidadora del proyecto suscribió el acta número 017-2019-SGI-CDAG, de fecha 8 de noviembre de 2019, y, b) El Licenciado Byron Leonardo Solórzano Gramajo, Gerente en Funciones de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, mediante el oficio número O-CDAG-G-988-2019 de fecha 12 de noviembre

Accion(es):

La Gerencia de la Confederación presentará al Comité Ejecutivo el acta de liquidación y sus ampliaciones para que dicho Comité proceda con base al Artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado.

de 2019 solicitó a dicha comisión que se pronunciara sobre el decremento realizado, así como sobre la información relacionada con el tiempo de ejecución de los trabajos; informa también que se está en espera de que la liquidación sea aprobada por la autoridad superior correspondiente.

Responsable: Gerencia y Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 138920

Nombre: CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

	Finalidad-Función-Division
Función anterior: CULTURA Y DEPORTES	9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES	1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
	1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
GUATEMALA	GUATEMALA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González
Cargo: Gerente General
Teléfono: 24127500
Email: arcasa128@hotmail.com

Descripción:

consiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) 3 áreas de combate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inodoro para personas con capacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna, (d) servicios sanitarios para hombres que incluyen 1 inodoro para personas con capacidades especiales, un inodoro, 3 urinales, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna, (e) un área de limpieza con una pila, (f) una caseta para el control del audio de las instalaciones, (g) un área médica que incluye clínica y enfermería, (i) un área de espera y recepción, (j) módulo de gradas, (k) servicio sanitario para la recepción, (l) guardianía con servicio sanitario, (m) sala de reuniones, (n) archivo, (ñ) área para la presidencia con servicios sanitarios, (o) oficina de la gerencia, (p) área para la asistencia de presidencia, de gerencia y sala de espera, (q) área técnica con recepción, (r) oficina de administración, (s) oficina de auditoría, (t) oficina para la dirección técnica, (u) oficina de contraloría, (v) servicios sanitarios para mujeres con 2 inodoros y 2 lavamanos, (w) servicios sanitarios para hombres con un inodoro, un urinal y 2 lavamanos, (x) cocineta, (y) equipamiento consistente en equipo de bombeo, instalaciones telefónicas, para internet, de aire acondicionado, de seguridad, rotulación y de sonido, y (z) traslado de colector pluvial. El presupuesto total del proyecto asciende a la suma de Q.6,803,332.01, para detalles ver planos, especificaciones técnicas de materiales y construcción y presupuesto adjuntos.
La unidad ejecutora del proyecto relacionado es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	5,533,928.57	1,106,785.71	20.00%	5.80%

2018	.00	.00	.00%	.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2016	.00	.00	.00%	.00%
2015	.00	.00	.00%	.00%
2013	.00	.00	.00%	.00%
		1,106,785.71		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 04/01/2019 Fecha de finalización 31/12/2019

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto; (b) 3 áreas de combate con piso de concreto; (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inodoro para personas con capacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna; (d) servicios sanitarios para hombres que incluyen 1 inodoro para personas con capacidades especiales, un inodoro, 3 urinales, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna; (e) un área de limpieza con una pila; (f) una caseta para el control del audio de las instalaciones; (g) un área médica que incluye clínica y enfermería; (i) un área de espera y recepción; (j) módulo de gradas; (k) servicio sanitario para la recepción; (l) guardianía con servicio sanitario; (m) sala de reuniones; (n) archivo; (ñ) área para la presidencia con servicios sanitarios; (o) oficina de la gerencia; (p) área para la asistencia de presidencia, de gerencia y sala de espera; (q) área técnica con recepción; (r) oficina de administración; (s) oficina de auditoría; (t) oficina para la dirección técnica; (u) oficina de contraloría; (v) servicios sanitarios para mujeres con 2 inodoros y 2 lavamanos; (w) servicios sanitarios para hombres con un inodoro, un urinal y 2 lavamanos; (x) cocineta; (y) equipamiento consistente en equipo de bombeo, instalaciones telefónicas, para internet, de aire acondicionado, de seguridad, rotulación y de sonido; y (z) traslado de colector pluvial.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 20.00% al: 14/11/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 14-NOV-19
TOTAL :	6,672,027	5,533,929		1,106,786
Recursos internos :	6,672,027	5,533,929		1,106,786
Gobierno central :	6,672,027	5,533,929		1,106,786
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

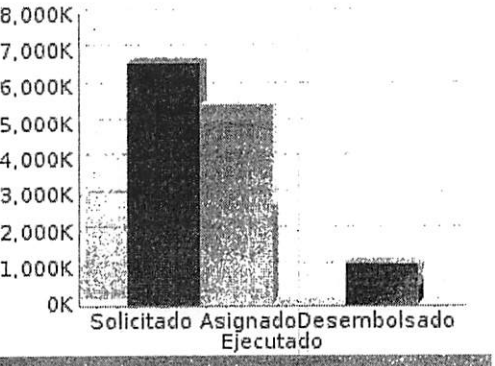

Seguimiento Fisico

Avance fisico: 5.80% al: 30/11/19

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Trabajos preliminares	m²	4,795	2,397
Cimentación	Metro	666	
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m²	6,006	516
Instalaciones (interior edificio)	Metro	887	
Acabados	m²	6,951	
Puertas y ventanas	Artículo de metal	106	
Equipamiento	Aparato electrico	723	2

Seguimiento Administrativo al: 30/11/2019

Problema(s):

El ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real, supervisor del proyecto que

Accion(es):

La Gerencia de la Confederación presentará al Comité Ejecutivo el acta de

se identifica con número de registro SNIP 211117 Mejoramiento instalaciones Deportivas y Recreativas Cambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2ª avenida 6-89 zona 1, Barrio Agua Caliente, Salamá, Baja Verapaz mediante oficio No. 595-2019-SGI-DISUP-CDAG informa que: a) La Comisión Receptora y liquidadora del proyecto suscribió el acta número 017-2019-SGI-CDAG, de fecha 8 de noviembre de 2019, y, b) El Licenciado Byron Leonardo Solórzano Gramajo, Gerente en Funciones de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, mediante el oficio número O-CDAG-G-988-2019 de fecha 12 de noviembre de 2019 solicitó a dicha comisión que se pronunciara sobre el decremento realizado, así como sobre la información relacionada con el tiempo de ejecución de los trabajos; informa también que se está en espera de que la liquidación sea aprobada por la autoridad superior correspondiente.

liquidación y sus ampliaciones para que dicho Comité proceda con base al Artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Responsable: Gerencia, Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

O-CDAG-SDI-085-2019
Guatemala, 10 de Diciembre de 2019

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimado Ingeniero Moir:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Pregsupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance físico y financiero de los proyectos de inversión de la Institución del mes de noviembre 2019.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

Arq. Oscar Raúl Barrios Pardes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Byron Leonardo Solórzano Gramajo
Gerente en Funciones –CDAG-

SEGEPLAN RECEPCION DE DOCUMENTOS
10 DIC 2019
HORA 13:00 NOMBRE

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-086-2019
Guatemala, 10 de Diciembre de 2019

2019-100824
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21
RECIBIDO
10 DIC 2019
Hora: 11:52 Firma:
Registro Único de Expediente:
ext. 12143 - 12144

Licenciado
Víctor Manuel Martínez Ruíz
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Atención:
Licenciado
Francisco Javier Ortiz Mendoza
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) Remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución del mes de noviembre 2019.

Cordialmente,

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
GUATEMALA

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

Vo.Bo. Lic. Byron Leonardo Solórzano Gramajo
Gerente en Funciones –CDAG-
