Copia

CDAG GUATEMALA

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
08 NOV 2022
HORA: 9:55 NOMBRE: Karla G.

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

Licda. Lesly Grijalva
Subgerencia de Desarrollo Institucional

Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Arq. Oscar Barrios
Subgerente de Infraestructura

Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente CDAG

AVANCES OCTUBRE 2022

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Centro de Atención al Usuario
Secretaría General
Guatemala, C. A.

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción ____ 2

Marco Estratégico Institucional ____ 4

Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración ____ 5

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental ____ 6

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de octubre 2022.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados para el presente ejercicio fiscal.

El presente informe está integrado por la siguiente de información:

Descripción	Unidad Responsable
Información de la planificación de los proyectos de Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas para el ejercicio fiscal 2022	Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional
Avance físico y financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en curso en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-.	Subgerencia de Infraestructura
Avance financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en Sistema Informático de Gestión	Subgerencia Financiera

Marco Estratégico Institucional

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

VALORES

000005

Planificación de Proyectos de Inversión

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la Planificación Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2022:

PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca La Aurora 7ª Avenida final zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala.	100%	100%
Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo, 7ª Avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala.	100%	100%

Nota:

El avance reflejado para los proyectos "Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca La Aurora 7ª Avenida final zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala" y para "Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo, 7ª Avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala" es correspondiente al ejercicio fiscal del presente año.

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
RECIBIDO
FIRMA: HORA 16:06

Guatemala, 02 de noviembre de 2022
Oficio No.SGI-DGPI-CDAG-269-2022

Licenciada
Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Con atención:
Licenciado
Luis Enrique Monterroso Batres
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licda. Rivera:

Reciba un cordial saludo y mis deseos de éxito en sus actividades cotidianas.

En seguimiento al desarrollo de proyectos de inversión que se encuentran registrados en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública y que actualmente se encuentran en etapa de liquidación, se procede a trasladar el informe sobre el avance tanto físico como financiero de octubre con respecto a lo aprobado para el 2022:

- El proyecto que se identifica con número de registro SNIP 136372 "Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca la Aurora 7ª avenida final zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala", y el proyecto que se identifica con número de registro SNIP 138920 "Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo, 7a. Avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala", fueron registrados en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información Pública, en dicho módulo se reportó el avance físico de cada uno de ellos durante el tiempo en que estuvieron en ejecución desde su inicio hasta su finalización, cumpliendo con los requerimientos de las Normas SNIP 2019, 2020, 2021 y 2022.

- Atendiendo a lo indicado en la Norma 9.6 contenida en las Normas Generales de las Normas SNIP 2022 la cual dice: "Cuando la EPI realice el pago final del proyecto, debe completar el proceso de finalización, registrando en el SINIP el acta de liquidación, con lo cual cambiará el estado del proyecto a "finalizado" y bloqueará el código SNIP. El SINIP enviará automáticamente a los actores involucrados, el aviso sobre el cambio en el estado del proyecto" se procedió a registrar la finalización de los proyectos SNIP 136372 y 138920 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública, por lo que actualmente no es posible consultar la información de los proyectos, registrada en dicho Módulo.

- Luego de concluir el proceso de finalización dentro del Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública, los proyectos SNIP 136372 y 138920 fueron direccionados por dicho sistema a la cartera de "proyectos finalizados" como se muestra en las siguientes capturas de pantallas.



- En las imágenes anteriores, se puede visualizar en color verde la marca de verificación en las etapas siguientes: Emisión de opinión técnica, En ejecución y Finalizado, lo cual indica que el proyecto superó cada una de las etapas en el Sistema de Información de Inversión Pública.

En base a lo anterior, se concluye que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para los proyectos SNIP 136372 y 138920, cumplió con lo estipulado en las Normas SNIP 2019, 2020, 2021 y 2022 en relación a proyectos de inversión.

Agradeciendo la atención que se sirva darle al presente oficio, se adjunta copia del informe de la Señorita Milvian Karina Rodríguez Revolorio,

Ingeniero Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura

Vo. Bo. Arquitecto Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

C.C. archivo
AAOC/sgbp

Guatemala, 28 de octubre de 2022

Ingeniero
Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de
Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Ingeniero Ochoa:

Con relación a los proyectos que se identifican con número de registro SNIP 136372 Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca la Aurora 7ª avenida final zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala y SNIP 138920 Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo, 7a. Avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala informo lo siguiente:

- ✓ Los proyectos SNIP 136372 y 138920 los cuales fueron registrados en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información Pública, en dicho módulo se reportó el avance físico de cada uno de ellos durante el tiempo en que estuvieron en ejecución desde su inicio hasta su finalización, cumpliendo con los requerimientos de las Normas SNIP 2019, 2020, 2021 y 2022.

- ✓ Atendiendo a lo indicado en la Norma 9.6 contenida en las Normas Generales de las Normas SNIP 2022 la cual dice: **"Cuando la EPI realice el pago final del proyecto, debe completar el proceso de finalización, registrando en el SINIP el acta de liquidación, con lo cual cambiará el estado del proyecto a "finalizado" y bloqueará el código SNIP. El SINIP enviará automáticamente a los actores involucrados, el aviso sobre el cambio en el estado del proyecto,"** se procedió a registrar la finalización de los proyectos SNIP 136372 y 138920 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública, por lo que actualmente no es posible consultar la información de los proyectos, registrada en dicho Módulo.

- ✓ Luego de concluir el proceso de finalización dentro del Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública, los proyectos SNIP 136372 y 138920 fueron direccionados por dicho sistema a la cartera de "proyectos finalizados" como se muestra en las siguientes capturas de pantallas.

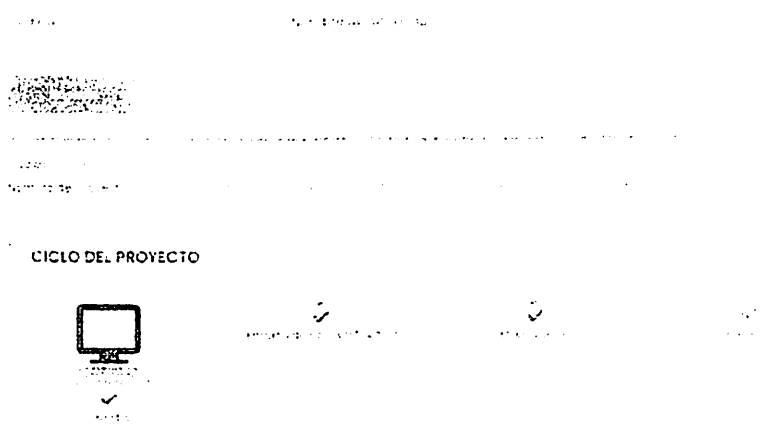

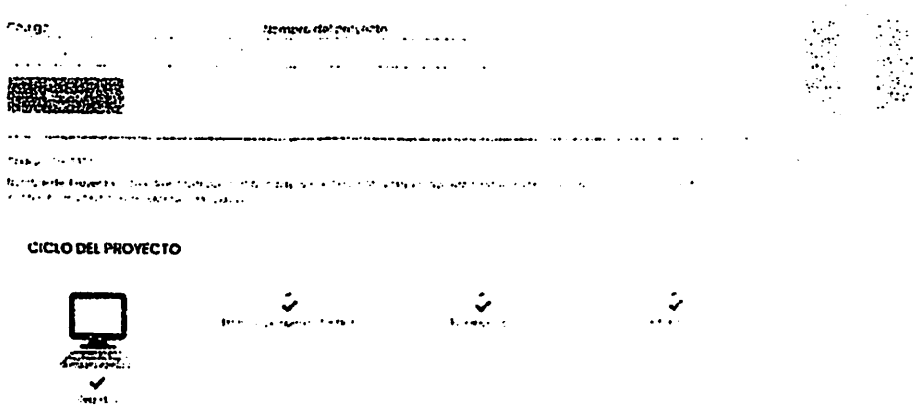

- ✓ En las imágenes anteriores, se puede visualizar en color verde el check en: emisión de opinión técnica, en ejecución y en "finalizado" lo cual indica que proyecto superó cada una de las etapas en el Sistema de Información de Inversión Pública.

- ✓ De lo anteriormente descrito se concluye que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para los proyectos SNIP 136372 y 138920, cumplió con estipulado en las Normas SNIP 2019, 2020, 2021 y 2022 con relación a proyectos de inversión.

Atentamente,

Karina Rodríguez
Analista de datos e información de proyectos en el SNIP
Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura

Copia

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-080-2022
Guatemala, 03 de noviembre de 2022

Licenciada
Luz Keila Gramajo Vílchez
Secretaria
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimada Licenciada Gramajo:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance físico y financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de octubre 2022.

Cordialmente,

Licda. Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez
Encargada del Despacho
Subgerencia de Desarrollo Institucional

Licda.Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiera

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente –CDAG-

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
08 NOV 2022
HORA: 9:55 NOMBRE: Karla G.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
07 NOV 2022
Hora: 10-31 Firma:
Registro Único de Expediente: 10722 86236

Copia

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-081-2022
Guatemala, 03 de noviembre de 2022

Licenciado
Edwin Martínez Cameros
Ministro de Finanzas Públicas
Presente

Atención:
Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) Remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de octubre 2022.

Cordialmente,

Licda. Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez
Encargada del Despacho
Subgerencia de Desarrollo Institucional

Licda.Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiera

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente –CDAG-

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECIBIDO
17 NOV 2022

Hora: _____ Firma: _____

Registro Único de Expediente: _____

CDAG

Oficio No. O-CDAG-G-654-2022
Guatemala, 27 de octubre de 2022

Licenciada
Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez
Profesional Especializado de Control y Riesgos
Unidad Especializada en Control y Riesgos
Subgerencia de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Estimada Licenciada Grijalva:

Derivado a la solicitud de vacaciones de la Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez, Subgerente de Desarrollo Institucional, del 02 al 07 de noviembre de 2022, según APE-FOR-14, se le nombra como Encargada del Despacho de la Subgerencia de Desarrollo Institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, durante el tiempo que duren las mismas.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA

Licenciado Luis Nestor Madrid González
Gerente
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

C c Archivo
